	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
	DIRECCION GENERAL DEL AGUA
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: 21.804-0142/7521 LOTE 4

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN CHIVA (VALENCIA)

OPERADOR:	VARIOS
PRESUPUESTO ESTIMADO	4.836.127,83 €

AUTOR DEL INFORME:	CYGSA CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A.

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 5
2. FASES DEL CICLO URBANO DEL AGUA AFECTADAS 6
3. DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA 6
3.1. ABASTECIMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA) 6
3.2. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA. 7
3.3. SANEAMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA) 8
3.4. DEPURACIÓN. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA) 8
4. DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS Y LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 8
4.1. INTRODUCCIÓN 8
4.2. ABASTECIMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA) 9
4.2.1. ABAS_01. Renovación de instalaciones electromecánicas dañadas en pozos y bombeos del sistema de abastecimiento de Chiva. 9
4.2.2. ABAS_02. Reparación de caminos de acceso a infraestructuras básicas del servicio de agua potable. Accesos a los pozos Solana. 11
4.2.3. ABAS_03. Canalización provisional para la reposición del servicio en diversas áreas del núcleo urbano de Chiva. 12
4.2.4. ABAS_04. Canalización provisional para la reposición del servicio a urbanizaciones por el barranco del Gallego. 13
4.2.5. ABAS_05. Canalización definitiva de la red de agua potable en la calle enrique Ponce (Chiva) 15
4.2.6. ABAS_06. Canalización definitiva de la red de agua potable en la c/Ramón y Cajal (Chiva) 16
4.2.7. ABAS_07. Canalización definitiva de la tubería de abastecimiento a urbanizaciones por el barranco del Gallego. 18
4.2.8. ABAS_08. Canalización definitiva de la red de agua potable en la c/ San Isidro. 19
4.2.9. ABAS_09. Canalización definitiva de la red de agua potable en c/ Olivera (Chiva) 20
4.2.10. ABAS_10. Renovación de la tubería de suministro a la urbanización Loma Miralcampo (Chiva) 21
4.2.11. ABAS_11. Renovación de tuberías de la red de distribución del casco urbano dañadas. 23
4.2.12. ABAS_12. Renovación de la tubería de conexión entre los sistemas de agua potable de Chiva y Cheste. 24
4.2.13. ABAS_13. Renovación de tuberías de la red de distribución de la urbanización Loma del Castillo (Chiva) 26
4.2.14. ABAS_14. Renovación De tubería de suministro a la urbanización San Álvaro y red de distribución afectada (Chiva). 27
4.3. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA 29

4.3.1. ABA_01. Suministro de agua potable con camiones cisterna a la urbanización “El Bosque” y adyacentes del municipio de Chiva. 29

4.3.2. ABA_02. Afección a equipos eléctricos y suministro de emergencia en el pozo para abastecimiento de la urbanización El Bosque y adyacentes. 30

4.3.3. ABA_03. Instalación provisional para suministro alternativo al depósito bajo de la urbanización El Bosque. 31

4.3.4. ABA_04. Sustitución variador velocidad grupo rebombeo impulsión del depósito bajo 5000 m^3 al depósito alto 100 m^3 de la urbanización El Bosque (Chiva). 34

4.3.5. ABA_05. Actuaciones para reparación provisional y reposición definitiva de las conducciones de abastecimiento en la urbanización El Bosque y adyacentes. Chiva. 36

4.3.6. ABA_06. Rehabilitación de depósito de agua potable de 5.000 m3 de La Urbanización El Bosque 39

4.4. SANEAMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA) 41

4.4.1. SAN_01. Renovación de colectores dañados en el casco urbano de Chiva (Valencia). 41

4.4.2. SAN_02. Renovación de colectores dañados en la zona industrial de Chiva (Valencia). 43

4.5. DEPURACIÓN. EGEVASA 45

4.5.1. DEP_01. Actuaciones DANA Chiva. 45

4.5.2. DEP_02. Actuaciones DANA Chiva- Urbanización La Loma. 50

5. TRABAJOS REALIZADOS 52

6. VALORACIONES 52

6.1. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA VALORACIÓN 52

6.2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 54

6.3. MEDICIONES 54

7. PRESUPUESTO ESTIMADO 54

7.1. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA 55

7.2. ABASTECIMIENTO. UTE CHIVA 56

7.3. SANEAMIENTO. UTE CHIVA 57

7.4. DEPURACIÓN. EGEVASA 57

7.5. RESUMEN 58

8. PLAZO 59

ANEXOS

ANEXO 1. SOLICITUD PRESENTADA

ANEXO 2. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES

1. ALEGACIONES GENERALES
2. ALEGACIONES PARTICULARES

2.1. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA

2.2. ABASTECIMIENTO. UTE AGUAS DE CHIVA

2.3. DEPURACIÓN. EGEVASA

ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE APOYO A LA VALORACIÓN

ANEXO 4. VALORACIÓN

ANEXO 5. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA OBRA YA EJECUTADA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media real de 96,8 mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45.6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de la rambla de las Moreras en Totana (Murcia).

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del *Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024*, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA

LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 27 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A (CYGSA) el contrato administrativo de colaboración para el LOTE 4 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALAQUÁS, ALBAL, ALMUSSAFES, BENETÚSSER, BUÑOL, BUÑOL-ALBORACHE, CARLET, CATARROJA, CHERA, CHIVA, FAVARA, LETUR, LLÍRIA, MONTSERRAT, RIBARROJA DEL TÚRIA, SIETE AGUAS Y TAVERNES DE LA VALDIGNA.

Finalizadas las memorias valoradas provisionales de cada uno de los municipios afectados, el pasado 27 de mayo se dio inicio al proceso de información pública por un plazo de 10 días hábiles. En consideración a las alegaciones presentadas durante el periodo establecido, se han introducido en las valoraciones definitivas, modificaciones respecto a las anteriores memorias provisionales que afectan, con carácter general, a los criterios de valoración y a los precios. En los apartados 6.1. y 6.2. de esta Memoria se reflejan los nuevos criterios generales adoptados.

Por otra parte, en el Anexo nº2 se incluyen las respuestas a las alegaciones particulares realizadas correspondientes a este municipio.

2. FASES DEL CICLO URBANO DEL AGUA AFECTADAS

En el caso de CHIVA (VALENCIA) se produjeron daños a las siguientes infraestructuras. Se indica en cada caso el operador de las mismas.

FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	OPERADOR
ABASTECIMIENTO	INDIRECTA	UTE CHIVA
ABASTECIMIENTO	INDIRECTA	HIDRAQUA
SANEAMIENTO	INDIRECTA	UTE CHIVA
DEPURACIÓN	INDIRECTA	EGEVASA

3. DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA

3.1. ABASTECIMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA)

El operador de la red de abastecimiento facilitó varios documentos con un total de 14 memorias valoradas de las diferentes actuaciones a realizar o ya realizadas para reparar los daños sufridos.

MEMORIA	TÍTULO	ESTADO
ABAS_01	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DAÑADAS EN POZOS Y BOMBEOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CHIVA	SIN EJECUTAR
ABAS_02	REPARACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. ACCESOS A LOS POZOS SOLANA	SIN EJECUTAR

MEMORIA	TÍTULO	ESTADO
ABAS_03	CANALIZACIÓN PROVISIONAL PARA LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO EN DIVERSAS ÁREAS DEL NÚCLEO URBANO DE CHIVA	EJECUTADO
ABAS_04	CANALIZACIÓN PROVISIONAL PARA LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO A URBANIZACIONES POR EL BARRANCO DEL GALLEGO	EJECUTADO
ABAS_05	CANALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA C/ ENRIQUE PONCE	SIN EJECUTAR
ABAS_06	CANALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA C/RAMÓN Y CAJAL (CHIVA)	SIN EJECUTAR
ABAS_07	CANALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A UNRBANIZACIONES POR EL BCO. DEL GALLEGO	SIN EJECUTAR
ABAS_08	CANALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA C/ SAN ISIDRO (CHIVA)	SIN EJECUTAR
ABAS_09	CANALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C/ OLIVERA (CHIVA).	SIN EJECUTAR
ABAS_10	RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO A LA URBANIZACIÓN LOMA MIRALCAMPO (CHIVA).	SIN EJECUTAR
ABAS_11	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL CASCO URBANO DAÑADAS.	SIN EJECUTAR
ABAS_12	RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE CHIVA Y CHESTE	SIN EJECUTAR
ABAS_13	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN LOMA DEL CASTILLO (CHIVA)	SIN EJECUTAR
ABAS_14	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE SUMINISTRO A LA URBANIZACIÓN SAN ÁLVARO Y RED DE DISTRIBUCIÓN AFECTADA (CHIVA).	SIN EJECUTAR

En cada una de ellas de describen los daños ocasionados a las infraestructuras, la descripción de los trabajos a realizar y por último se realiza la valoración de estas actuaciones.

3.2. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA.

El operador de la red de abastecimiento facilitó un documento con 6 memorias valoradas de las diferentes actuaciones a realizar o ya realizadas para reparar los daños sufridos.

MEMORIA	TÍTULO	ESTADO
ABA_01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON CAMIONES CISTERNA A LA URBANIZACIÓN “EL BOSQUE” Y ADYACENTES DEL MUNICIPIO DE CHIVA	EJECUTADO
ABA_02	AFECCIÓN A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO DE EMERGENCIA EN EL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE Y ADYACENTES.	EJECUTADO
ABA_03	INSTALACIÓN PROVISIONAL PARA SUMINISTRO ALTERNATIVO AL DEPÓSITO BAJO DE LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE.	EJECUTADO
ABA_04	SUSTITUCIÓN VARIADOR VELOCIDAD GRUPO REBOMBEO IMPULSIÓN DEL DEPÓSITO BAJO 5000 m^3 AL DEPÓSITO ALTO 100 m^3 DE LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE (CHIVA)	EJECUTADO
ABA_05	ACTUACIONES PARA REPARACIÓN PROVISIONAL Y REPOSICIÓN DEFINITIVA DE LAS CONDUCCIONES DE	PARCIALMENTE EJECUTADO

MEMORIA	TÍTULO	ESTADO
	ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE Y ADYACENTES. CHIVA.	
ABA_06	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE 5.000 m^3 DE LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE	SIN EJECUTAR

En cada una de ellas de describen los daños ocasionados a las infraestructuras, la descripción de los trabajos a realizar y por último se realiza la valoración de estas actuaciones.

3.3. SANEAMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA)

Se han recibido dos memorias valoradas de las diferentes actuaciones a realizar o ya realizadas para reparar los daños sufridos.

MEMORIA	TÍTULO	ESTADO
SAN_01	RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL CASCO URBANO DE CHIVA (VALENCIA)	SIN EJECUTAR
SAN_02	RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL	SIN EJECUTAR

En cada una de ellas de describen los daños ocasionados a las infraestructuras, la descripción de los trabajos a realizar y por último se realiza la valoración de estas actuaciones.

3.4. DEPURACIÓN. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA)

Se han recibido dos memorias valoradas para las dos depuradoras de las que EGEVASA es operador, una para la EDAR de Chiva y otra para la de la urbanización La Loma.

MEMORIA	TÍTULO	ESTADO
DEP_01	ACTUACIONES DANA 2024 CHIVA	SIN EJECUTAR
DEP_02	ACTUACIONES DANA 2024 CHIVA-URBANIZACIÓN LA LOMA	SIN EJECUTAR

En cada una de ellas de describen los daños ocasionados a las infraestructuras, la descripción de los trabajos a realizar y por último se realiza una primera valoración de estas actuaciones.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS Y LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

4.1. INTRODUCCIÓN

En los siguientes apartados se realiza una descripción de los daños y de las actuaciones propuestas por el operador del servició para reponer la infraestructura a su estado previo a la DANA.

Esta descripción está basada en la documentación de partida facilitada por este operador y que ha sido contrastada en campo mediante visitas técnicas realizadas por personal de CYGSA a las zonas afectadas. Se acompañan estas descripciones de fotografías tomadas durante estas visitas de inspección.

4.2. ABASTECIMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA)

4.2.1. ABAS 01. Renovación de instalaciones electromecánicas dañadas en pozos y bombeos del sistema de abastecimiento de Chiva.

Descripción de los daños.

La memoria del operador describe los daños producidos por la DANA en las seis estaciones de bombeo presentes en la red de abastecimiento de agua potable de Chiva. Algunos de los trabajos ya han sido realizados.

Estas estaciones afectadas son:

- **Solana 3:** Debido a las inundaciones, se ha visto comprometido el variador de frecuencia y el filtro senoidal presentes en la estación. Del mismo modo, la avería eléctrica implica la sustitución del cuadro de potencia.
- **Solana 2:** Averías en variador de frecuencia, transformador de suministro eléctrico y acometida, motivado tanto por las inundaciones como por fallos en el suministro eléctrico debido a la mala calidad de la red.
- **Pahilla:** Avería en el caudalímetro de ultrasonidos como consecuencia de un fallo eléctrico.
- **San Álvaro:** Una de las más afectadas con averías en motor rebombeo Carambolo, motor rebombeo Urbanizaciones, bomba Atalaya, motores rebombeo Olimar Inferior y su variador de frecuencia.
- **Perenchiza:** Como consecuencia de las goteras producidas por la lluvia se produjeron fallos eléctricos en el centro de transformación que suministra la estación.
- **Calicanto:** Avería en motor Picos del Teide.

Descripción de las actuaciones.

Solana 3. Se han previsto los siguientes trabajos:

- Fabricación en taller de cuadro eléctrico de protección IP55. Envolvente metálica. Totalmente cableado, rotulado y probado.
- Transporte e instalación del cuadro eléctrico en la estación remota.
- Suministro e instalación de variador de 250 kW (1 ud) funcionando a carga pesada (50ºC). Protección IP54. Incluye transporte y configuración. Se instalarán en la caseta del bombeo.
- Ejecución de la instalación eléctrica interior conforme a la normativa del Reglamento Electrotécnico de BT R.D. 842/2002. Se prestará especial atención a la instrucción ITC-

BT-30, la cual define los requisitos de las instalaciones en locales de características especiales.

- Suministro e instalación de filtro senoidal (1 ud).

Solana 2. Se han previsto los siguientes trabajos:

- Suministro e instalación de variador de 250 kW (1 ud) funcionando a carga pesada (50ºC). Protección IP54. Incluye transporte y configuración. Se instalarán en la caseta del bombeo.
- Ejecución de la instalación eléctrica interior conforme a la normativa del Reglamento Electrotécnico de BT R.D. 842/2002. Se prestará especial atención a la instrucción ITC-BT-30, la cual define los requisitos de las instalaciones en locales de características especiales.
- Suministro e instalación de nuevo TRAFO de 630 kVAS (1 ud).
- Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 185mm2 de sección para las fases y 95mm2 para el cable de tierra.

Pahilla. Se han previsto los siguientes trabajos:

- Suministro e instalación de caudalímetro de ultrasonidos SENSOTEC US LTFM (1 ud).

San Álvaro. Se han previsto los siguientes trabajos:

- Suministro e instalación de motor ELDIN RA180 de 22KW potencia en Carambolo (1 ud).
- Suministro e instalación de motor FELM Y2 180 de 22KW potencia en Carambolo (1 ud).
- Suministro e instalación de bomba IDEAL RNF52-160 (1 ud).
- Suministro e instalación de motor ETECH CWM201 de 25kW de potencia (2 ud).
- Suministro e instalación de variador de 37 kW funcionando a carga pesada (50ºC) (1 ud). Protección IP54. Incluye transporte y configuración. Se instalarán en la caseta del bombeo.
- Ejecución de la instalación eléctrica interior conforme a la normativa del Reglamento Electrotécnico de BT R.D. 842/2002. Se prestará especial atención a la instrucción ITC-BT-30, la cual define los requisitos de las instalaciones en locales de características especiales.

Perenchiza. Se realizaron los siguientes trabajos:

- Adecuación del centro de transformación para asegurar un correcto funcionamiento del mismo.

Calicanto. Se han previsto los siguientes trabajos:

- 1 Ud. Suministro e instalación de motor SAER IR40 de 17KW de potencia.

En el Anexo 2 de documentación gráfica de apoyo a la valoración pueden verse las instalaciones correspondientes.

4.2.2. ABAS_02. Reparación de caminos de acceso a infraestructuras básicas del servicio de agua potable. Accesos a los pozos Solana.

Descripción de los daños.

Las crecidas provocadas por las intensas lluvias de la DANA arrasaron con parte de los caminos de acceso a infraestructuras básicas del servicio de agua potable. En este caso el acceso a los pozos de Solana se vio afectado.

Para garantizar el acceso para mantenimiento a estas infraestructuras básicas del servicio de agua potable se plantea la reparación y mejora del camino de acceso.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos necesarios consisten en la reparación de los caminos de acceso a los pozos Solana de Chiva para garantizar el correcto mantenimiento de las instalaciones.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones para los caminos afectados:

- Desbroce y excavación para regularizar los caminos.
- Demoliciones de los pavimentos de hormigón que se puedan encontrar.
- Colocación de una capa de zahorra de 30 cm compactada.
- Ejecución de pavimento de hormigón coloreado de 15 cm de espesor con mallazo de 20x20 y 6 mm de diámetro.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar. Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. ABAS_03. Canalización provisional para la reposición del servicio en diversas áreas del núcleo urbano de Chiva.

Descripción de los daños

La red de agua potable afectada discurre por las calles Ramón y Cajal y Enrique Ponce, se trata de aproximadamente 50 m de tubería de fibrocemento y 5 acometidas asociadas.

Para garantizar el suministro de agua potable, con carácter urgente, se ha llevado a cabo el tendido de tubería provisional de polietileno sin zanja.

Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA pudo comprobar el estado de la calle y verificar la necesidad de la actuación.

Tubería provisional en calles Enrique Ponce y Ramón y Cajal. Fuente: Visita realizada (11-02-2025)

Descripción de las actuaciones.

Los primeros trabajos a realizar consisten en el tendido de red provisional para abastecimiento de agua potable, durante la ejecución de obras de reposición y renovación de servicios afectados (redes agua potable y alcantarillado), en tubería de polietileno sin zanja, y el traslado provisional de acometidas domiciliarias.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Colocación y montaje provisional de 30 m de tubería de PEØ160 en la calle Ramón y Cajal.
- Colocación y montaje provisional de 20 m de tubería de PEØ110 en la calle Enrique Ponce.

- Traslado provisional de 5 acometidas domiciliarias.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Corte, retirada y gestión en centro autorizado de tuberías de fibrocemento.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

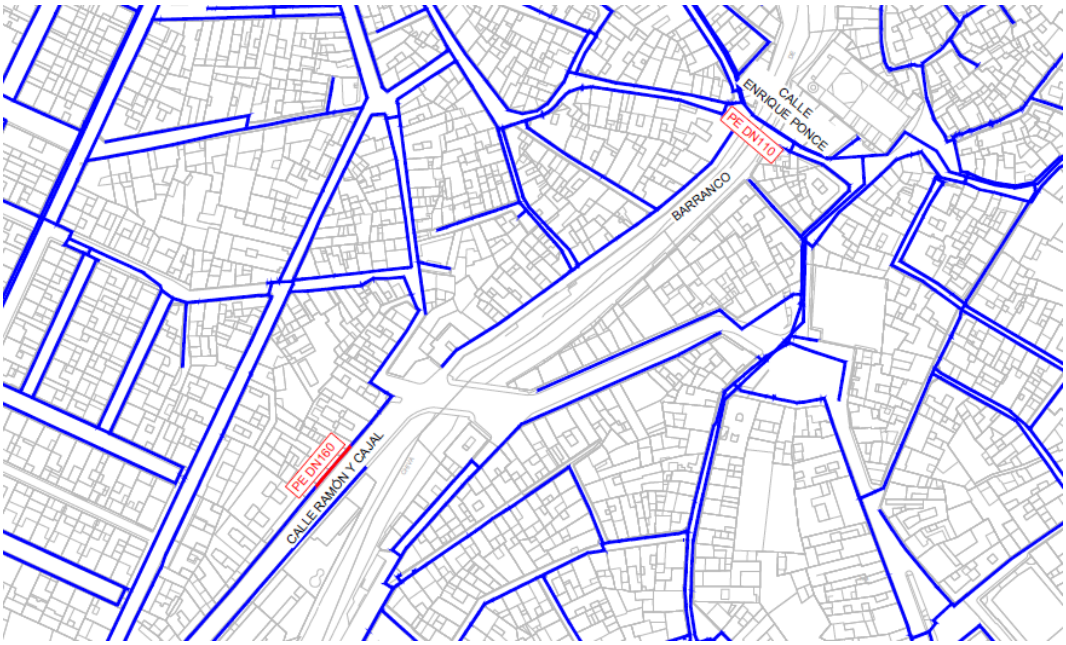

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar. Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. ABAS_04. Canalización provisional para la reposición del servicio a urbanizaciones por el barranco del Gallego.

Descripción de los daños.

La red de agua potable afectada discurre por el cruce del Barranco Gallego por el Camino de la Sierra Perenchiza, se trata de aproximadamente 150 m de tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro.

Para garantizar el suministro de agua potable, con carácter urgente, se ha llevado a cabo el tendido de tubería provisional de polietileno sin zanja.

Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA pudo comprobar el estado de la calle y verificar la necesidad de la actuación.

Estado del cruce sobre el barranco del Gallego. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos a realizar consisten en el tendido de red provisional durante la ejecución de obras de reposición y renovación de servicios afectados en el cruce del Barranco del Gallego, en tubería de polietileno sin zanja, para garantizar abastecimiento de agua potable a la urbanización Sierra Perenchiza.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Colocación y montaje de 150 m de tubería de PEØ250.
- Anclaje provisional de tubería.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.

- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

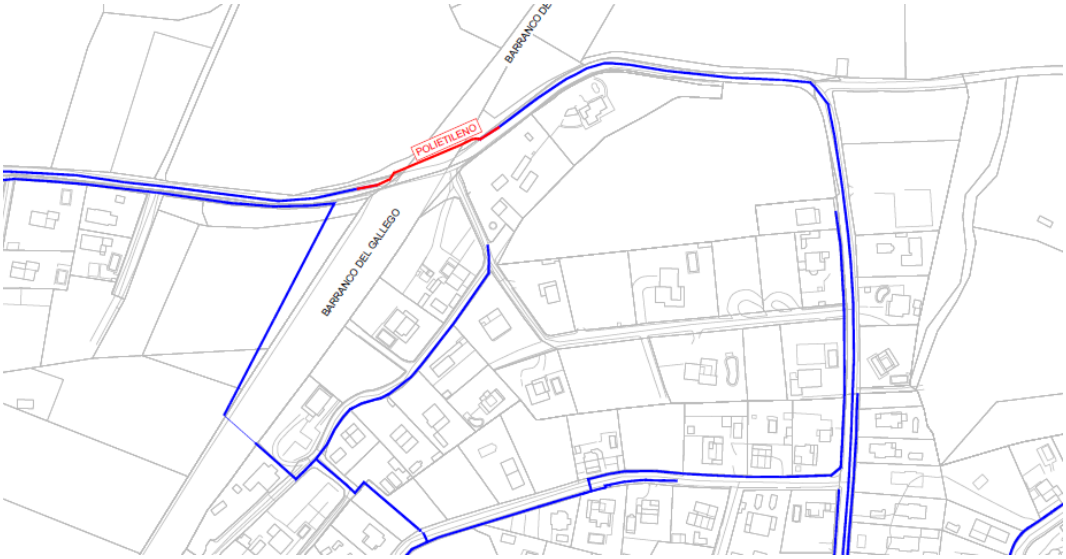

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.5. ABAS_05. Canalización definitiva de la red de agua potable en la calle enrique Ponce (Chiva).

Descripción de los daños.

La red afectada de agua potable consiste en 22 m de tubería de fibrocemento DN250 y 26 m de tubería de polietileno DN110 existente que cruza el Puente de Piedra de la c/Enrique Ponce y 11 m de tubería de polietileno DN90 en la c/Antonio Machado junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos y 3 acometidas asociadas. Se debe destacar que, dado el estado actual del pavimento, será necesario rehabilitar la calle para llevar a cabo la actuación objeto de estudio.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos consisten en la renovación de 59 m de tubería y 3 acometidas dañadas en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 11 m de tubería de PE DN90 m, 26 m de PE DN110 en sustitución de las tuberías de polietileno existente.
- Colocación y montaje de 22 m de tubería de fundición dúctil DN250 para la renovación de la tubería de fibrocemento que cruza en Puente de Piedra.

- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- En caso de afección directa al barranco, relleno mediante vaina de protección revestida de hormigón, por encima del hormigón se rellenará zahorra, y sobre esta capa se colocará escollera recebada, de modo que la generatriz superior de la tubería se sitúe como mínimo a 1 m respecto del punto más bajo del cauce (zanja tipo 3).
- Ejecución de 3 acometidas domiciliarias.

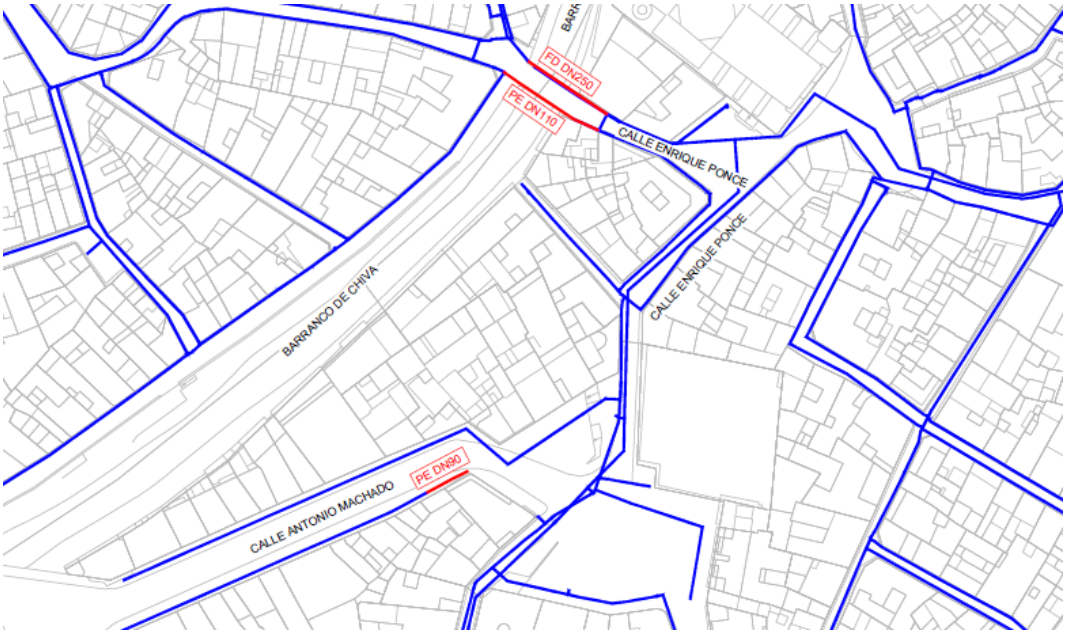

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.6. ABAS_06. Canalización definitiva de la red de agua potable en la c/Ramón y Cajal (Chiva).

Descripción de los daños.

La red afectada de agua potable se trata de 30 m de tubería de fibrocemento DN150 en la C/Ramón y Cajal junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos y 5 acometidas asociadas. Dado el estado actual de la calle, será necesario rehabilitar el hundimiento existente en el pavimento para llevar a cabo la actuación objeto de estudio.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos consisten en la renovación de 30 m de tubería y 5 acometidas dañadas en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.

- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 30 m de tubería de PE DN160.
- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- Ejecución de 5 acometidas domiciliarias.
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías. Corte, retirada y gestión en centro autorizado de tuberías de fibrocemento.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.7. ABAS_07. Canalización definitiva de la tubería de abastecimiento a urbanizaciones por el barranco del Gallego.

Descripción de los daños.

El tramo de conducción de agua potable afectado consiste en 150 m de tubería de fundición dúctil, a lo largo del cruce del barranco del Gallego, tubería que, durante crecida del barranco, resultó arrastrada por el agua.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos necesarios consisten en 150 m de tubería de fundición dúctil de diámetro 250 mm y la valvulería y piezas asociadas.

Tanto la profundidad de la zanja como la protección de la tubería se realizará según exigencias de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 150 m de tubería de FD DN250 Clase C50, junto con las piezas especiales (codos, derivaciones, cabos extremos, etc.…) necesarios para su instalación.
- Relleno de zanjas mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria.
- A lo largo del cruce del cauce, relleno mediante vaina de protección revestida de hormigón, por encima del hormigón se rellenará zahorra, y sobre esta capa se colocará escollera recebada, de modo que la generatriz superior de la tubería se sitúe como mínimo a 1 m respecto del punto más bajo del cauce (zanja tipo 3).
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD’s.

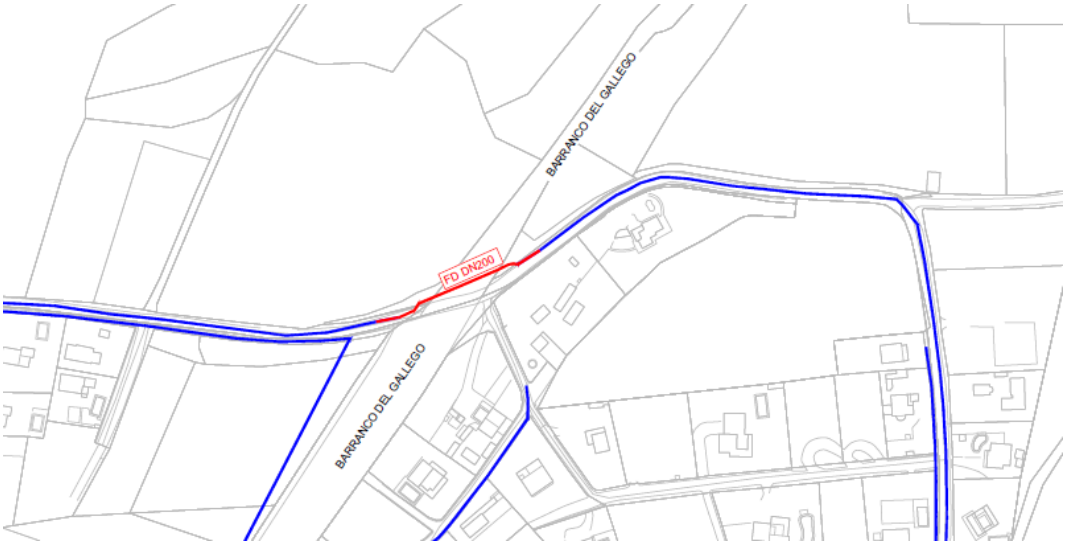

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.8. ABAS_08. Canalización definitiva de la red de agua potable en la c/ San Isidro.

Descripción de los daños.

La red afectada de agua potable se trata de 65 de tubería de polietileno DN110 en la C/San Isidro junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos y 7 acometidas asociadas.

Descripción de las actuaciones

Los trabajos consisten en la renovación de 65 m de tubería y 7 acometidas dañadas en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Canalización de 65 m de tubería de PE DN110.
- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- Ejecución de 7 acometidas domiciliarias.
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).

- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

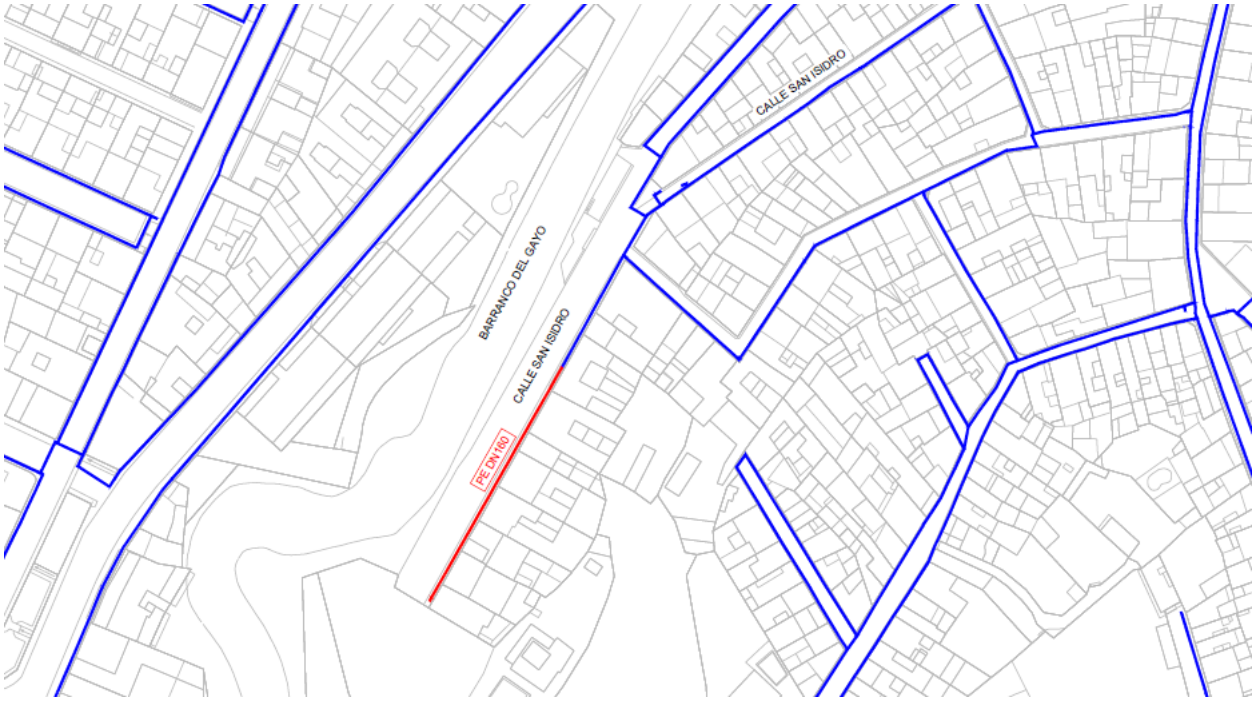

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.9. ABAS_09. Canalización definitiva de la red de agua potable en c/ Olivera (Chiva).

Descripción de las actuaciones.

La red afectada de agua potable se trata de 52 de tubería de polietileno DN110 en la C/Olivera junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos y 2 acometidas asociadas. Destacar que, dado el estado actual del pavimento, será necesario rehabilitar la calle para llevar a cabo la actuación objeto de estudio.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos consisten en la renovación de 52 m de tubería y 2 acometidas dañadas en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.

- Colocación y montaje de 52 m de tubería de PE DN110.
- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- Ejecución de 2 acometidas domiciliarias.
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

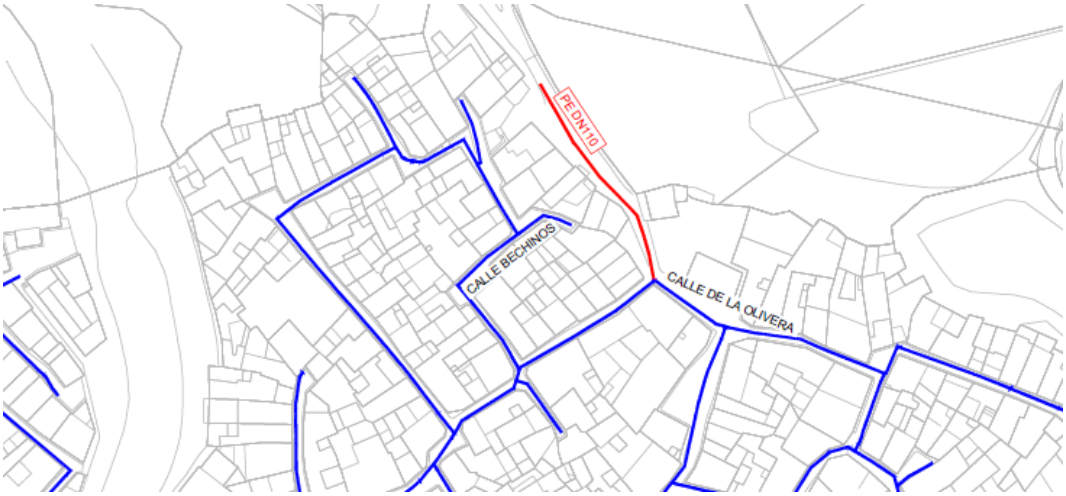

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.10. ABAS 10. Renovación de la tubería de suministro a la urbanización Loma Miralcampo (Chiva).

Descripción de los daños.

La red afectada se trata de la tubería de suministro de agua potable existente a la urbanización Loma de Miralcampo (Chiva). Dicha conducción está compuesta por 1.435 m de tubería de hierro galvanizado DN63 y polietileno DN110, junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos y 9 acometidas asociadas, donde los daños han sido especialmente acentuados en la zona del cruce del barranco de Gallego.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos necesarios consisten principalmente en la renovación de 1.435 m de tubería y 9 acometidas dañadas en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 1.435 m de tubería de polietileno DN 110.
- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- En la zanja de cruce del barranco, relleno mediante vaina de protección revestida de hormigón, por encima del hormigón se rellenará zahorra, y sobre esta capa se colocará escollera recebada, de modo que la generatriz superior de la tubería se sitúe como mínimo a 1 m respecto del punto más bajo del cauce (zanja tipo 3).
- Ejecución de 9 acometidas domiciliarias.
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

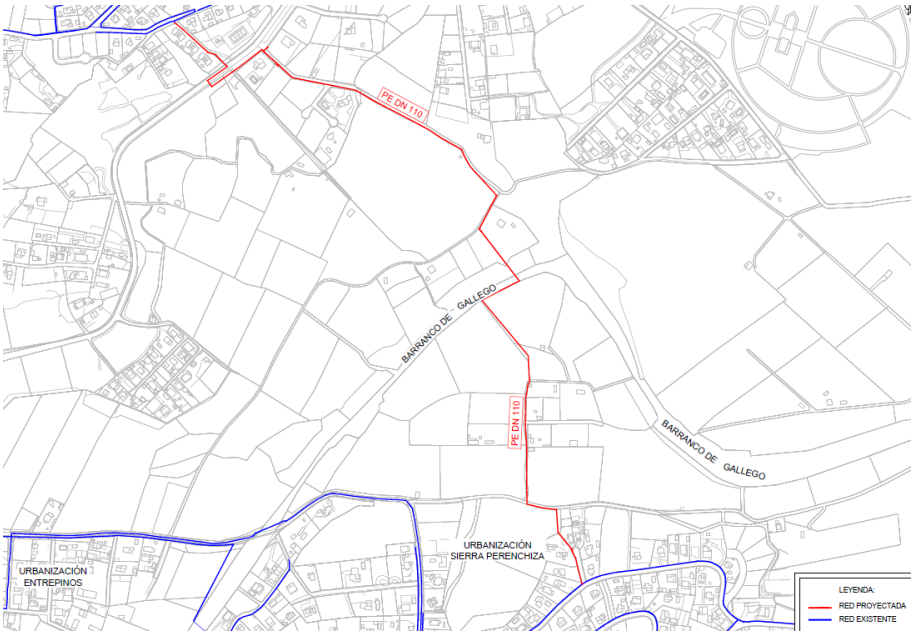

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.11. ABAS_11. Renovación de tuberías de la red de distribución del casco urbano dañadas.

Descripción de los daños.

La red afectada de agua potable está situada en el casco urbano del municipio, se trata aproximadamente de 750 m de tuberías de polietileno y fibrocemento, de diversos calibres, junto con registros y arquetas, y un total de 27 acometidas domiciliarias asociadas.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos necesarios consisten en la renovación de la red de agua potable de las calles Antonio Machado, 1 (35 m); Subida al Castillo, completa (335 m); Lepanto del lado de los pares entre las calles Estación y Padre Damián (80 m); Estación, 30 (10 m); y Partida Pizarro (290 m), mediante la canalización tubería de polietileno, la instalación de elementos y la renovación de acometidas domiciliarias.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 625 m de tubería de PEØ75, en las calles Subida al Castillo y Partida Pizarro.
- Colocación y montaje de 115 m de tubería de PEØ90, en la calle Antonio Machado y la avenida Lepanto.
- Colocación y montaje de 10 m de tubería de PEØ250, en la avenida Estación.
- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- Ejecución de 27 acometidas domiciliarias.
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Corte, retirada y gestión en centro autorizado de tuberías de fibrocemento.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD’s.

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.12. ABAS_12. Renovación de la tubería de conexión entre los sistemas de agua potable de Chiva y Cheste.

Descripción de los daños.

La red afectada de agua potable consiste en el tramo de la tubería de conexión entre los sistemas de agua potable de Chiva y Cheste, localizado en el cruce del Barranco Grande con Partida Pajar de Aliaga (Chiva), compuesta por 175 m de tubería de fibrocemento DN250 junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos consisten en la renovación de 175 m de tubería dañada en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Canalización de 175 m de tubería de fundición dúctil DN250.

- En zona exterior al barranco, relleno de zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- En el cruce del barranco, relleno de zanja mediante vaina de protección revestida de hormigón, por encima del hormigón se rellenará zahorra, y sobre esta capa se colocará escollera recebada, de modo que la generatriz superior de la tubería se sitúe como mínimo a 1 m respecto del punto más bajo del cauce (zanja tipo 3).
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Corte, retirada y gestión en centro autorizado de tuberías de fibrocemento.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

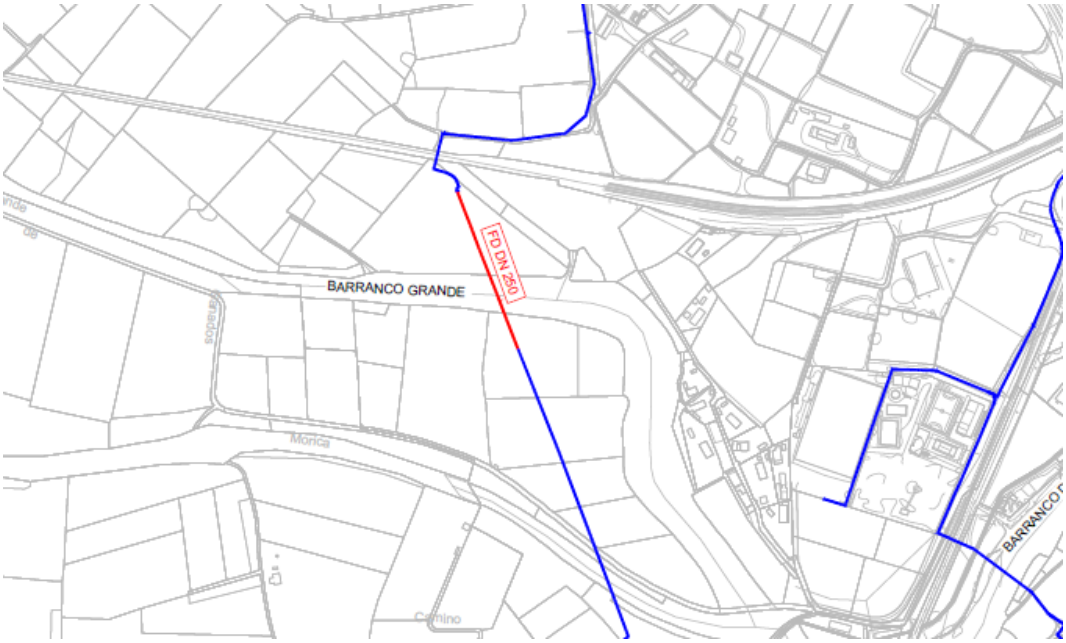

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.13. ABAS_13. Renovación de tuberías de la red de distribución de la urbanización Loma del Castillo (Chiva)

Descripción de los daños.

La red afectada de agua potable se trata de 567 m tubería de hierro galvanizado DN 50 y polietileno DN32 ubicadas en el camino paralelo a la C/Pedro Alcarria en la Urbanización Loma del Castillo de Chiva, junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos y 11 acometidas asociadas.

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos necesarios consisten en la renovación de 567 m de tubería y 11 acometidas dañadas en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 567 m de tubería de polietileno DN 110
- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- En caso de afección directa al barranco, relleno mediante vaina de protección revestida de hormigón, por encima del hormigón se rellenará zahorra, y sobre esta capa se colocará escollera recebada, de modo que la generatriz superior de la tubería se sitúe como mínimo a 1 m respecto del punto más bajo del cauce (zanja tipo 3).
- Ejecución de 11 acometidas domiciliarias.
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD’s.

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.2.14. ABAS_14. Renovación De tubería de suministro a la urbanización San Álvaro y red de distribución afectada (Chiva).

Descripción de los daños.

La red afectada de agua potable se trata de las tuberías de suministro de agua potable de la Urbanización Carambolo a la poza del pozo San Álvaro (Chiva) consistentes en 30 m de tubería de fundición dúctil DN400 y la tubería paralela de fibrocemento DN150 existentes junto con los registros y arquetas de los diferentes tramos.

Durante la visita, el personal de CYGSA pudo realizar una inspección visual del estado de la zona y determinar la necesidad de las actuaciones.

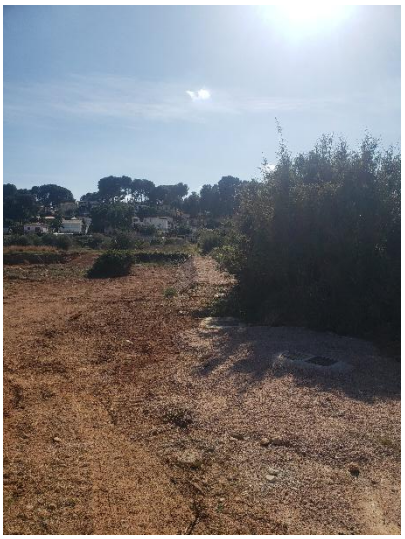

Daños en las conducciones de distribución. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Descripción de las actuaciones.

Los trabajos consisten en la renovación de 60 m de tubería dañada en la red de agua potable.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 30 m de tubería de fundición dúctil DN400.
- Colocación y montaje de 30 m de tubería de polietileno DN160.
- Relleno zanja mediante arena libre de finos hasta cubrir 10 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer y colocación de cinta de plástico identificatoria (zanja tipo 1), o bien, mediante vaina de protección revestida de hormigón hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer para cruces en calzada (zanja tipo 2).
- Instalación de válvulas de corte, ventosas y desagües.
- Ejecución de obras de fábrica (registros y arquetas).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.
- Conexiones con la red existente, y limpieza y desinfección de las tuberías.
- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD’s.

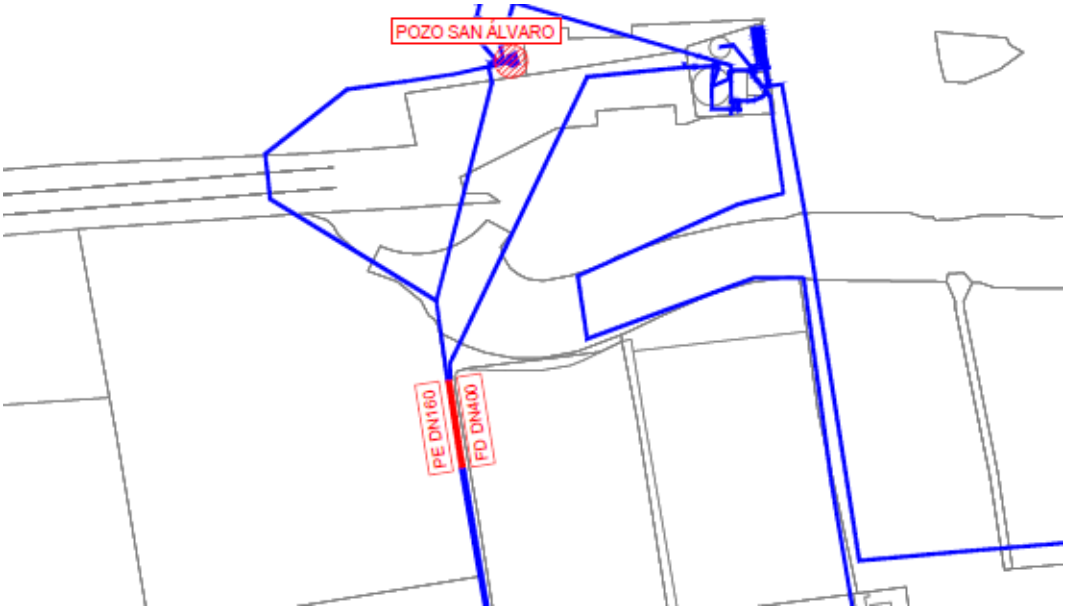

Ubicación aproximada de las actuaciones a realizar.

4.3. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA

4.3.1. ABA_01. Suministro de agua potable con camiones cisterna a la urbanización "El Bosque" y adyacentes del municipio de Chiva.

Descripción de los daños.

El pozo de El Bosque se encontró fuera de servicio durante varios días a causa de fallo en el suministro eléctrico, la conducción de agua en alta desde el pozo de la Solana se vió afectada por graves daños y además, se produjeron diversas roturas en las conducciones de la red de abastecimiento.

Esta situación provocó la falta de suministro de agua a los usuarios durante varios días hasta que se pudo poner en funcionamiento el pozo de El Bosque y se pudieron reparar las distintas averías en la red de distribución.

Para paliar las necesidades de abastecimiento de agua potable a la población afectada se estuvo suministrando agua potable mediante camiones cisterna entre los días 1 y 3 de noviembre, hasta el momento en que se pudo llevar a cabo el suministro a través de la red.

Descripción de las actuaciones.

Para llevar a cabo el servicio esencial de abastecimiento de agua potable a la población desabastecida de la urbanización El Bosque del municipio de Chiva se aportaron servicios alternativos, consistentes en el suministro de agua potable mediante cubas/camiones cisterna.

HIDRAQUA gestionó la disposición de estas cubas, todas ellas debidamente acreditadas por la autoridad sanitaria competente, las cuales se cargaron de la red de agua potable donde sí se

disponía de suministro, garantizando en todo momento las debidas condiciones higiénico-sanitarias de la misma.

Abastecimiento realizado mediante camiones cisterna. Fuente: Memoria HIDRAQUA.

Una vez restablecido el suministro de agua desde la Captación de El Bosque, se instalaron dos depósitos de agua potable de 1000 l cada uno, junto a la sede social de la urbanización El bosque, para que los vecinos tuvieran acceso a agua apta para consumo, ya que el agua suministrada presenta exceso de nitratos de forma temporal, mientras no sea posible disponer de agua en alta proveniente de los Pozos de la Solana.

4.3.2. ABA_02. Afección a equipos eléctricos y suministro de emergencia en el pozo para abastecimiento de la urbanización El Bosque y adyacentes.

Descripción de los daños.

El suministro de agua potable a la urbanización El Bosque y adyacentes en Chiva se realiza desde un sondeo que suministra al depósito de cabecera de la urbanización.

Las fuertes lluvias provocaron averías seguramente causadas por sobretensión como consecuencia del fallo eléctrico de alta tensión que se produjo y que se prolongó durante varios días.

La compañía suministradora procedió a la instalación de un grupo electrógeno, habiendo tenido HIDRAQUA que realizar la reposición de combustible para la operación del grupo electrógeno en varias ocasiones.

Se produjeron daños en el variador de velocidad que regula la alimentación eléctrica del pozo. También se vieron afectados fusibles del sistema de ventilación. Además, HIDRAQUA realizó el suministro de 1.578 litros de gasóleo para el funcionamiento de un grupo electrógeno.

Descripción de las actuaciones.

Se realizaron trabajos de reparación del variador de la marca Power Eletronics modelo SD750SP. Se procedió a la sustitución de 25 fusibles averiados por causa de las lluvias.

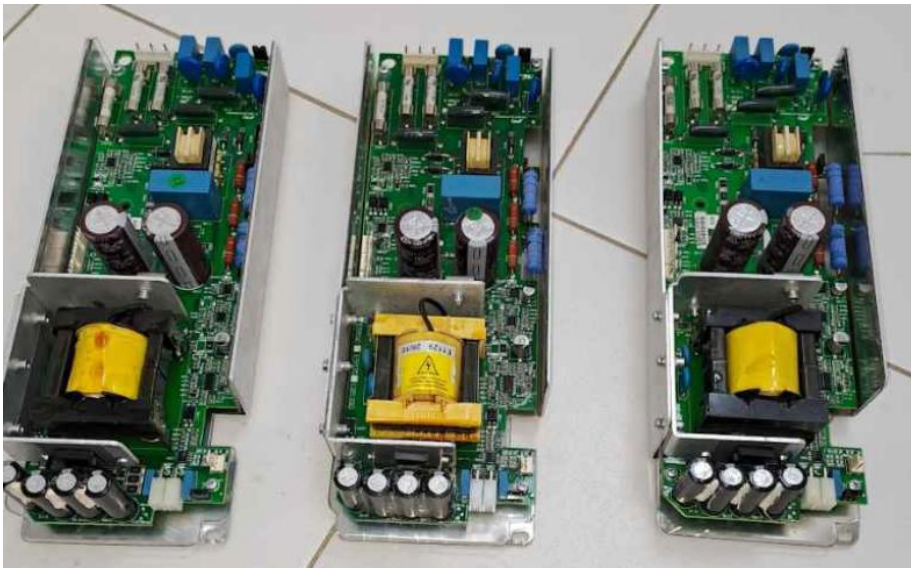

Trabajos de reparación realizados. Fuente: Memoria HIDRAQUA.

4.3.3. ABA_03. Instalación provisional para suministro alternativo al depósito bajo de la urbanización El Bosque.

Descripción de los daños.

El depósito Bajo dispone de una capacidad de 5000 m^3 y es el depósito de almacenamiento desde el cual se abastece actualmente la población de la Urbanización El Bosque y Adyacentes del municipio de Chiva. Se trata de un depósito de planta rectangular conformado por una estructura de hormigón, coronado por un forjado sustentado por pilares de hormigón que se sitúan en el interior del vaso.

El depósito se encuentra ubicado junto a un talud del terreno natural, situado a una cota superior a la del depósito. Las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento del terreno de este talud, el cual cayó sobre la estructura del depósito provocando el derrumbamiento del muro y parte del forjado de la cubierta situados en el lado junto al talud.

Esta situación implica la imposibilidad de utilización del depósito para el suministro de agua a través del mismo.

La solución definitiva de este problema pasará por llevar a cabo las actuaciones necesarias para la rehabilitación de los daños estructurales causados, pero puesto que estas no son susceptibles de acometerse en un corto período de tiempo, resulta necesario el establecimiento de una solución provisional que permita el abastecimiento de agua potable de la población de la zona.

Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA pudo comprobar el estado de la calle y verificar la necesidad de la actuación.

Daños en el depósito e instalación provisional. Fuente: Visita realizada (11-02-2025)

Descripción de las actuaciones.

Como solución provisional a la problemática descrita resulta preciso proceder a la habilitación del antiguo depósito de 350 m^3 situado en las inmediaciones del depósito Bajo, y que está fuera de uso en la actualidad, con objeto de poder usarlo para almacenamiento de los caudales provenientes del pozo y la compra de agua en alta y desde él elevar el agua hasta el depósito Alto, desde donde se distribuye a la población. Para ello se precisa también la instalación de un nuevo equipo de bombeo provisional puesto que las bombas que actualmente realizan esta función, dadas sus características y funcionamiento, no se pueden adaptar para extraer agua del depósito de 350 m^3 y bombear al depósito Alto.

Las actuaciones para que el nuevo sistema opere adecuadamente son:

Actuaciones para minimizar las afecciones al depósito de 5000 m^3 hasta su puesta fuera de servicio.

- Desagüe del volumen de agua almacenado en el depósito en el momento del derrumbe del forjado, para el arrastre de material introducido en el interior del depósito
- Limpieza desde el exterior del depósito de 5000 m^3 mediante camión agua limpia para eliminar material que no se haya eliminado con el arrastre mediante el vaciado.

Actuaciones de adecuación del depósito de 350 m^3.

- Trabajos de preparación desescombro del propio depósito
- Trabajos de limpieza y desinfección del depósito de 350 m^3
- Trabajos de rehabilitación de las fisuras existentes en él.
- Instalación de nuevo grupo de bombeo
- Adecuación de accesos, ventilación y escaleras.
- Eliminación de las antiguas salidas y entradas de agua adecuación del desagüe de fondo
- Instalación de nuevas entradas de agua desde pozo y compra aspiración para la nueva bomba
- Modificación del telecontrol para arranque y paro del pozo y de entrada de agua de compra con los niveles del nuevo pozo.
- Trabajos de limpieza y nivelación de la parcela para mejora del acceso al depósito.

4.3.4. ABA_04. Sustitución variador velocidad grupo rebombeo impulsión del depósito bajo 5000 m^3 al depósito alto 100 m^3 de la urbanización El Bosque (Chiva).

Descripción de los daños.

El sistema de abastecimiento de agua potable de la urbanización el Bosque tiene un depósito Bajo de una capacidad de 5000 m 3 desde el cual se abastece actualmente la población de la Urbanización El Bosque y Adyacentes del municipio de Chiva. Adosado a él se encuentra una caseta donde se albergan el grupo de bombeo, más 1 bomba de reserva, sumergible marca BIZZI&TEDESCHI, tipo 10G50/3Q de 68 kW de potencia con un caudal de extracción de 229 m3/h

a 74 m.c.a. de impulsión al depósito alto de 1000 m^3 y el grupo de rebombeo, más una bomba de reserva, sumergible marca BIZZI&TEDESCHI, tipo 10G50/3Q de 30 kW de potencia con un caudal de extracción de 228 m^3/h a 35 m.c.a. de impulsión al campo de golf.

En la misma caseta, se comparte una sala donde se alberga el cuadro eléctrico general de protección, control y maniobra de la instalación y los variadores de velocidad.

Debido a las intensas lluvias registradas, estas instalaciones se vieron anegadas por las inundaciones del arrastre de agua con barro afectando a las instalaciones eléctricas. Con el objetivo de asegurar el funcionamiento de estos dos grupos de rebombeo se procedió a la revisión por personal eléctrico especializado.

Se revisó la instalación eléctrica de los dos grupos de rebombeo concluyendo la necesidad de y realizar la sustitución del variador de velocidad afectado marca Power Electronics SD450 con número de serie 0705 190 1520 de la bomba, nº2 del grupo de rebombeo del depósito 5000 m^3 bajo de impulsión al depósito alto de 1000 m^3.

Informar que el modelo SD450 del variador de velocidad está obsoleto y descatalogado, el cual se deberá sustituir por el nuevo modelo SD750.

Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA pudo comprobar el estado de la calle y verificar la necesidad de la actuación.

Instalación eléctrica dañada. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Descripción de las actuaciones.

En primer lugar, se han llevado a cabo los trabajos de achique de agua, limpieza de las casetas de los grupos de rebombeo y los variadores y el cuadro general de protección, control y maniobra de la instalación.

En segundo lugar, se procedió a la inhabilitación del variador de velocidad afectado marca Power Electronics, modelo SD450 con número de serie 0705 190 1520 de la bomba, nº2 del grupo de rebombeo del depósito 5000 m^3 bajo de impulsión al depósito alto de 1000 m^3 que resulta necesario sustituir.

4.3.5. ABA 05. Actuaciones para reparación provisional y reposición definitiva de las conducciones de abastecimiento en la urbanización El Bosque y adyacentes. Chiva.

Descripción de los daños.

Las infraestructuras dañadas son las siguientes conducciones municipales de abastecimiento de agua potable. Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA pudo comprobar el estado de la calle y verificar la necesidad de la actuación.

- Tubería Ø150 de fundición dúctil en el cruce del barranco Sierra Perentxisa.

Daños en el cruce del barranco Sierra Perentxisa. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

- Tubería FC 150 en barranco hacia calle 21.

Tubería en barranco hacia calle 21. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

- Tubería FC 125 en cortafuegos entre calles 8 y 16.

Tubería dañada en cortafuegos. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

- Tubería PE110 en calle 24 Viñas.

Las fuertes escorrentías eliminaron el terreno sobre las conducciones, provocando fugas y roturas en las conducciones o en los elementos de maniobra. Debido a la gran cantidad de sedimentos y escombros acumulados sobre las trazas de las conducciones se procedió a realizar canalizaciones mediante tuberías provisionales de polietileno sin enterrar para reponer el servicio en el menor tiempo posible. También se realizaron reparaciones de fugas mediante abrazaderas de reparación.

Descripción de las actuaciones.

La solución definitiva de estas afecciones pasa por realizar canalizaciones definitivas con tuberías enterradas, Para ello, resultará necesario coordinar estos trabajos con los de reposición de las

vías públicas, puentes, etc. por donde discurren dichas conducciones, que ha de ejecutar el Ayuntamiento de Chiva.

Reparaciones urgentes.

Para las reparaciones urgentes, como solución provisional a la problemática descrita ha resultado preciso proceder a la reparación de las fugas y realizar canalizaciones con tuberías provisionales de polietileno y con diámetros inferiores a los de la canalización original, disponiéndose en superficie en muchos de los casos, dadas las malas condiciones de accesibilidad y el estado de deterioro en el que se encuentran el terreno y los puentes e infraestructuras de paso de barrancos sobre las que se ubican.

A continuación, se describen los trabajos de reparación provisional realizados:

- Roturas en tubería de FD 150 mm cruce Barranco Sierra Perentxisa: Se procedió a la reparación de tres averías: una derivación, una rotura en red por acumulación de escombros y la tercera por rotura al compactar el acceso para los vecinos en el cruce del barranco y red posterior.
- Rotura de tubería de fibrocemento Ø150 en barranco hacia Calle 21. Se instaló una conducción provisional mediante 35 metros de tubería de polietileno Ø50 mm ampliada posteriormente con otro tramo Ø63 mm. Se reparó una rotura en la red de fibrocemento.
- Rotura de tubería de fibrocemento Ø125 en cortafuegos entre calles 8 y 16. Ante la rotura de la tubería que abastece a las zonas más bajas de la urbanización, se procedió a su cierre y se dio suministro a esta zona a través de otra conexión. También se instaló un provisional de 75 metros de longitud con tubería de polietileno Ø63 mm para asegurar el suministro.
- Rotura de tubería PE110 en calle 24 Viñas. Se reparó una fuga en la red de distribución Ø110 de polietileno. Esta actuación no requiere de solución definitiva, habiendo quedado totalmente resuelta.

Reparaciones definitivas.

- Roturas en tubería de FD 150 mm cruce Bco Sierra Perentxisa: Se prevé la reposición de un tramo de conducción de fundición dúctil de 150 m de longitud, compuesto por dos tramos de 65 y 40 m respectivamente ubicados antes y después de la obra de paso sobre el barranco, con disposición tradicional enterrada en zanja; y un tramo intermedio de 50 m de conducción de características análogas ubicado mediante anclaje a la futura estructura de paso sobre el barranco que se ejecute, no contemplándose en esta relación valorada el coste de reposición de dicha obra de paso.
- Rotura de tubería de fibrocemento Ø150 en barranco hacia Calle 21.e prevé la reposición de un tramo de conducción de fundición dúctil DN150 mm de 35 m de longitud, ubicado mediante anclaje a la futura estructura de paso sobre el barranco que se ejecute, no contemplándose en esta relación valorada el coste de reposición de dicha obra de paso. Se incluyen las conexiones de este tramo con la conducción original, así como la reposición de un contador general de control sectorial afectado por este tramo.

- Rotura de tubería de fibrocemento Ø125 en cortafuegos entre calles 8 y 16. Se ha previsto la reposición de un tramo de conducción con tubería de fundición dúctil de 150 m de longitud, compuesto por un tramo de 80 m de longitud total, dividido en dos subtramos: uno primero que discurre por el espacio libre entre parcelas que une las calles 8 y 16 sin urbanizar, y un segundo tramo de 9 m de longitud correspondiente al cruce transversal de la calle hasta la conexión con la tubería existente.

4.3.6. ABA_06. Rehabilitación de depósito de agua potable de 5.000 m3 de La Urbanización El Bosque

Descripción de los daños.

Las fuertes escorrentías provocadas por las precipitaciones torrenciales provocaron arrastres de materiales y caída de bloques de roca de la ladera subvertical situada a lo largo del lado norte del depósito. Estos bloques derrumbaron el muro de hormigón armado de aproximadamente 2,5 m de altura que separa la cubierta del depósito de la ladera. La caída de bloques de roca y fragmentos del muro sobre el forjado de cubierta produjo el hundimiento de aproximadamente el 70% de su superficie en la banda más próxima a la ladera, delimitada por el muro de cerramiento norte del depósito y la línea paralela de pilares más próxima.

La cubierta del depósito está constituida por un forjado unidireccional con viguetas, bovedillas de hormigón, capa de compresión de hormigón armado de 5 cm y vigas planas, con las viguetas y bovedillas paralelas a la dimensión mayor del depósito y con vigas planas entre pilares delimitando vanos de aproximadamente 4,15 m de luz y 5,75 m de anchura. Las dificultades de acceso al depósito no han permitido confirmar si los daños han afectado a los pilares más próximos a la zona del hundimiento, o a la calle longitudinal de la cubierta situada inmediatamente al sur.

Descripción de las actuaciones.

Las actuaciones contempladas para la rehabilitación del depósito incluyen la estabilización y protección de la ladera norte contigua al depósito, la reconstrucción del forjado de la cubierta en la superficie hundida y con daños estructurales, y la reconstrucción del muro situado por encima del nivel de la cubierta a lo largo del perímetro norte del depósito. Estas actuaciones pueden desglosarse en las siguientes unidades de obra principales:

- Despeje y retirada de materiales arrastrados, bloques de roca y cascotes de muro acumulados en el pie de la ladera junto al muro norte del depósito.
- Demolición de tramos de muro norte de hormigón armado situados por encima de la cubierta y no afectados por el derrumbamiento.
- Talado de árboles afectados por los trabajos de estabilización de la ladera y por necesidad de liberar el radio de maniobra de grúas operando desde los viales más próximos al depósito.
- Desbroce, saneo y reperfilado de la ladera, incluyendo remoción de material, el despeje y desbroce de determinadas zonas, y retirada de bloques de diverso tamaño que se deben eliminar para la seguridad de los trabajadores y para la estabilidad del sistema de protección previsto.

- Instalación de sistema de protección compuesto por malla de triple torsión 8x10-16, anclado en cabeza y pie de talud mediante el empleo de bulones tipo GEWI Ø25 mm y longitud de 3,00 m, instalado y reforzado mediante el empleo de cable de acero Ø12 mm y bulones tipo GEWI Ø25 mm en cuadrícula de 2Hx2V y longitud 3,00 m.
- Gunitado con hormigón proyectado de resistencia característica 30 N/mm2.de 10 cm de espesor sobre talud por vía húmeda con árido Ø max.12mm y hasta una altura máxima 12m.
- Apuntalamiento de forjado de cubierta con sopandas, durmientes y puntales metálicos arriostrados, cubriendo toda la superficie del depósito.
- Demolición de superficie de cubierta dañada de las 2 calles longitudinales más próximas a la ladera con medios manuales y mecánicos, trabajando desde la superficie de la cubierta.
- Acceso de maquinaria tipo minicargadora y miniexcavadora al interior del depósito para fraccionamiento de cascotes de la estructura derrumbada y demolida, y para su carga y retirada.
- Demolición y regularización de parte superior del muro norte como preparación para ejecución posterior de nuevo alzado de muro por encima del nivel de la cubierta.
- Demolición y reconstrucción de pilares en la línea más próxima a la ladera que puedan haber sido dañados por el hundimiento de la cubierta.
- Ejecución de forjado unidireccional horizontal ejecutado con placas alveolares de 20 cm de canto y una capa de compresión de 5 cm, hormigonado mediante bomba con hormigón HA-30/B/20/XC4 sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 8.85 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el apuntalado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desapuntalado.
- Ejecución de muro de hormigón armado de 1,5 m de altura sobre el nivel de la cubierta a lo largo del muro norte, de 30 cm de espesor, con una cuantía de acero B500S de 70.07 kg/m3 (equivalente a 22.07 kg/m2) dispuesto en barras verticales Ø12 c/15 cm y horizontales Ø10 c/15 cm en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-30/B/20/XC4, incluido el encofrado metálico, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado.
- Transporte y depósito de residuos de construcción y demolición en vertedero actualizado.
- Limpieza y desinfección depósito, incluyendo las analíticas posteriores a la limpieza establecidas en el RD 03/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

4.4. SANEAMIENTO. UTE CHIVA (AGUAS DE VALENCIA/EGEVASA)

4.4.1. SAN_01. Renovación de colectores dañados en el casco urbano de Chiva (Valencia).

Descripción de los daños.

Para la determinación de las afecciones en la red de alcantarillado, el operador ha realizado una auditoría de campo del 92% de los colectores de la red, dentro de las zonas inundadas en el municipio y una campaña de limpieza y desatasco.

La red de alcantarillado afectada en el casco urbano del municipio de Chiva agrupa 515 m de colector junto con registros, arquetas y sus acometidas asociadas.

Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA pudo realizar una inspección visual de distintos puntos en los que la red de colectores había sufrido daños.

En el puente sobre el barranco del Gayo se había montado uno de las EBAR provisionales.

EBAR en la calle Antonio Machado. Fuente: Visita (11-02-2025).

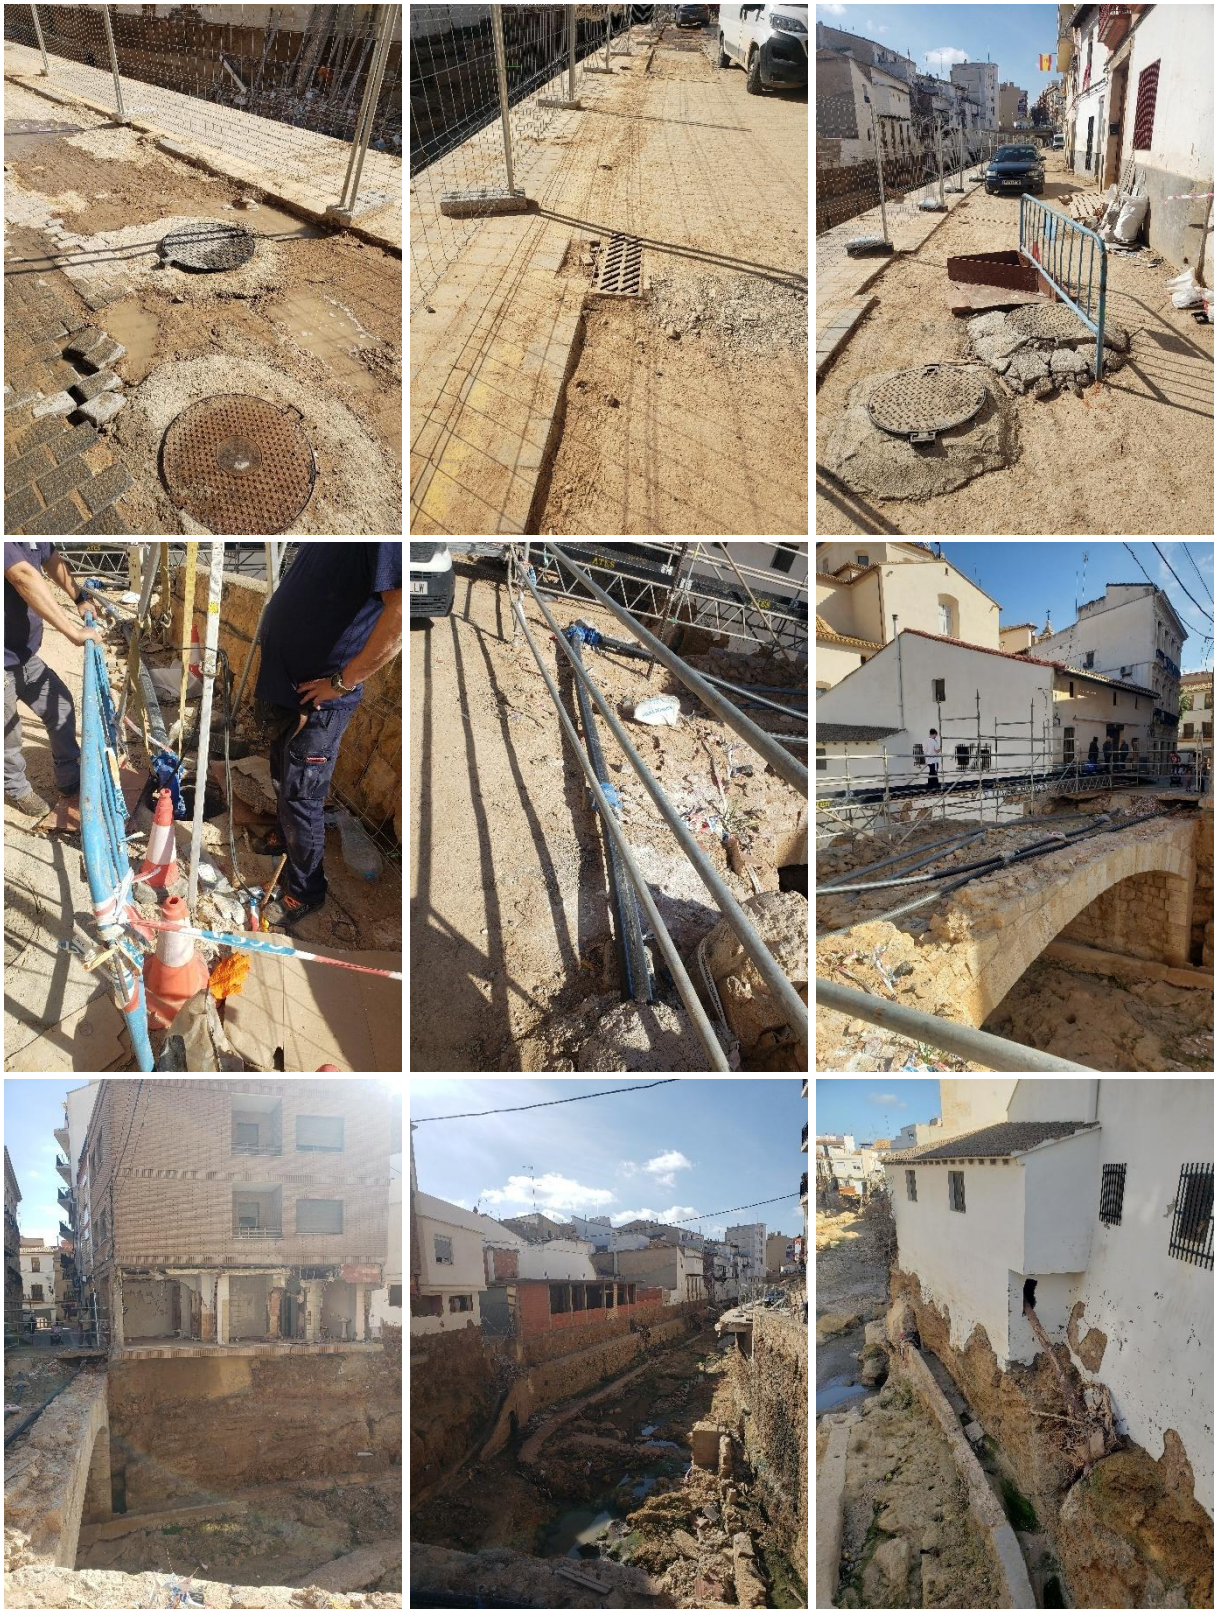

Daños en la calle Buñol hasta la calle Enrique Ponce. Fuente: Visita (11-02-2025).

Descripción de las actuaciones.

La propuesta de actuaciones se ha centrado principalmente en los tramos con estado de auditoría malo, en los que no ha sido posible el desatasco de los colectores mediante equipos de limpieza, si bien no debe limitarse sólo a estas zonas.

Los trabajos de limpieza y desatasco que se lleven a cabo pueden resultar en una recuperación total o parcial de la capacidad hidráulica del colector, si bien existe una probabilidad elevada de que estructuralmente el colector sí esté afectado a consecuencia del episodio de inundaciones, las colmataciones y taponamientos sufridos, los posteriores trabajos de limpieza y desatasco, etc.

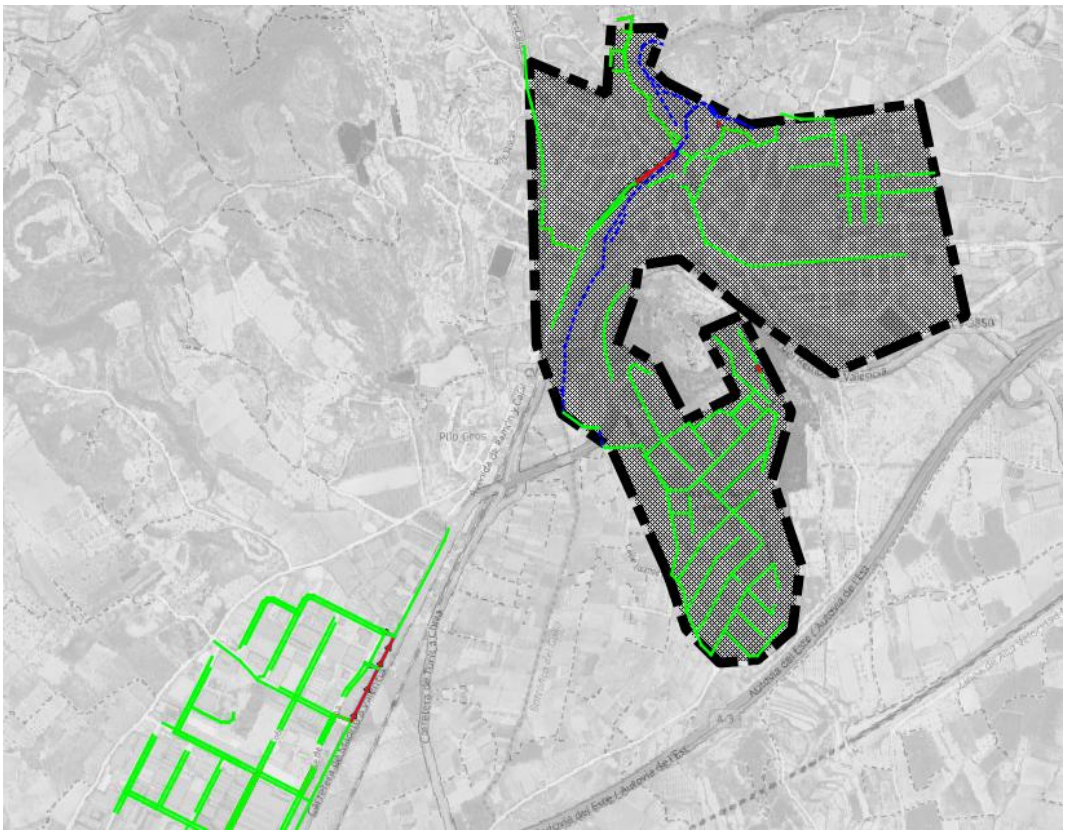

Ubicación aproximada de las actuaciones. Fuente: Memoria del operador.

4.4.2. SAN_02. Renovación de colectores dañados en la zona industrial de Chiva (Valencia).

Descripción de los daños.

La metodología seguida por el operador para determinar el estado de la red de saneamiento de la zona industrial es la misma que en el caso anterior.

La red de alcantarillado afectada en la zona industrial de Chiva involucra 401 m de colector junto con registros, arquetas y acometidas asociadas.

Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA pudo realizar una inspección visual de distintos puntos en los que la red de colectores había sufrido daños.

Daños en la red de saneamiento de la zona industrial. Fuente: Visita (11-02-2025).

Descripción de las actuaciones.

La propuesta de actuaciones se ha centrado principalmente en los tramos con estado de auditoría malo, en los que no ha sido posible el desatasco de los colectores mediante equipos de limpieza, si bien no debe limitarse sólo a estas zonas.

Los trabajos de limpieza y desatasco que se lleven a cabo pueden resultar en una recuperación total o parcial de la capacidad hidráulica del colector, si bien existe una probabilidad elevada de que estructuralmente el colector sí esté afectado a consecuencia del episodio de inundaciones, las colmataciones y taponamientos sufridos, los posteriores trabajos de limpieza y desatasco, etc.

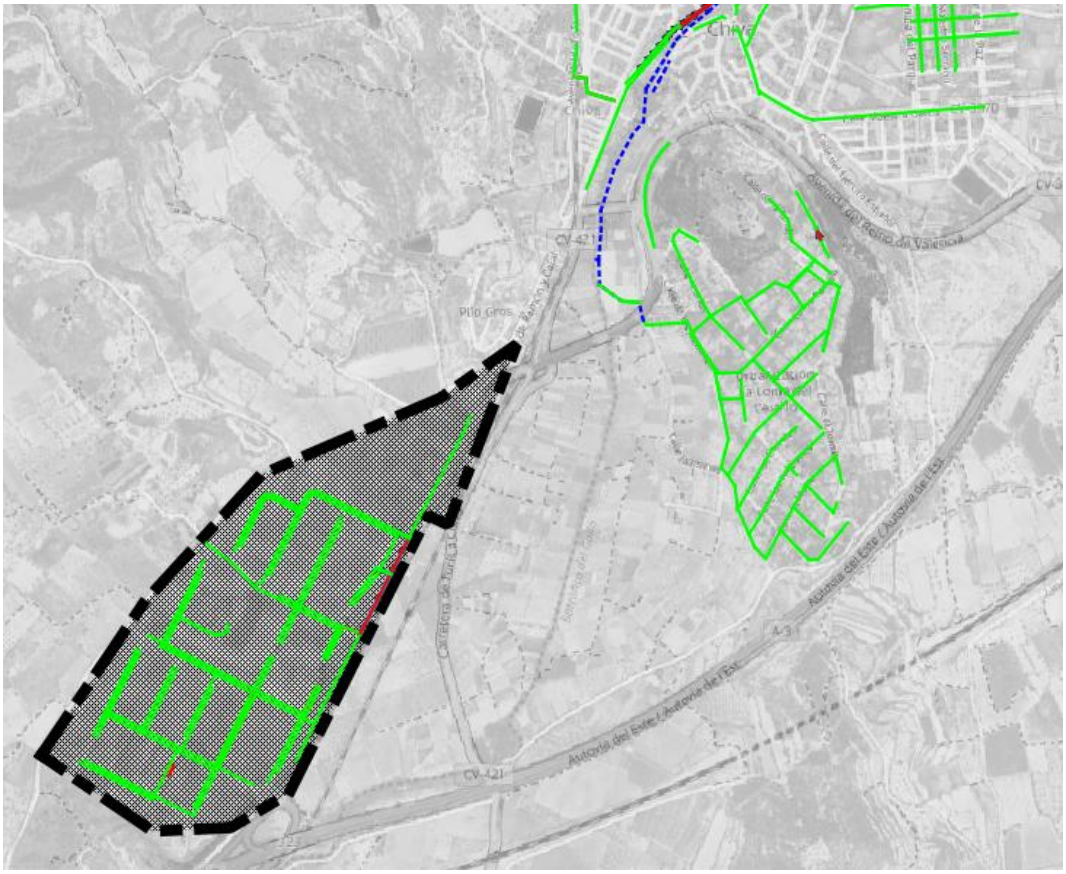

Ubicación aproximada de las actuaciones. Fuente: Memoria del operador.

4.5. DEPURACIÓN. EGEVASA

4.5.1. DEP_01. Actuaciones DANA Chiva.

Descripción de los daños.

Durante las lluvias producidas durante la DANA, se produjo la rotura del colector de salida de la EDAR en diferentes puntos.

Durante la visita a Chiva, el personal de CYGSA inspeccionó tanto las instalaciones de la EDAR como el colector de salida. De esta manera se pudo verificar la necesidad de realizar actuaciones en dichas ubicaciones. Se confirmó la rotura del colector de salida y la necesidad de su reparación.

Al recorrer el camino de acceso a la EDAR, se pudieron observar también diferentes socavones y daños producidos en el mismo. Se habían realizado pequeños rellenos y parches de los socavones.

Daños en el colector de salida de la EDAR. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Daños en el colector camino de acceso de la EDAR. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Además, también se produjeron daños en la propia planta. Una serie de equipos quedaron inutilizados y el vallado de la parcela se vio afectado.

Daños en el vallado de la parcela de la EDAR. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Dentro de la parcela, se registraron daños en diferentes equipos

Equipos de la EDAR cuya reparación es necesaria. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Descripción de las actuaciones.

Las actuaciones propuestas por el operador son las siguientes:

- Reparación del colector de salida a planta, en una longitud de 100 ml, mediante tubería de PVC Ø800, SN4, hormigonada, para evitar el vertido al cauce.
    - Para la ejecución de este tramo será necesario rehabilitar y acondicionar un camino de acceso para que se pueda realizar las obras y mantener el acceso a la planta.
    - Como protección a la misma se ha previsto la colocación de escollera de 300/1000kg en la base de la rambla, la escollera se recebará con hormigón.
    - Para las conexiones de las tuberías fibrocemento a PVC se realizarán dos pozos ciegos y entre estos existe un cambio de dirección del colector en el que había un pozo, que actualmente ha desaparecido, y que hay que ejecutar de nuevo.
- Limpieza de aproximadamente 500 ml. de la red de colectores, gravemente afectado por la acumulación de gravas arrastradas por las lluvias, para restablecer su plena capacidad operativa y garantizar el correcto funcionamiento del mismo.
- Reposición en la EDAR de parte del Vallado y del muro perimetral, además será necesario quitar los cipreses en esos puntos y poner en la zona ajardinada del perímetro geotextil y gravilla decorativa.
- Desmontaje y retirada de las instalaciones electromecánicas dañadas e instalación de los equipos electromecánicos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones conforme al desglose detallado en el anexo nº 2

4.5.2. DEP_02. Actuaciones DANA Chiva- Urbanización La Loma.

Descripción de los daños.

Durante las lluvias producidas durante la DANA, se produjo la rotura del decantador de la EDAR de la urbanización La Loma en Chiva. En nivel alcanzado por el agua provocó que el decantador flotase y se produjera la rotura total del elemento.

En las siguientes imágenes proporcionadas por el operador, se pueden observar los daños en el elemento.

Extracción del decantador dañado. Fuente: EGEVASA.

Daños en la planta de la Urbanización La Loma. Fuente: EGEVASA.

Durante la visita, el personal de CYGSA pudo verificar la necesidad de las actuaciones y realizar una inspección visual de la EDAR en cuestión.

Estado de las instalaciones. Fuente: Visita realizada (11-02-2025).

Descripción de las actuaciones.

Como se ha comentado anteriormente, es necesaria la ejecución de un nuevo decantador estático, pues el actual quedó completamente inoperativo. Las tareas a realizar son:

- Retirada y limpieza de los depósitos de barro, arenas y gravas acumulados en las obras de fábrica y en la parcela, con el objetivo de restablecer las condiciones necesarias para su operatividad, y reparación de los daños ocasionados en la urbanización y viales.
- Desmontaje y retirada de las instalaciones electromecánicas dañadas e instalación de los equipos electromecánicos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

5. TRABAJOS REALIZADOS

Personal de CYGSA realizó una visita a las instalaciones afectadas por la DANA de este Municipio acompañados del personal de la empresa operador.

Las labores durante estas visitas de inspección de forma genérica fueron las siguientes:

- Verificación de los daños producidos por la DANA e incluidos en las memorias valoradas previas.
- Toma de fotografías georreferenciadas de las zonas afectadas.
- Comprobación del estado de las infraestructuras dañadas, abriendo arquetas o pozos en los casos necesarios.
- Mediciones in situ de aquellos elementos “medibles” tales como diámetros de tuberías, nº de pozos, etc.
- En el caso de equipos verificación de las características de los mismos

Posteriormente se ha realizado un trabajo de gabinete para dar tratamiento a los datos tomados en campo:

- Generación de un GIS sobre la foto aérea con las fotografías georreferenciadas tomas en campo.
- Comparación de fotografías actuales vs las facilitadas por los operadores los días posteriores a la DANA
- Elaboración de mediciones a partir de los datos y fotografías tomadas en campo
- Generación de croquis o planos cuando ha sido necesario.

6. VALORACIONES

6.1. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA VALORACIÓN

Para que sean tenidos en cuenta en la presente valoración de daños, los correspondientes elementos a reponer deben ser los mismos, o de similares características, a aquéllos existentes previamente. No se admitirán elementos o actuaciones que supongan mejoras o cambios significativos sobre la infraestructura anteriormente existente si implican un mayor coste de reposición.

Se estudiarán, sin embargo, en cada caso particular, aquellas variaciones o mejoras que vengan impuestas por requerimientos establecidos en normativas de seguridad vigentes o por requisitos técnicos objetivos que sean exigidos por los organismos competentes en cada caso.

Además de lo anterior se aplican los siguientes criterios en diversos aspectos.

- **Direcciones de Obra**. En el caso de obras ejecutadas se valorará en función del importe adjudicado o contratado, en el caso de obras pendientes de ejecutar se considera

conforme a la instrucción para la redacción de proyectos a incluir en los Planos Provinciales de la Diputación Provincial de Valencia (BOP nº 44 21-02-2014).

HONORARIOS POR REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PARA LA DIPUTACIÓN

PEM hasta (euros)	Coeficiente proyecto	Coeficiente E.S.S.	Coeficiente proyecto + ESS	Coeficiente Dirección (Técnico superior)	Coeficiente Dirección (Técnico medio)	Coeficiente Plan de seguridad y coordinador de seguridad (30% s/ Dirección)
25.000	5,60	0,700	6,300	2,40	2,40	0,720
35.000	5,25	0,525	5,775	2,25	2,25	0,675
55.000	4,90	0,490	5,390	2,10	2,10	0,630
110.000	4,55	0,455	5,005	1,95	1,95	0,585
220.000	4,20	0,420	4,620	1,80	1,80	0,540
440.000	3,85	0,385	4,235	1,65	1,65	0,495
1.100.000	3,50	0,350	3,850	1,50	1,50	0,450
1.800.000	3,15	0,315	3,465	1,35	1,35	0,405
3.000.000	2,80	0,280	3,080	1,20	1,20	0,360
4.500.000	2,45	0,245	2,695	1,05	1,05	0,315
9.000.000	2,10	0,210	2,310	0,90	0,90	0,270
15.000.000	1,75	0,175	1,925	0,75	0,75	0,225
>15.000.000	1,40	0,140	1,540	0,60	0,60	0,180
Honorarios = PEM × Coeficiente / 100						
Honorarios mínimos (euros)	250	150	400	250	250	150

2014/4095

- **<u>Partidas alzadas de imprevistos y a justificar</u>**: no se reconocen. Se considera en su lugar un incremento de un 10% sobre el total de la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concepto de adicional de liquidación para tener en cuenta posibles incrementos de medición que se produzcan durante la ejecución de las obras.
- **<u>IVA</u>**. Se incluye el IVA tan sólo en las valoraciones de aquellos servicios operados directamente por el Ayuntamiento.
- **<u>Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial</u>**: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, a aquellos que estén incluidos en el *"Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.*
- **<u>Gestión de residuos</u>**. En trabajos ya ejecutados se valorará en función de los importes acreditados o en su defecto en un 6% del PEM. En trabajos pendientes de ejecutar se valorará en un 6% del PEM de manera general, en un 3% para EDARs, o mediante unidades de obra en el caso de que así esté reflejado en la memoria del operador.
- **<u>Seguridad y Salud</u>**. En trabajos ya ejecutados se valorará en función de los importes acreditados o en su defecto en un 2% del PEM. En trabajos pendientes de ejecutar se valorará en un 2% del PEM.

6.2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Los precios utilizados para las valoraciones de las actuaciones desarrolladas en este documento se han obtenidos de la siguiente documentación, cuya diferenciación se puede realizar en función del código.

- XXXX.Nxxx. 4 letras mayúsculas seguidas de un punto, un dígito y luego 1 o más letras minúsculas. Precios obtenidos de la "Base de datos de construcción" del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). https://bdc.f-ive.es/BDC24/3. Por ejemplo, AMME.1baba.
- XNNNNNNNNNN. 1 letra mayúscula seguida de 9 o 10 dígitos. Precios de la base de precios de la Dirección General del Agua (DGA). Por ejemplo, E050100001
- HID_XXXX. Las siglas HID seguidas de un guion bajo y una breve descripción. Precios obtenidos de la memoria valorada de HIDRAQUA. Por ejemplo, HID_ABRAZ50.
- *****_CYG. Cualquiera de los precios anteriores seguidos de un guion bajo y las siglas CYG. Precios de la base de datos indicada por la primera parte del precio pero que han sido modificados por CYGSA para adaptares a las circunstancias. Por ejemplo, A0106010102_CYG
- CYG_XXX. Las siglas CYG seguidas de un guion bajo y una breve descripción. Precios creados por CYGSA para esta memoria a partir de los documentos indicados anteriormente y/o de otra información del consultor. Por ejemplo, CYG_REPFUG.

En los precios utilizados de las bases de precio del IVE 2024 y de la DGA se ha considerado un incremento de un 20% con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.

A todos los precios anteriores se le supone un 6% de costes indirectos.

6.3. MEDICIONES

Las mediciones realizadas para la valoración de las actuaciones a llevar a cabo se han realizado a parir de:

- Documentación remitida por el operador y verificada en campo por CYGSA
- Toma de datos de campo de CYGSA
- Mediciones realizadas en gabinete a partir de la toma de datos de campo

El anexo 3 recoge la documentación gráfica de apoyo utilizada para estas mediciones.

7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Se muestra a continuación los resúmenes de los presupuestos obtenidos para cada fase del ciclo urbano del agua y para cada operador.

El desarrollo completo de los presupuestos puede consultarse en el Anexo 4.

7.1. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA

	ABASTECIMIENTO HIDRAQUA	
10.03.01	REPARACIONES TUBERÍAS AFECTADAS	66.786,97€
10.03.02	REPARACIÓN DEPÓSITO AGUA POTABLE	433.009,47€
10.03.03	GESTION DE RESIDUOS	29.987,79€
10.03.04	SEGURIDAD Y SALUD	9.995,93€
10.03.05	ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)	53.978,02€
	TOTAL PEM	**593.758,18€**
	REDACCIÓN PROYECTO (3,5% s/PEM)	20.781,54€
	DIRECCION DE OBRA (1,5% s/PEM)	8.906,37€
	TOTAL 2	**623.446,09€**
	ACTUACIONES YA EJECUTADAS	70.282,29€
	PRESUPUESTO TOTAL	**693.728,38€**

Las principales diferencias entre el presupuesto del operador y el realizado consiste en: No existe descompuesto en los importes de las canalizaciones de abastecimiento a sustituir, haciendo CYGSA un presupuesto según mediciones estimadas con los cuadros de precios indicados en el punto 6.2.

Para la adecuación del depósito de agua potable, los precios del cuadro de precios utilizado no se corresponden con los usados por el operador. CYGSA ha considerado la sustitución del forjado en su totalidad porque no sabemos el grado de afección de dicho forjado. El operador solo ha estimado la crujía que ha caído por el peso de las tierras de los deslizamientos sin tener en cuenta la posible afección de las zonas aledañas.

7.2. ABASTECIMIENTO. UTE CHIVA

	ABASTECIMIENTO CHIVA UTE	
10.02.01	C/ ENRIQUE PONCE FASE 1	25.196,13€
10.02.02	C/ RAMÓN Y CAJAL FASE 1	8.065,15€
10.02.03	BARRANCO DEL GALLEGO FASE 1	126.285,65€
10.02.04	C/ SAN ISIDRO FASE 1	27.295,21€
10.02.05	C/ OLIVERA FASE 1	19.023,85€
10.02.06	LOMA DE MIRALCAMPO FASE 1	224.943,47€
10.02.07	RED DE DISTRIBUCIÓN DEL CASCO URBANO FASE 1	132.135,96€
10.02.08	CONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS A.P. CHIVA Y CHESTE FASE 1	67.197,17€
10.02.09	DISTRIBUCIÓN A URB. LOMA DEL CASTILLO FASE 1	60.802,25€
10.02.10	URBANIZACIÓN SAN ALVARO FASE 1	19.804,62€
10.02.11	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS BOMBEOS CHIVA FASE 1	218.762,30€
10.02.12	REPARACIÓN CAMINO ACCESO A POZOS LA SOLANA FASE 1	62.911,45€
10.02.13	GESTION DE RESIDUOS	8.611,10€
10.02.14	SEGURIDAD Y SALUD	7.245,61€
10.02.15	ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)	37.813,73€
	TOTAL PEM	**1.046.093,65€**
	REDACCIÓN PROYECTO (3,85% s/PEM)	40.274,61€
	DIRECCION DE OBRA (1,65% s/PEM)	17.260,55€
	TOTAL 2	**1.103.628,81€**
	ACTUACIONES YA EJECUTADAS	424.007,12€
	PRESUPUESTO TOTAL	**1.527.635,93€**

Las principales diferencias en el presupuesto estimado por CYGSA y el operador es debido a que éste estima partidas de imprevistos que no se han tenido en cuenta y los precios estimados no se corresponden con los precios usados para la elaboración de este presupuesto.

7.3. SANEAMIENTO. UTE CHIVA

	SANEAMIENTO CHIVA UTE	
10.01.01	RENOVACIÓN COLECTORES DAÑADOS EN CASCO URBANO CHIVA FASE 1	630.308,22€
10.01.02	RENOVACIÓN COLECTORES DAÑADOS ZONA INDUSTRIAL CHIVA FASE 1	402.188,53€
	GESTION DE RESIDUOS (suma de 10.01.01 y 10.01.02)	61.949,80€
	SEGURIDAD Y SALUD (suma de 10.01.01 y 10.01.02)	20.649,93€
	ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%) (suma de 10.01.01 y 10.01.02)	111.509,65€
	TOTAL PEM	**1.226.606,13€**
	REDACCIÓN PROYECTO (3,15% s/PEM)	38.638,09€
	DIRECCION DE OBRA (1,35% s/PEM)	16.559,18€
	TOTAL 2	**1.281.803,40€**
	ACTUACIONES YA EJECUTADAS	702.558,13€
	PRESUPUESTO TOTAL	**1.984.361,53€**

Al igual que con los presupuestos de abastecimiento de este operador, las diferencias de importes se encuentran en las partidas de imprevistos no valoradas y en la utilización de las bases de precios indicadas en el punto 6.2 de este informe que son unidades con precios de menor importe.

7.4. DEPURACIÓN. EGEVASA

	DEPURACIÓN CHIVA EGEVASA	
10.03.01	DEPURADORA CHIVA	321.679,50€
10.03.02	DEPURACIÓN URB. LA LOMA EGEVASA	75.842,15€
	GESTION DE RESIDUOS	6.884,23€
	SEGURIDAD Y SALUD	7.950,43€
	ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)	41.235,64€
	TOTAL PEM	**453.591,95€**
	GG (13%)	58.966,95€
	BI (6%)	27.215,52€
	TOTAL 1	**539.774,42€**
	REDACCIÓN PROYECTO (3,5% s/PEM)	15.875,72€
	DIRECCION DE OBRA (1,5% s/PEM)	6.803,88€
	TOTAL 2	**562.454,02€**
	ACTUACIONES YA EJECUTADAS	67.947,97€
	PRESUPUESTO TOTAL	**630.401,99€**

Las diferencias observadas entre los presupuestos del operador y CYGSA se debe a partidas alzadas no tenidas en cuenta en el presupuesto, así como a los precios de obra civil utilizados por el operador que son de mayor importe. En cuanto a los equipos, bien se han utilizado los mismos precios presentados por el operador o bien se ha pedido precio a proveedores para contrastar los importes y son los utilizados para la elaboración de este presupuesto.

7.5. RESUMEN

Se muestra a continuación una tabla resumen con los importes totales del municipio de CHIVA (VALENCIA).

FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	OPERADOR	VALORACIÓN ACTUACIONES
ABASTECIMIENTO	INDIRECTA	UTE	1.527.635,93 €
ABASTECIMIENTO	INDIRECTA	HIDRAQUA	693.728,38 €
SANEAMIENTO	INDIRECTA	UTE	1.984.361,53 €
DEPURACIÓN	INDIRECTA	EGEVASA	630.401,99 €
TOTAL CHIVA (VALENCIA)			**4.836.127,83 €**

Asciende el Presupuesto líquido a la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. (4.836.127,83€)

8. PLAZO

El plazo estimado por los operadores es, en cada caso, el siguiente:

- Abastecimiento:
  - UTE CHIVA (AV/EG): TRECE (13) MESES
  - HIDRAQUA: VEINTE (20) MESES
- Saneamiento: DOCE (12) MESES
- Depuración: CUATRO (4) MESES

Firmado por BENAVENT GASCON, CARLOS (FIRMA) el día 15/07/2025 con un certificado emitido por AC DNIE 004



Firmado por MILLAN PEREZ JUAN CARLOS - DNI ***4529** el día 18/07/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

Firmado electrónicamente:

EL AUTOR

Carlos Benavent Gascón

VºBº

EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Juan Carlos Millán Pérez

ANEXOS

ANEXO 1. SOLICITUD PRESENTADA

CHIVA	SANEAMIENTO	Gestión indirecta	UTE CHIVA(AV/EG)	Sistema de saneamiento con funcionamiento en precario con deficiencias hidráulicas y/o estructurales	Colectores de residuales, acometidas domiciliarias e imbornales obstruidos y/o con daños estructurales tras los trabajos de limpieza y desatasco.	– Obras de emergencia para evitar el vertido de aguas residuales al cauce del bco. Poyo en el TM de Chiva (Actuación Iniciada). – Renovación de colectores dañados en el casco urbano de Chiva (Actuación No iniciada). – Renovación de colectores dañados en la zona industrial de Chiva (Actuación No iniciada). – Conexión provisional de puntos de vertido en el TM de Chiva al DPH al colector general (actuación de vertido 0) (Actuación Ejecutada (OP)). – Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva (Actuación Ejecutada (OP)). – Reposición de trapas de saneamiento (Actuación Ejecutada (OP)). – Habilitación de Campas Intermedias, para agilizar los trabajos de campo de retirada de lodos procedentes de la red de alcantarillado. (Actuación Ejecutada (OP)). – Horas de personal organizando en campo los trabajos de limpieza de los camiones de alcantarillado en los municipios afectos por la DANA - Saneamiento (Actuación Ejecutada (OP)). – Trabajos de limpieza inicial con equipos de voluntarios de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva (Actuación Ejecutada (OP)). – Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantía del servicio durante la DANA y días posteriores - Saneamiento (Actuación Ejecutada (OP)). – Trabajos de limpieza especializada prevista de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva (Actuación No iniciada (OP)). – Trabajos de auditoría prevista de la red de alcantarillado en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva (Actuación No iniciada (OP)). – Trabajos de inspección prevista por medio de cámara de la red de alcantarillado en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva (Actuación No iniciada (OP)).	4,670,788.59 €	12 meses
	ABASTECIMIENTO	Gestión indirecta	UTE CHIVA(AV/EG)	Sistema en funcionamiento con un índices de fugas superior al habitual y reparaciones provisionales pendientes de pasar a definitivas	Red de agua potable con fugas tanto en tuberías como acometidas. Problemas en equipamiento electromecánico e instrumentación	– Canalización provisional para la reposición del servicio en diversas áreas del núcleo urbano de Chiva (Actuación Ejecutada). – Canalización provisional para la reposición del servicio a urbanizaciones por el bco. del Gallego (Actuación Ejecutada). – Canalización definitiva de la red de agua potable en la C/ Enrique Ponce (Actuación No iniciada). – Canalización definitiva de la red de agua potable en la C/ Ramón y Cajal (Actuación No iniciada). – Canalización definitiva de la tubería de abastecimiento a urbanizaciones por el bco. del Gallego (Actuación No iniciada). – Canalización definitiva de la red de agua potable en la C/ San Isidro (Actuación No iniciada). – Canalización definitiva de la red de agua potable en la C/ Olivera (Actuación No iniciada).	4,923,410.42 €	13 meses

						– Renovación de la tubería de suministro a la urbanización Loma Miralcampo (Actuación No iniciada). – Renovación de tuberías de la red de distribución del casco urbano dañadas (Actuación No iniciada). – Renovación de la tubería de conexión entre los sistemas de agua potable de Chiva y Cheste (Actuación No iniciada). – Renovación de la tubería de suministro a la urbanización Loma del Castillo (Actuación No iniciada). – Renovación de la tubería de suministro a la urbanización San Álvaro y red de distribución afectada (Actuación Ejecutada). – Renovación de instalaciones electromecánicas dañadas en pozos y bombeos del sistema de abastecimiento (Actuación Ejecutada). – Implantación de la ETAP de desnitrificación y CAG ante la ausencia de suministro de agua potable en la urb. Calicanto (Actuación No iniciada).- Reparación de caminos de acceso a infraestructuras básicas del servicio de agua potable (Actuación No iniciada). – Reparación de emergencia tapado de tubería a urbanizaciones (Actuación Ejecutada (OP)). – Suministro eléctrico de emergencia mediante Grupo Electrógeno a pozos Solana (Actuación Ejecutada (OP)). – Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. (Actuación Ejecutada (OP)). – Reparación de emergencia de fuga en tubería a urbanizaciones cercano a CV-50 (Actuación Ejecutada (OP)). – Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el control y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida (Actuación Ejecutada (OP)). – Sustitución de equipos de sensorización dañados por DANA (Actuación Ejecutada (OP)). – Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro (Actuación Ejecutada (OP)). – Suministro eléctrico de emergencia mediante grupo electrógeno a pozo San Álvaro y bombeos a urbanizaciones (Actuación Ejecutada (OP)). – Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantía del servicio durante la DANA y días posteriores - Agua Potable (Actuación Ejecutada (OP)). – Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el control y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida (Actuación Ejecutada (OP)). – Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. (Actuación Ejecutada (OP)). – Trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios del servicio durante los días posteriores a la DANA (Actuación Ejecutada (OP)). – Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantía del servicio durante la DANA y días posteriores - Agua Potable (Actuación Ejecutada (OP)). – Trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios del servicio durante los dias posteriores a la DANA (Actuación Ejecutada (OP)). – Suministro Cubas Agua Potable al municipio (Actuación Ejecutada (OP)). – Suministro Cubas Agua Potable al municipio (Actuación Ejecutada (OP)).		

	ABASTECIMIENTO	GESTIÓN INDIRECTA	HIDRAQUA	Depósito de cabecera inoperativo por desprendimiento parcial de la cubierta Puesta en servicio depósito provisional para dar suministro Conducciones de distribución parcialmente operativas mediante provisionales Instalaciones eléctricas y telemando pozo y rebombeo reparadas	Desprendimiento parcial de la cubierta del depósito de cabecera Desaparición de tramos y varias roturas de conducciones de distribución Falta de suministro eléctrico y daños en los variadores del pozo y bombeo Daños en elementos de control y comunicación del telemando	– Gestión cubas de agua potable durante el episodio de agua NO potable – Habilitar depósito provisional para dar suministro mientras se repare depósito cabecera. – Reparación averías redes de distribución – Reposición tramos provisionales instalados para dar servicio de agua – Reparación de variadores de pozo y bombeo – Suministro de gasoil para grupo electrógeno durante la falta de sunimistro eléctrico al pozo – Reparación cubierta depósito principal, habilitación y puesta en servicio del depósito principal – Memorias valoradas que desarrollan estas actuaciones ABA_01, ABA_02, ABA_03, ABA_04, ABA_05 y ABA_06	491287.28	20 meses
	DEPURACIÓN	Gestión indirecta	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A.	EDAR en funcionamiento con procesos e instalaciones electromecánicas afectadas	EDAR con afecciones a los procesos de depuración por inundación, con daños en los equipos electromecánicos	– Obras de acondicionamiento y reparación de la EDAR Chiva (Actuación Iniciada). – Obras de acondicionamiento y reparación de la EDAR Chiva - Urb. La Loma (Actuación Iniciada). – Actuaciones de emergencia para la puesta en marcha provisional de la EDAR Chiva (Actuación Iniciada). – Actuaciones de emergencia para la puesta en marcha provisional de la EDAR Chiva - Urb. La Loma (Actuación Iniciada). – Obras de reposición de instrumentación, comunicaciones y sensorización de la EDAR Chiva (Actuación Iniciada).	932426.16	4 meses
						ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL DAÑOS	**11,017,912.45 €**	

ANEXO 2. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES

1. ALEGACIONES GENERALES

En respuesta a las alegaciones recibidas respecto a los criterios generales establecidos para esta valoración, se han considerado las siguientes:

- Precios: se incrementan un 20% los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción tras la DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: no se reconocen. Se considera en su lugar un incremento de un 10% sobre el total de la valoración de las actuaciones en concepto de adicional de liquidación para tener en cuenta posibles incrementos de medición que se produzcan durante la ejecución de las obras, en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Las alegaciones referentes a los % de dirección de obra considerados no se han tenido en cuenta, entendiéndose adecuado mantener los criterios al respecto indicados en el apartado 6.1 de este documento.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, a aquellos que estén incluidos en el “Artículo 3. Ámbito subjetivo” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Gestión de residuos. Se aumenta el % considerado, excepto en obras de depuración, que mantiene su valoración en un 3%. Para el resto de los trabajos, se valora, para los ya ejecutados, según los importes acreditados o, en su defecto, en un 6% del PEM. Los demás trabajos pendientes de ejecutar se valoran en un 6% del PEM de manera general, o mediante unidades de obra en el caso de que así esté reflejado en la memoria del operador.
- Seguridad y Salud: se considera adecuado mantener los criterios originales indicados en el apartado 6.1 de este documento.

2. ALEGACIONES PARTICULARES

2.1. ABASTECIMIENTO. HIDRAQUA

Se responden, a continuación, las alegaciones particulares a la memoria valorada de Chiva en materia de abastecimiento, por parte de Hidraqua.

- **ABA_06. Rehabilitación de depósito de agua potable de 5.000 m3 de la urbanización El Bosque.**

Actuación incluida en la memoria valorada inicial.

Se expone:

- *Protección de la ladera: La valoración aprobada solo contempla el trabajo de gunitado. El presupuesto alegado incluye trabajos adicionales necesarios para la consolidación de la ladera, como despeje y desbroce del terreno, refino del talud, desmonte de árbol, protección del talud con malla reforzada, gestión de residuos y seguridad y salud.*
- *Importes: El presupuesto alegado para la "Protección de la ladera" asciende a 57.369,69 €, mientras que la valoración aprobada no detalla estos conceptos y solo considera el gunitado. Esto implica una diferencia significativa en el importe total.*

Respuesta:

Tras la revisión de la alegación correspondiente, se procede a actualizar la memoria valorada e incorporar las partidas necesarias. Se procede a retirar la partida de excavación a cielo abierto para incorporar las partidas de:

- **Refino y acabado del talud.**
- **Desmonte de árbol con tocón.**
- **Protección de talud con malla galvanizada.**

Se toman los precios de la base del IVE incrementados en un 20%.

- **ABA 05. Actuaciones para reparación provisional y reposición definitiva de las conducciones de abastecimiento en la urbanización El Bosque y adyacentes.**

Actuación incluida en la memoria valorada inicial.

Se expone:

En el presente apartado se desarrolla una comparativa detallada entre la valoración económica entregada por esta parte y el presupuesto por el ministerio, con el objetivo de poner de manifiesto las diferencias existentes en cada uno de los capítulos que componen la actuación, que si bien no estaban desglosados expresamente en nuestra valoración, si son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de reposición.

Unidad nº	Descripción de la partida	Valor ministerio	Importe solicitado	Observaciones
10.04.01.01 Cruce barranco Sierra Perentxisa	Anclajes para sujetar la tubería al tablero del nuevo puente	No contemplado	1.875,00 €	25 ud con un coste de 75€/ud
10.04.01.02 Cruce barranco calle 21	Unidad de contador sectorial	690,00 €	3.750,00 €	Se deben incluir los accesorios necesarios para su instalación sobre la nueva tubería, nueva arqueta, así como la unidad de telelectura
10.04.01.03	Medios auxiliares	No contemplado	5.200,00 €	La pendiente del vial es del 25% por lo que son necesarios medios

Tubería en cortafuegos entre calles 8 y 10	para montaje de la tubería			auxiliares para poder instalar la tubería. Se estima el uso de una retro excavadora durante dos semanas

Respuesta:

Tras la revisión de la alegación correspondiente, se procede a actualizar la memoria valorada e incorporar las partidas necesarias.

2.2. ABASTECIMIENTO. UTE AGUAS DE CHIVA

Se desarrollan, a continuación, las alegaciones particulares a la memoria valorada de Chiva en materia de abastecimiento, por parte de UTE Aguas de Chiva.

- **Reparación del camino de acceso a infraestructuras básicas del servicio de agua potable. Accesos a los pozos Solana.**

Actuación incluida en la memoria valorada inicial.

Se expone:

> *Se han detectado una serie de omisiones en la memoria realizada por la DGA frente a la presentada por esta concesionaria, en relación con los siguientes capítulos:*
>
> *Demoliciones y movimientos de tierra:*
> - *No se ha tenido en cuenta el despeje y desbroce del terreno.*
> - *Se ha contemplado un escarificado del firme actual en toda la superficie frente a la demolición completa del firme de hormigón.*
>
> *Pavimento:*
> - *El tipo de pavimento a reponer es un pavimento de hormigón coloreado que incluye mallazo electrosoldado con acabado alisado rallado y ejecutado de juntas de hormigón, mientras que la partida considerada para la reposición del pavimento únicamente contempla hormigón en masa como material.*
>
> *Gestión de residuos:*
> - *No se han tenido en cuenta la separación en la naturaleza de los distintos materiales y depósitos que conlleva distintos costes.*
>
> *Por tanto, se SOLICITA que se incorporen las partidas omitidas para la correcta ejecución de los trabajos de reparación y renovación y se respete la solución original planteada por la empresa concesionaria.*

Respuesta:

Tras realizar una revisión de las partidas, se procede a añadir las partidas anteriormente descritas de demolición, movimientos de tierra y pavimento al presupuesto de la memoria valorada. Se toman los precios de la base del IVE incrementados en un 20%.

En cuanto a la gestión de residuos, se contemplan dentro del 6% del PEM, de acuerdo con los criterios generales de valoración establecidos.

- **Canalización definitiva de la tubería de abastecimiento a urbanizaciones por el Barranco del Gallego**

Actuación incluida en la memoria valorada inicial.

Se expone:

> *Se han detectado una serie de omisiones en la memoria realizada por la DGA frente a la presentada por esta concesionaria, en relación con los siguientes capítulos.*
>
> *Actuaciones complementarias. No se ha tenido en cuenta la partida de "sobrecoste de ejecución por cruce del barranco" que implica:*
>
> - *Sobre-excavación y rellenos especiales tipo escolleras recebadas de hormigón para situar la tubería a profundidad según exigencias determinada por la CHJ.*
> - *Posible desvío del cauce existente mediante la ejecución de ataguía y encauzamiento provisional.*
> - *Restablecimiento y/o acondicionamiento del barranco una vez ejecutada la obra.*
>
> *Gestión de residuos.*
>
> - *Al contemplar un relleno de zanja con tierras procedentes de la excavación en lugar de con zahorras, no se considera el volumen total de tierras a gestionar.*
>
> *Por tanto, se SOLICITA que se incorporen las partidas omitidas para la correcta ejecución de los trabajos de reparación y renovación y se respete la solución original planteada por la empresa concesionaria.*

Respuesta:

Tras la revisión de la información, se ha procedido a incluir en la valoración un apartado en el que se tenga en cuenta el condicionante del barranco. Se toman los precios de la base del IVE incrementados en un 20%.

En cuanto a la gestión de residuos, se contemplan dentro del 6% del PEM, de acuerdo con los criterios generales de valoración establecidos.

- **<u>Renovación de la tubería de suministro a la urbanización Loma Miralcampo (Chiva)</u>**

Actuación incluida en la memoria valorada inicial.

Se expone:

> *Se han detectado una serie de omisiones en la memoria realizada por la DGA frente a la presentada por esta concesionaria, en relación con los siguientes capítulos.*
>
> *Actuaciones complementarias.*
>
> - *No se han tenido en cuenta los trabajos de detección de servicios con georrádar y posibles desvío o reposición de los mismos.*
> - *No se ha tenido en cuenta la instalación de una tubería provisional de obra para dar servicio de agua potable durante las obras.*
> - *No se ha tenido en cuenta el "Sobrecoste de ejecución por cruce del barranco" que implica: Sobre-excavación y rellenos especiales tipo escolleras recebadas de hormigón para situar la tubería a profundidad según exigencias determinada por la CHJ.*
> - *Posible desvío del cauce existente mediante la ejecución de ataguía y encauzamiento provisional.*
> - *Restablecimiento y/o acondicionamiento del barranco una vez ejecutada la obra.*
>
> *Gestión de residuos.*
>
> - *Al contemplar un relleno de zanja con tierras procedentes de la excavación en lugar de con zahorras, no se considera el volumen total de tierras a gestionar.*
>
> *Por tanto, se SOLICITA que se incorporen las partidas omitidas para la correcta ejecución de los trabajos de reparación y renovación y se respete la solución original planteada por la empresa concesionaria.*

Respuesta:

Tras la revisión de la información, se ha procedido a incluir en la valoración un apartado en el que se tenga en cuenta:

- **El condicionante de cruce del barranco.**
- **La instalación de una tubería provisional para el mantenimiento del servicio durante las obras.**
- **Los trabajos de detección de servicios mediante georrádar.**

Se toman los precios de la base del IVE incrementados en un 20%.

2.3. DEPURACIÓN. EGEVASA

Se desarrollan, a continuación, las alegaciones particulares a la memoria valorada de Siete Aguas en materia de depuración.

- **Fase 0. EDAR Chiva La Loma**

Actuación excluida en la memoria valorada inicial.

Se expone:

> *No se han tenido en cuenta el coste de las analíticas de entrada y de salida de la EDAR realizadas, para ver el estado de la planta, ni el coste de la mano de obra para las funciones de recuperación de servicio.*
>
> *Actuación ejecutada pero no reconocida en la memoria.*
>
> *A pesar de haberse llevado a cabo, al considerarse necesaria, esta actuación ha sido excluida de la memoria remitida por el MITECO. Su ejecución responde a la necesidad de garantizar la funcionalidad y restitución de las instalaciones, por lo que se considera imprescindible su reconocimiento dentro del alcance de los trabajos realizados.*
>
> - *Importe incurrido analítica de entrada: 2.960 €.*
> - *Importe incurrido analítica de salida: 2.072 €.*
> - *Importe incurrido horas extra: 706,07 €.*

Respuesta:

Tras el estudio de la alegación se ha incorporado el gasto de horas extra a la valoración, pues se ha recibido el correspondiente cuadro de horas. En cuanto a las analíticas, no se dispone de la factura justificativa, lo que impide su valoración.

- **Precio de los equipos**

Incluido en la memoria valorada inicial.

Se expone:

> *Algunos de los precios de los equipos se han disminuido considerablemente frente al precio ofertado por los proveedores. Ha sido el caso de bombas y de los equipos de medición como el controlador de oxígeno y el de fósforo.*

Respuesta:

El precio incluido en la memoria inicial corresponde al valor de mercado del equipo, por lo que se considera que no procede la revisión del mismo.

- **Montaje y desmontaje de los equipos**

Excluido en la memoria valorada inicial.

Se expone:

> *El capítulo referente al desmontaje de equipos averiados y al montaje de los nuevos no se ha tenido en cuenta. Esto supone en torno al 20% del coste de los equipos.*
>
> *Al tratarse en algunos casos de equipos pesados, requieren de maquinaria para poder llevar a cabo las actuaciones. Esto repercute considerablemente en los costes, debido a la alta demanda de maquinaria que hay en la zona.*

Respuesta:

Se ha procedido a la inclusión del montaje y desmontaje de equipos con un valor del 20% del precio de los equipos.

- **Valoración de la reparación del camino**

Actuación incluida en la memoria valorada inicial.

Se expone:

> *La valoración del ministerio contempla 350 ml de camino, mientras que el camino desde la EDAR hasta la rotura del colector es de 700 ml aproximadamente, por tanto, a las partidas contempladas por CYGSA aunque son correctas, les falta medición.*

Respuesta:

Se ha procedido a modificar medición incluida en la memoria valorada inicial.

ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE APOYO A LA VALORACIÓN

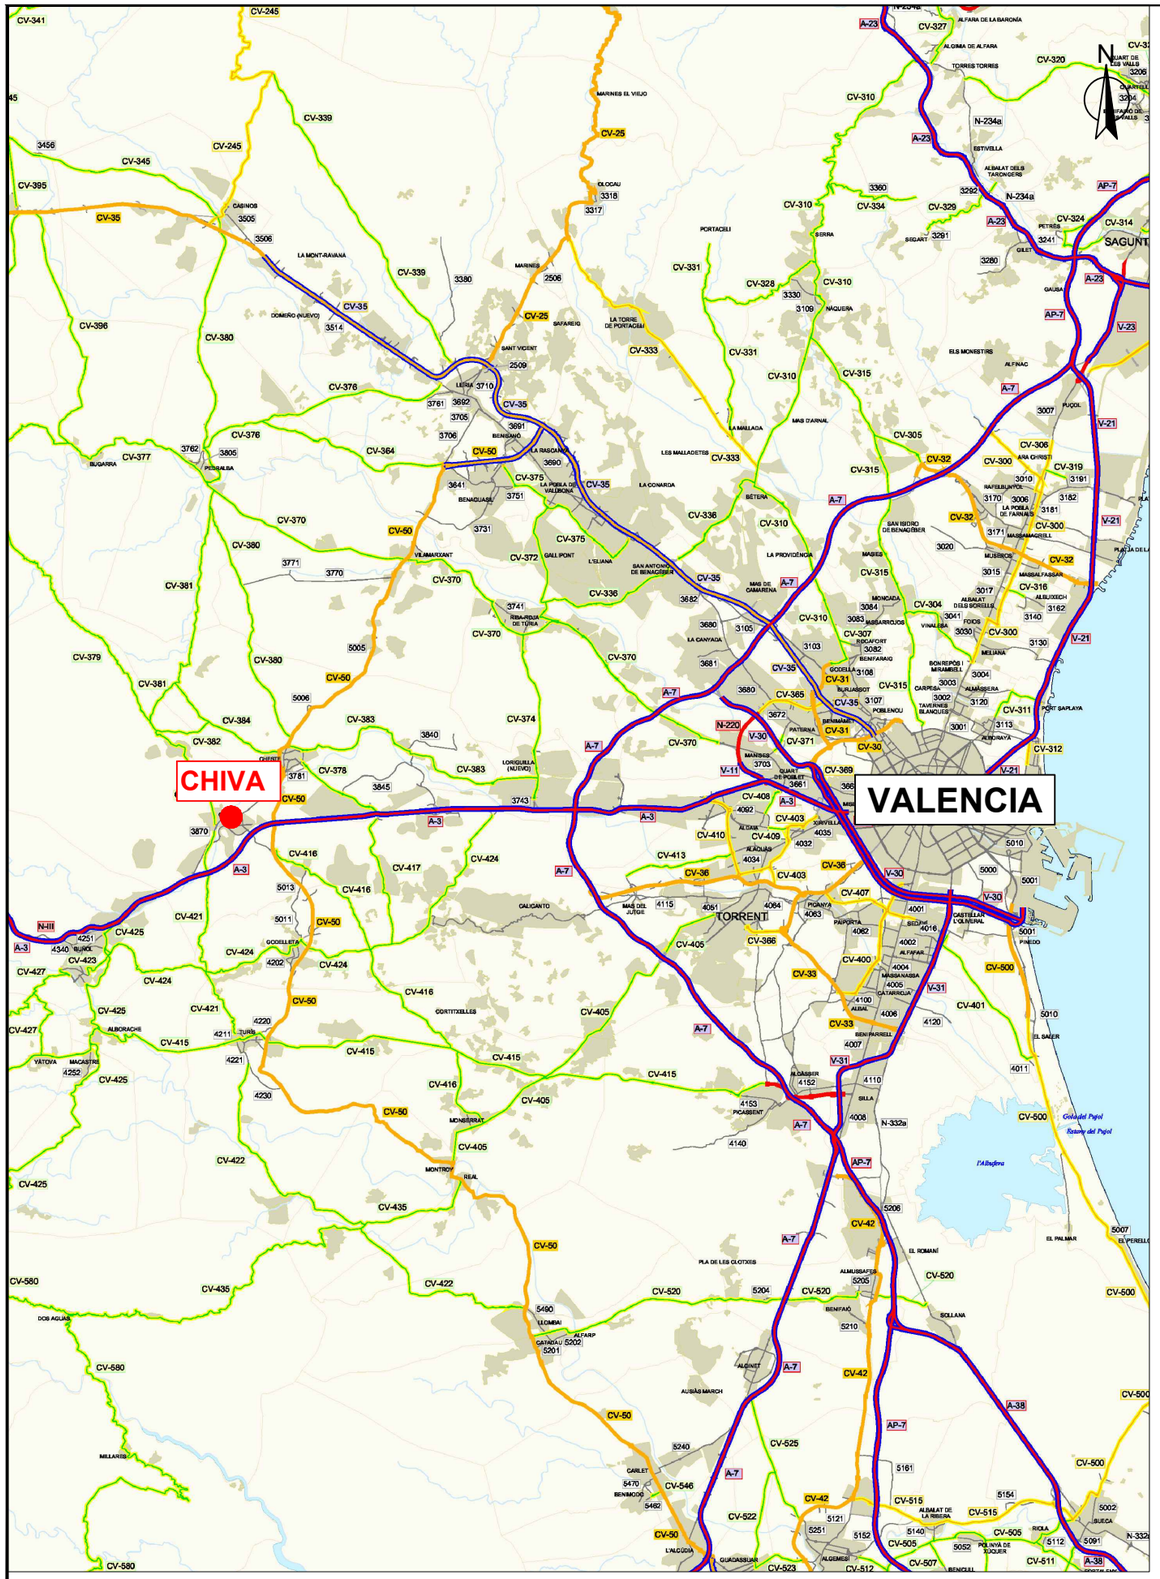

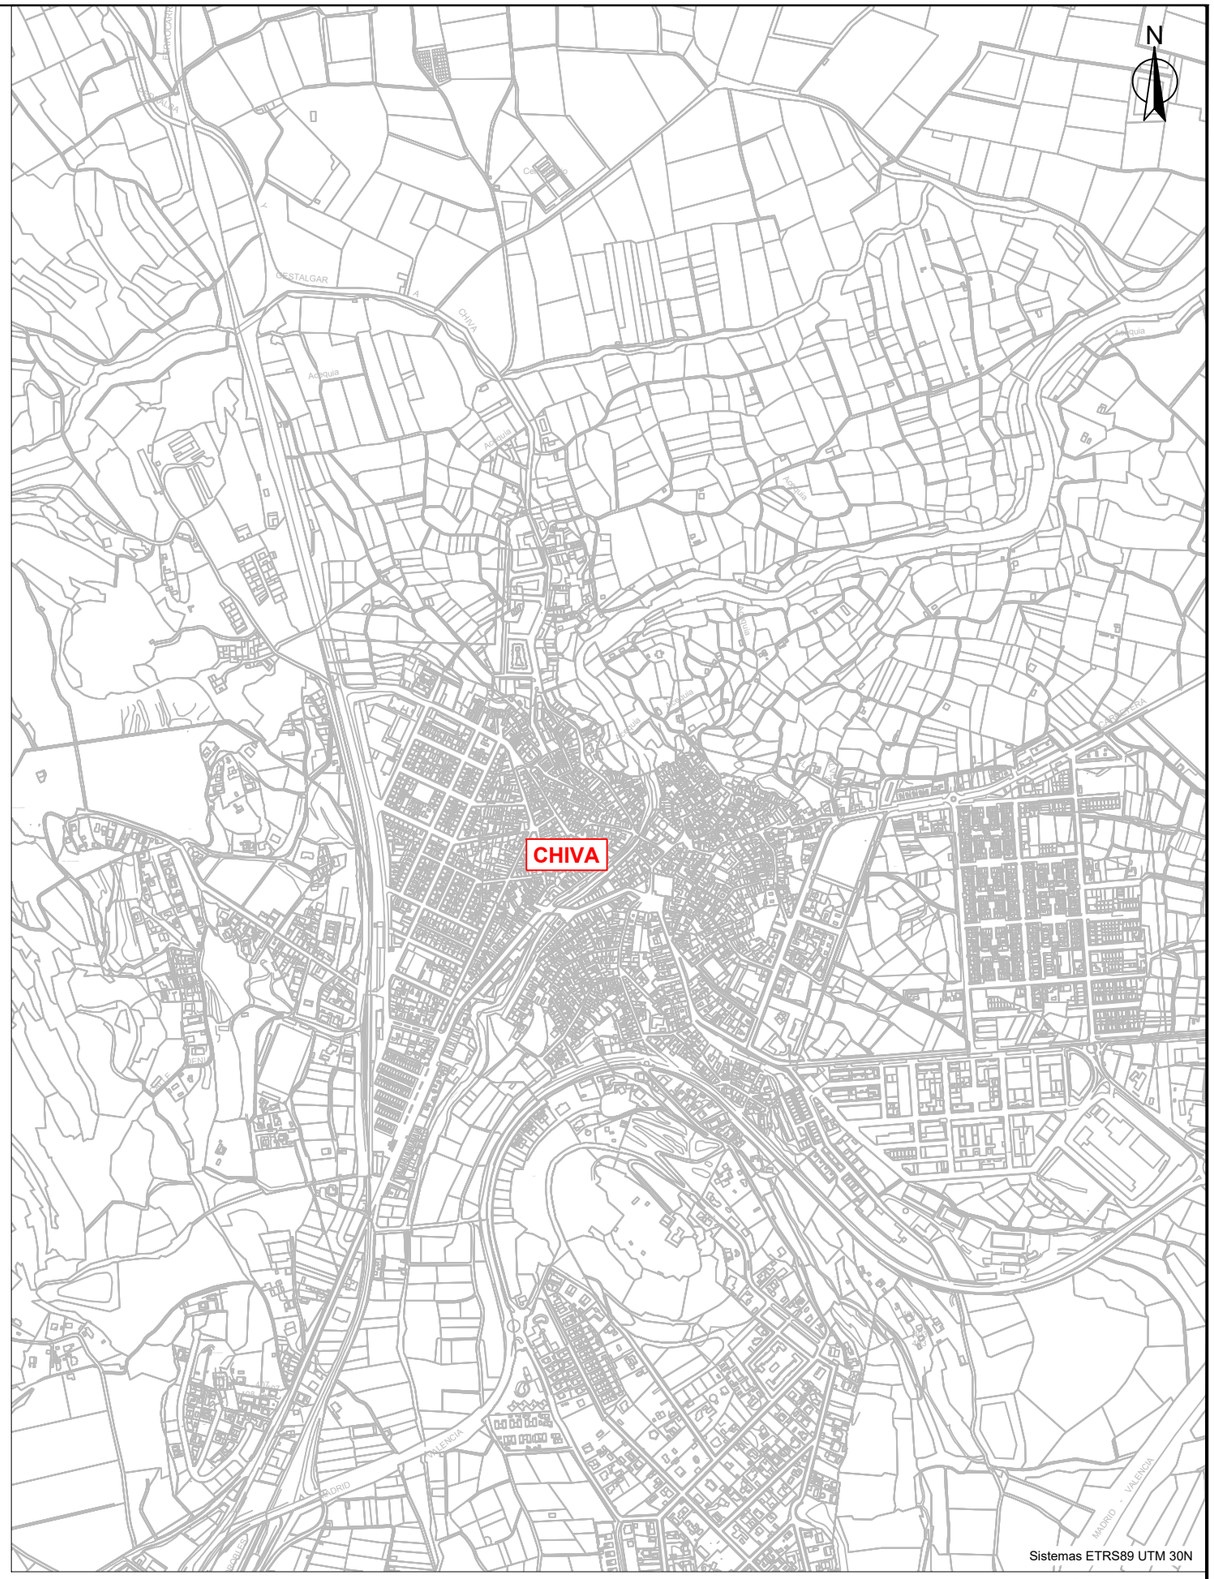

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4	FECHA: JULIO 2025	ESCALA: INDICADAS ORIGINAL A-3	TÍTULO DEL PLANO: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	Nº PLANO: 1

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES. POZO SOLANA II	2.1

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES. POZO SOLANA III	2.2

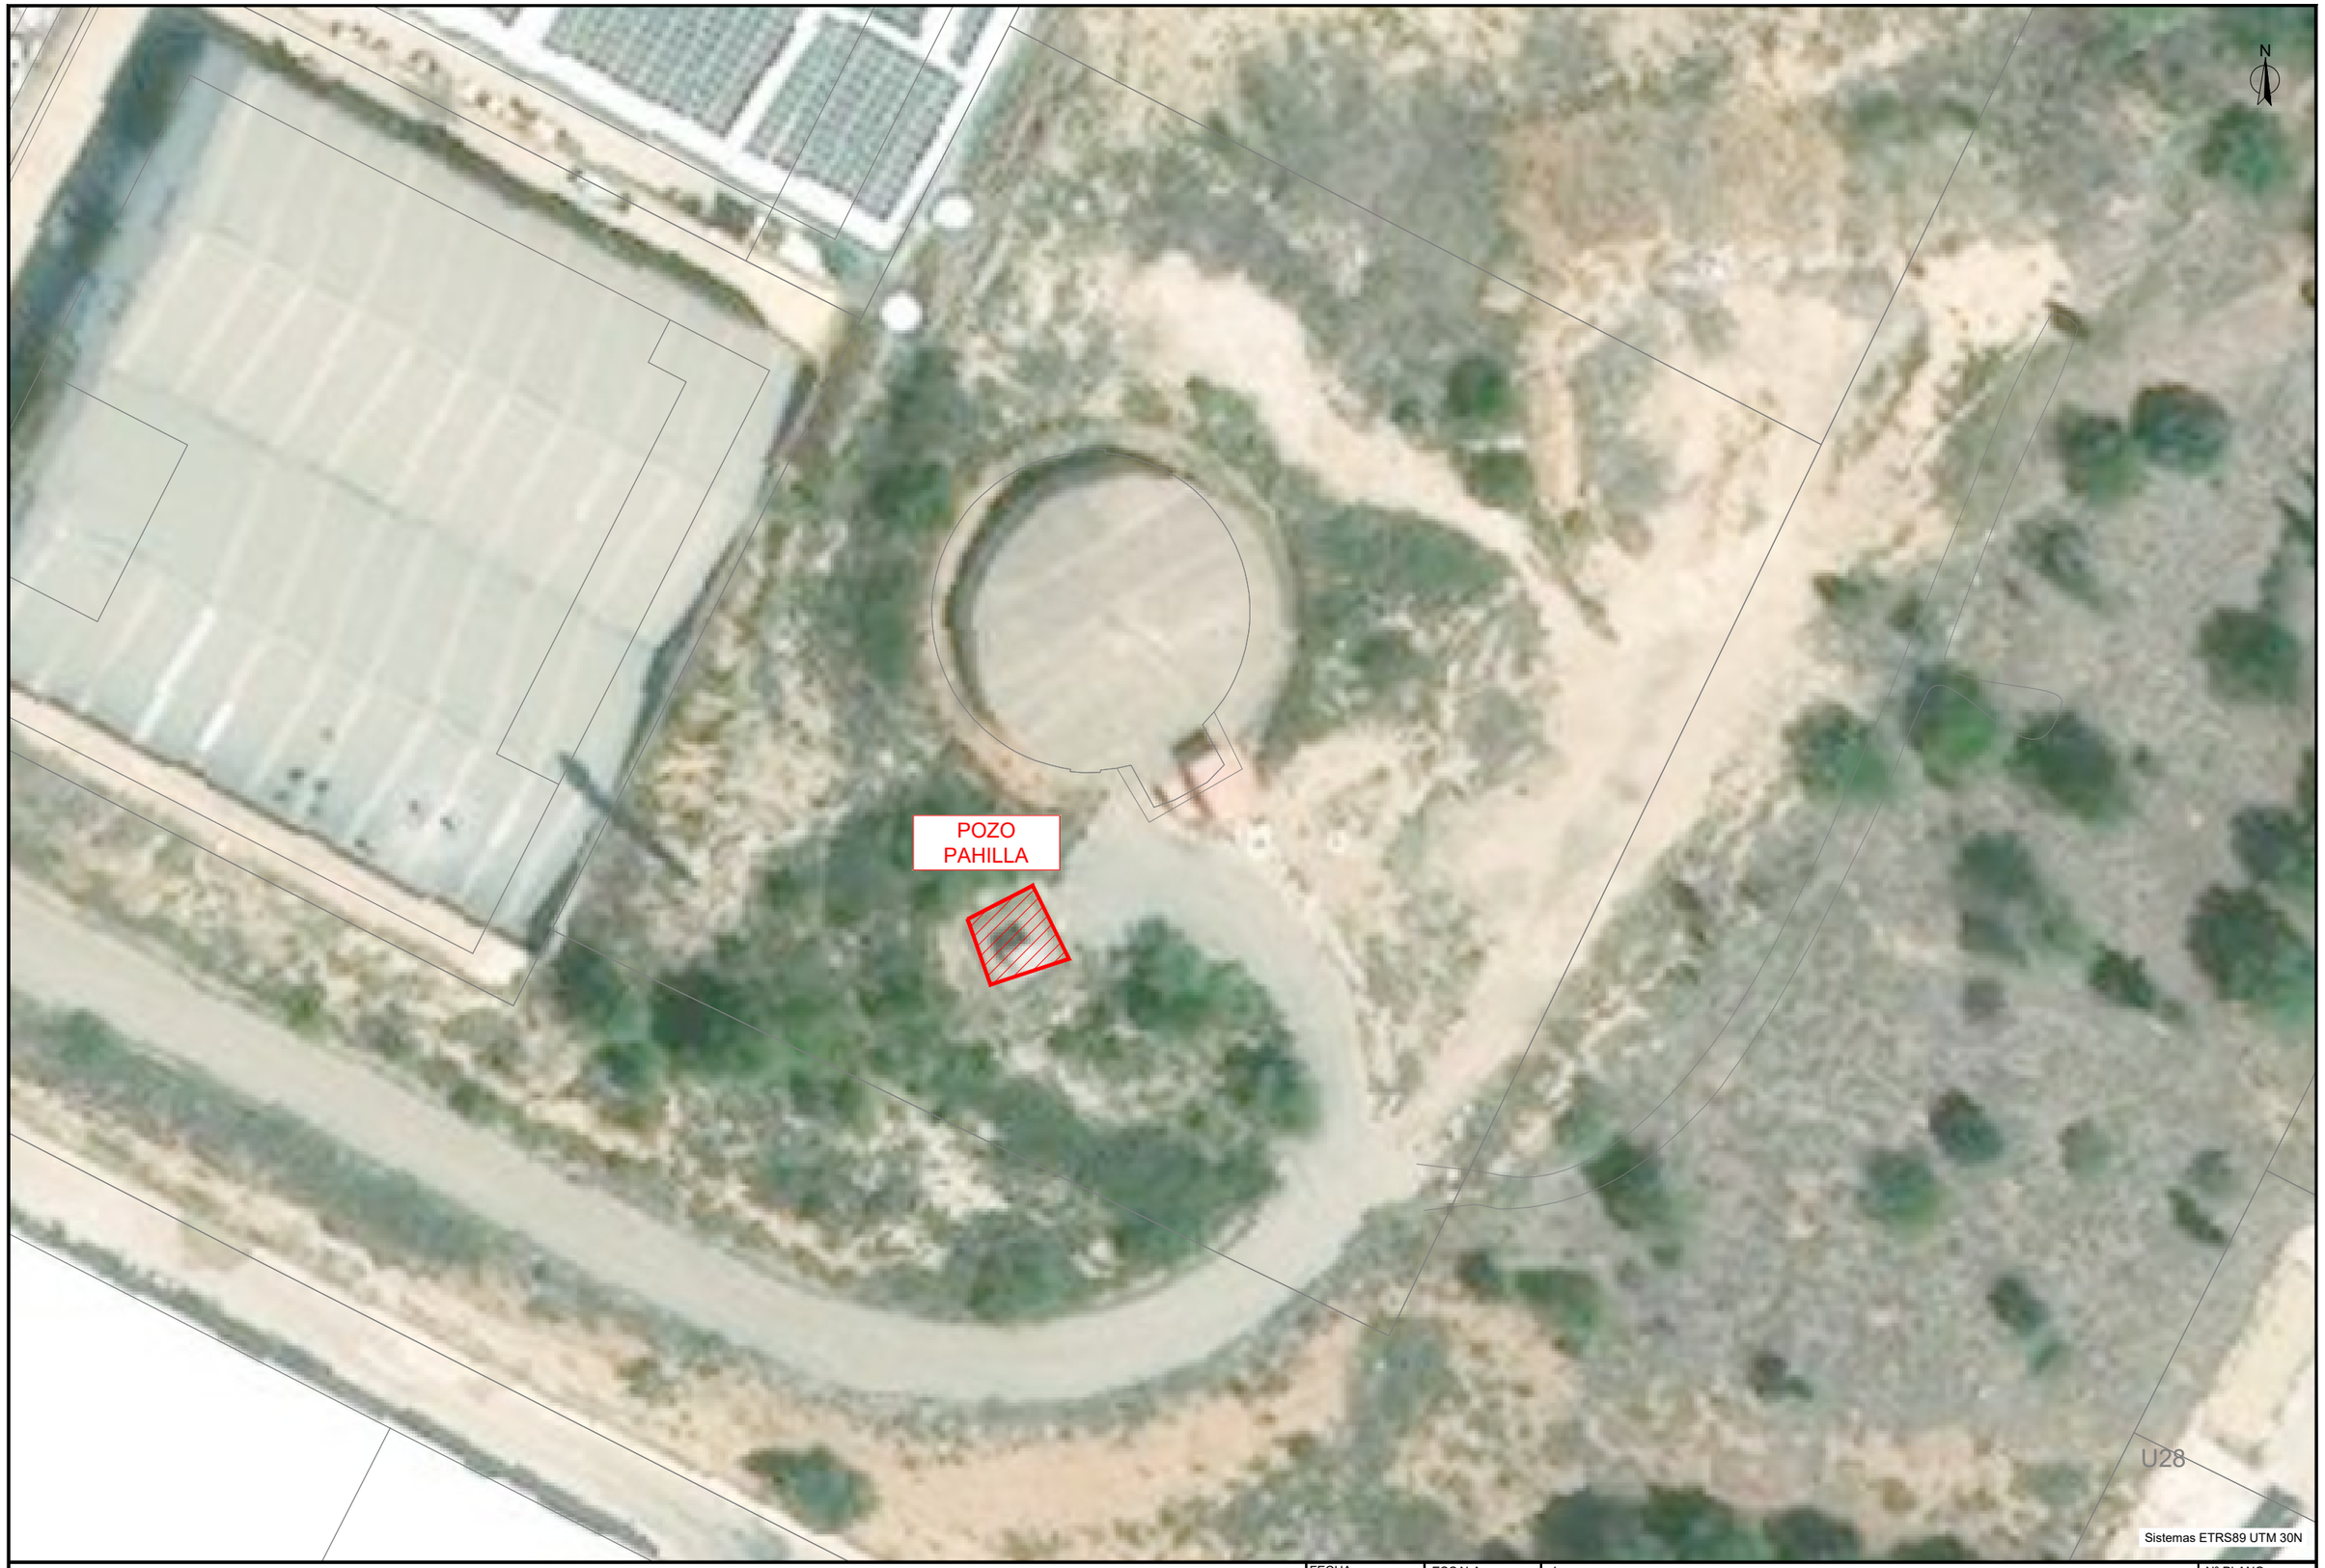

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES. BOMBEO PAHILLA	2.3

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES. POZO SAN ÁLVARO	2.4

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES. PERENCHIZA	2.5

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:2.000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	3

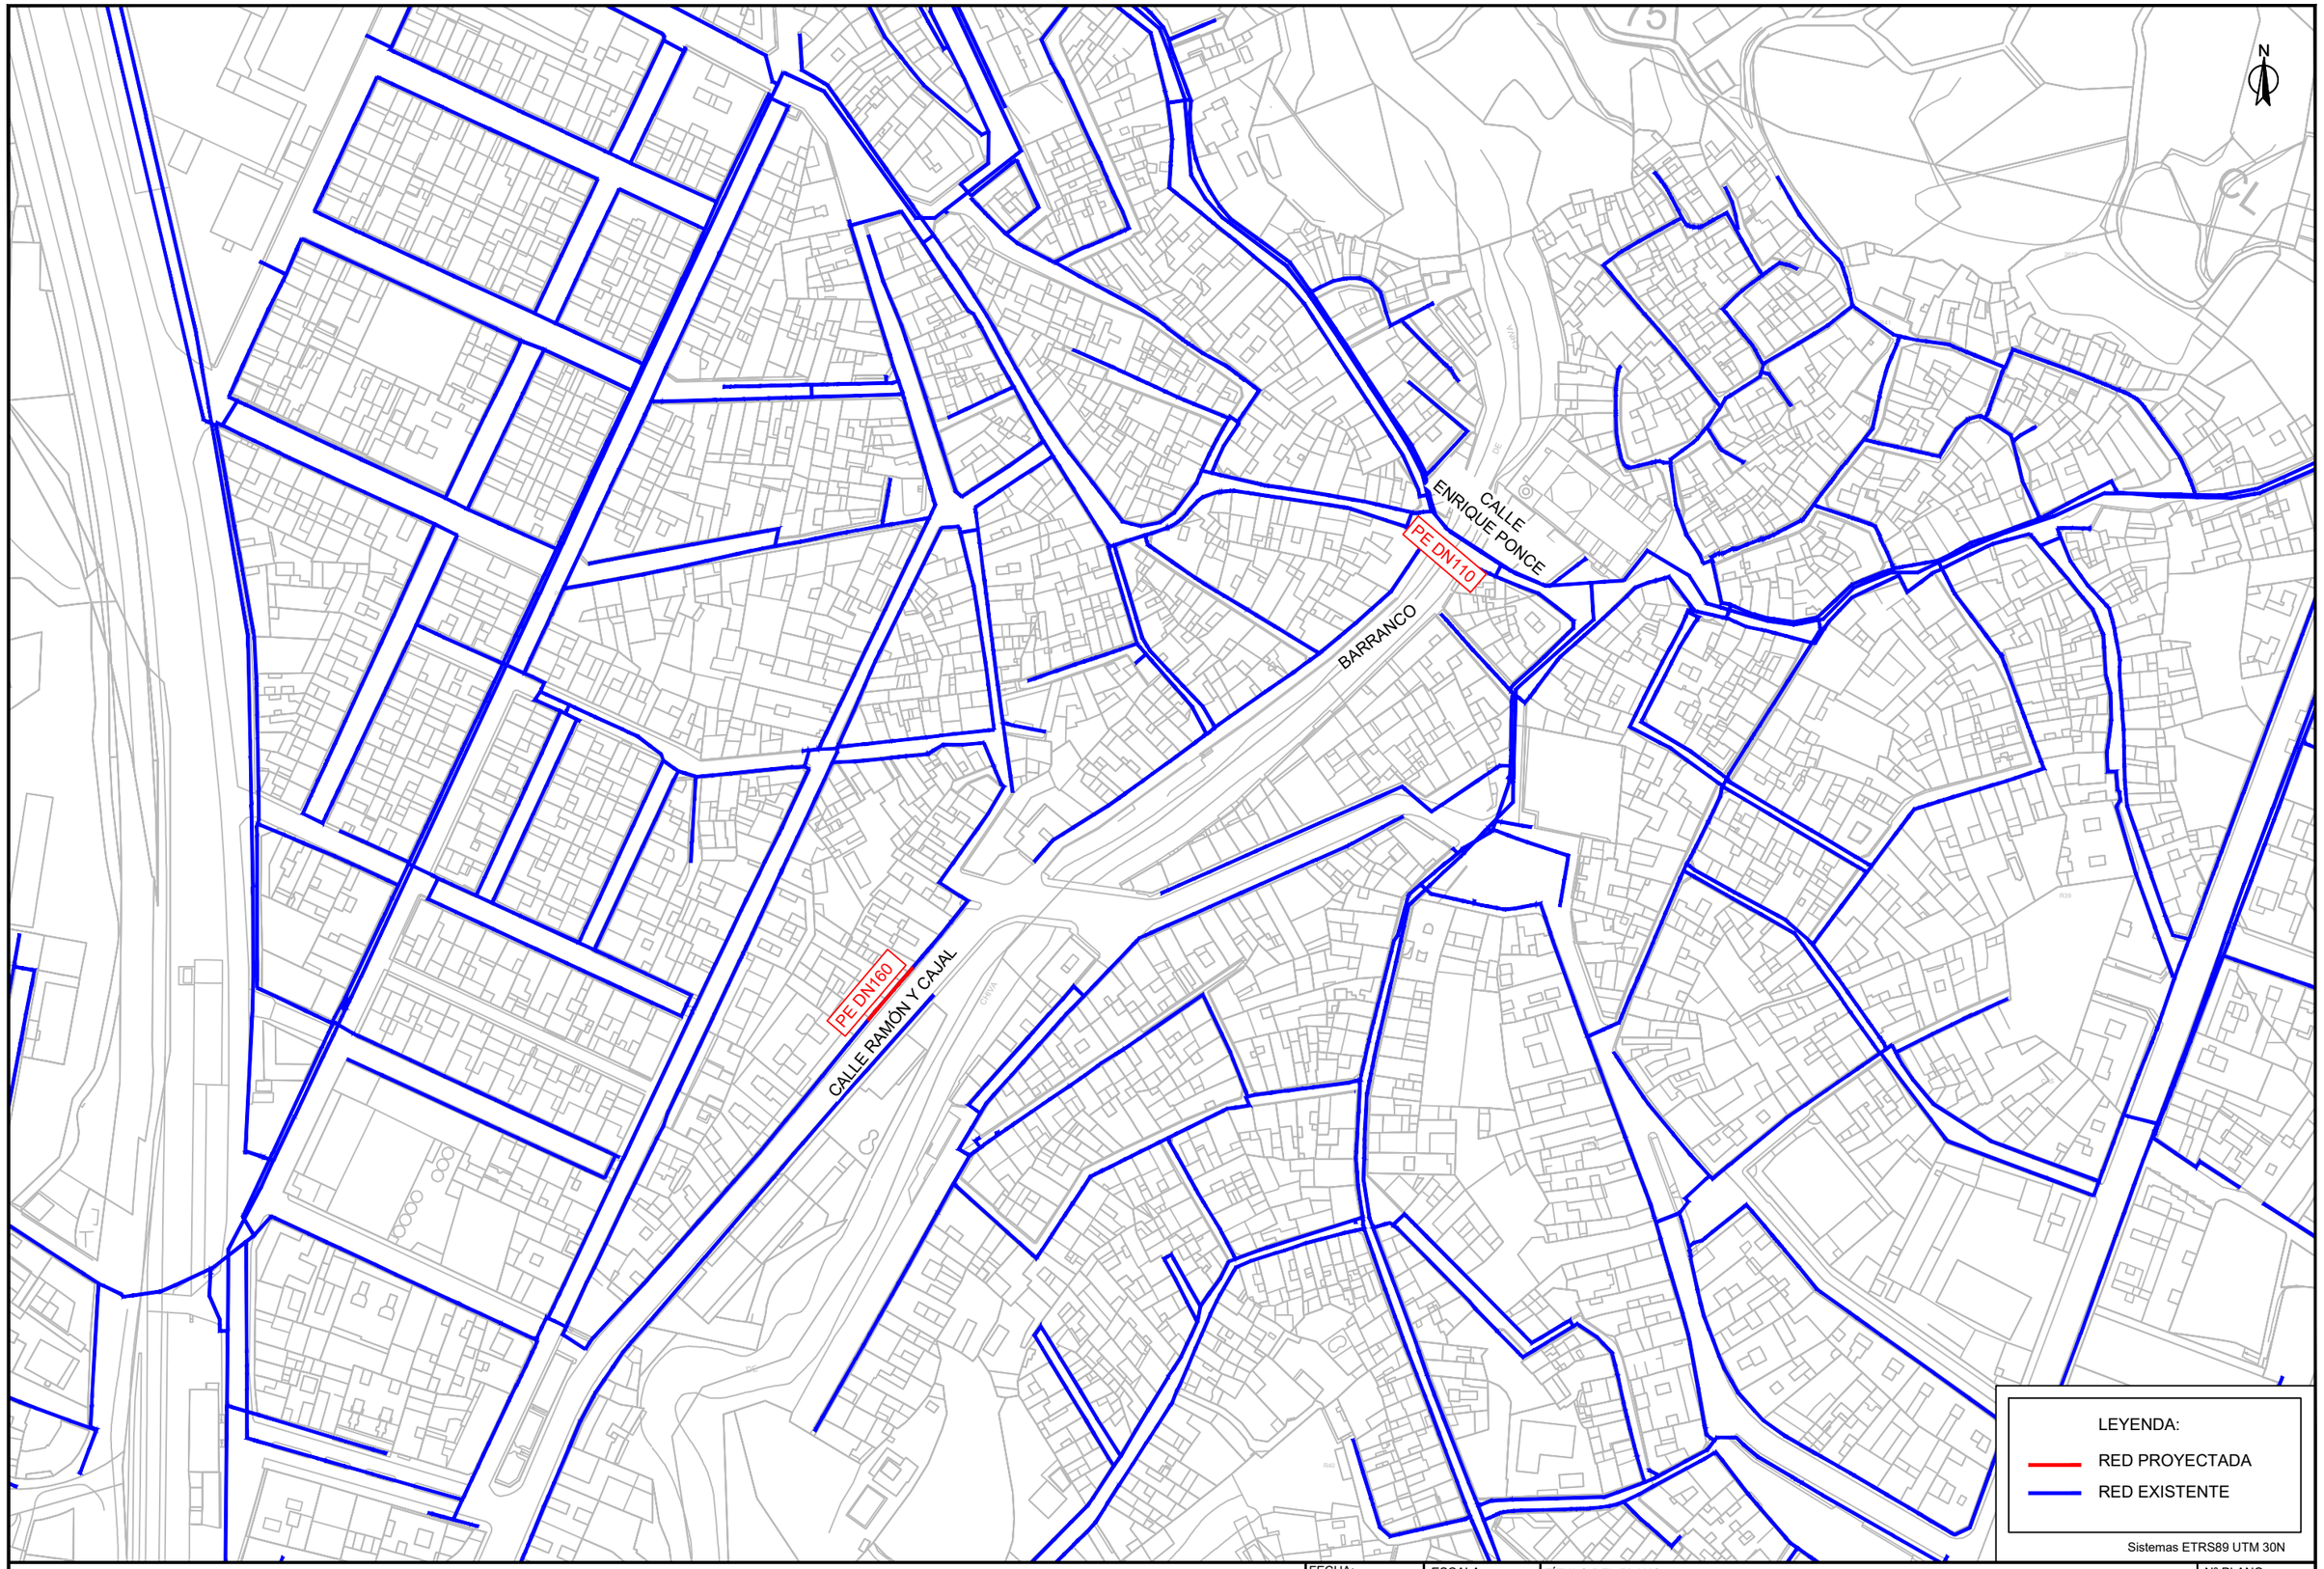

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:5000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	4

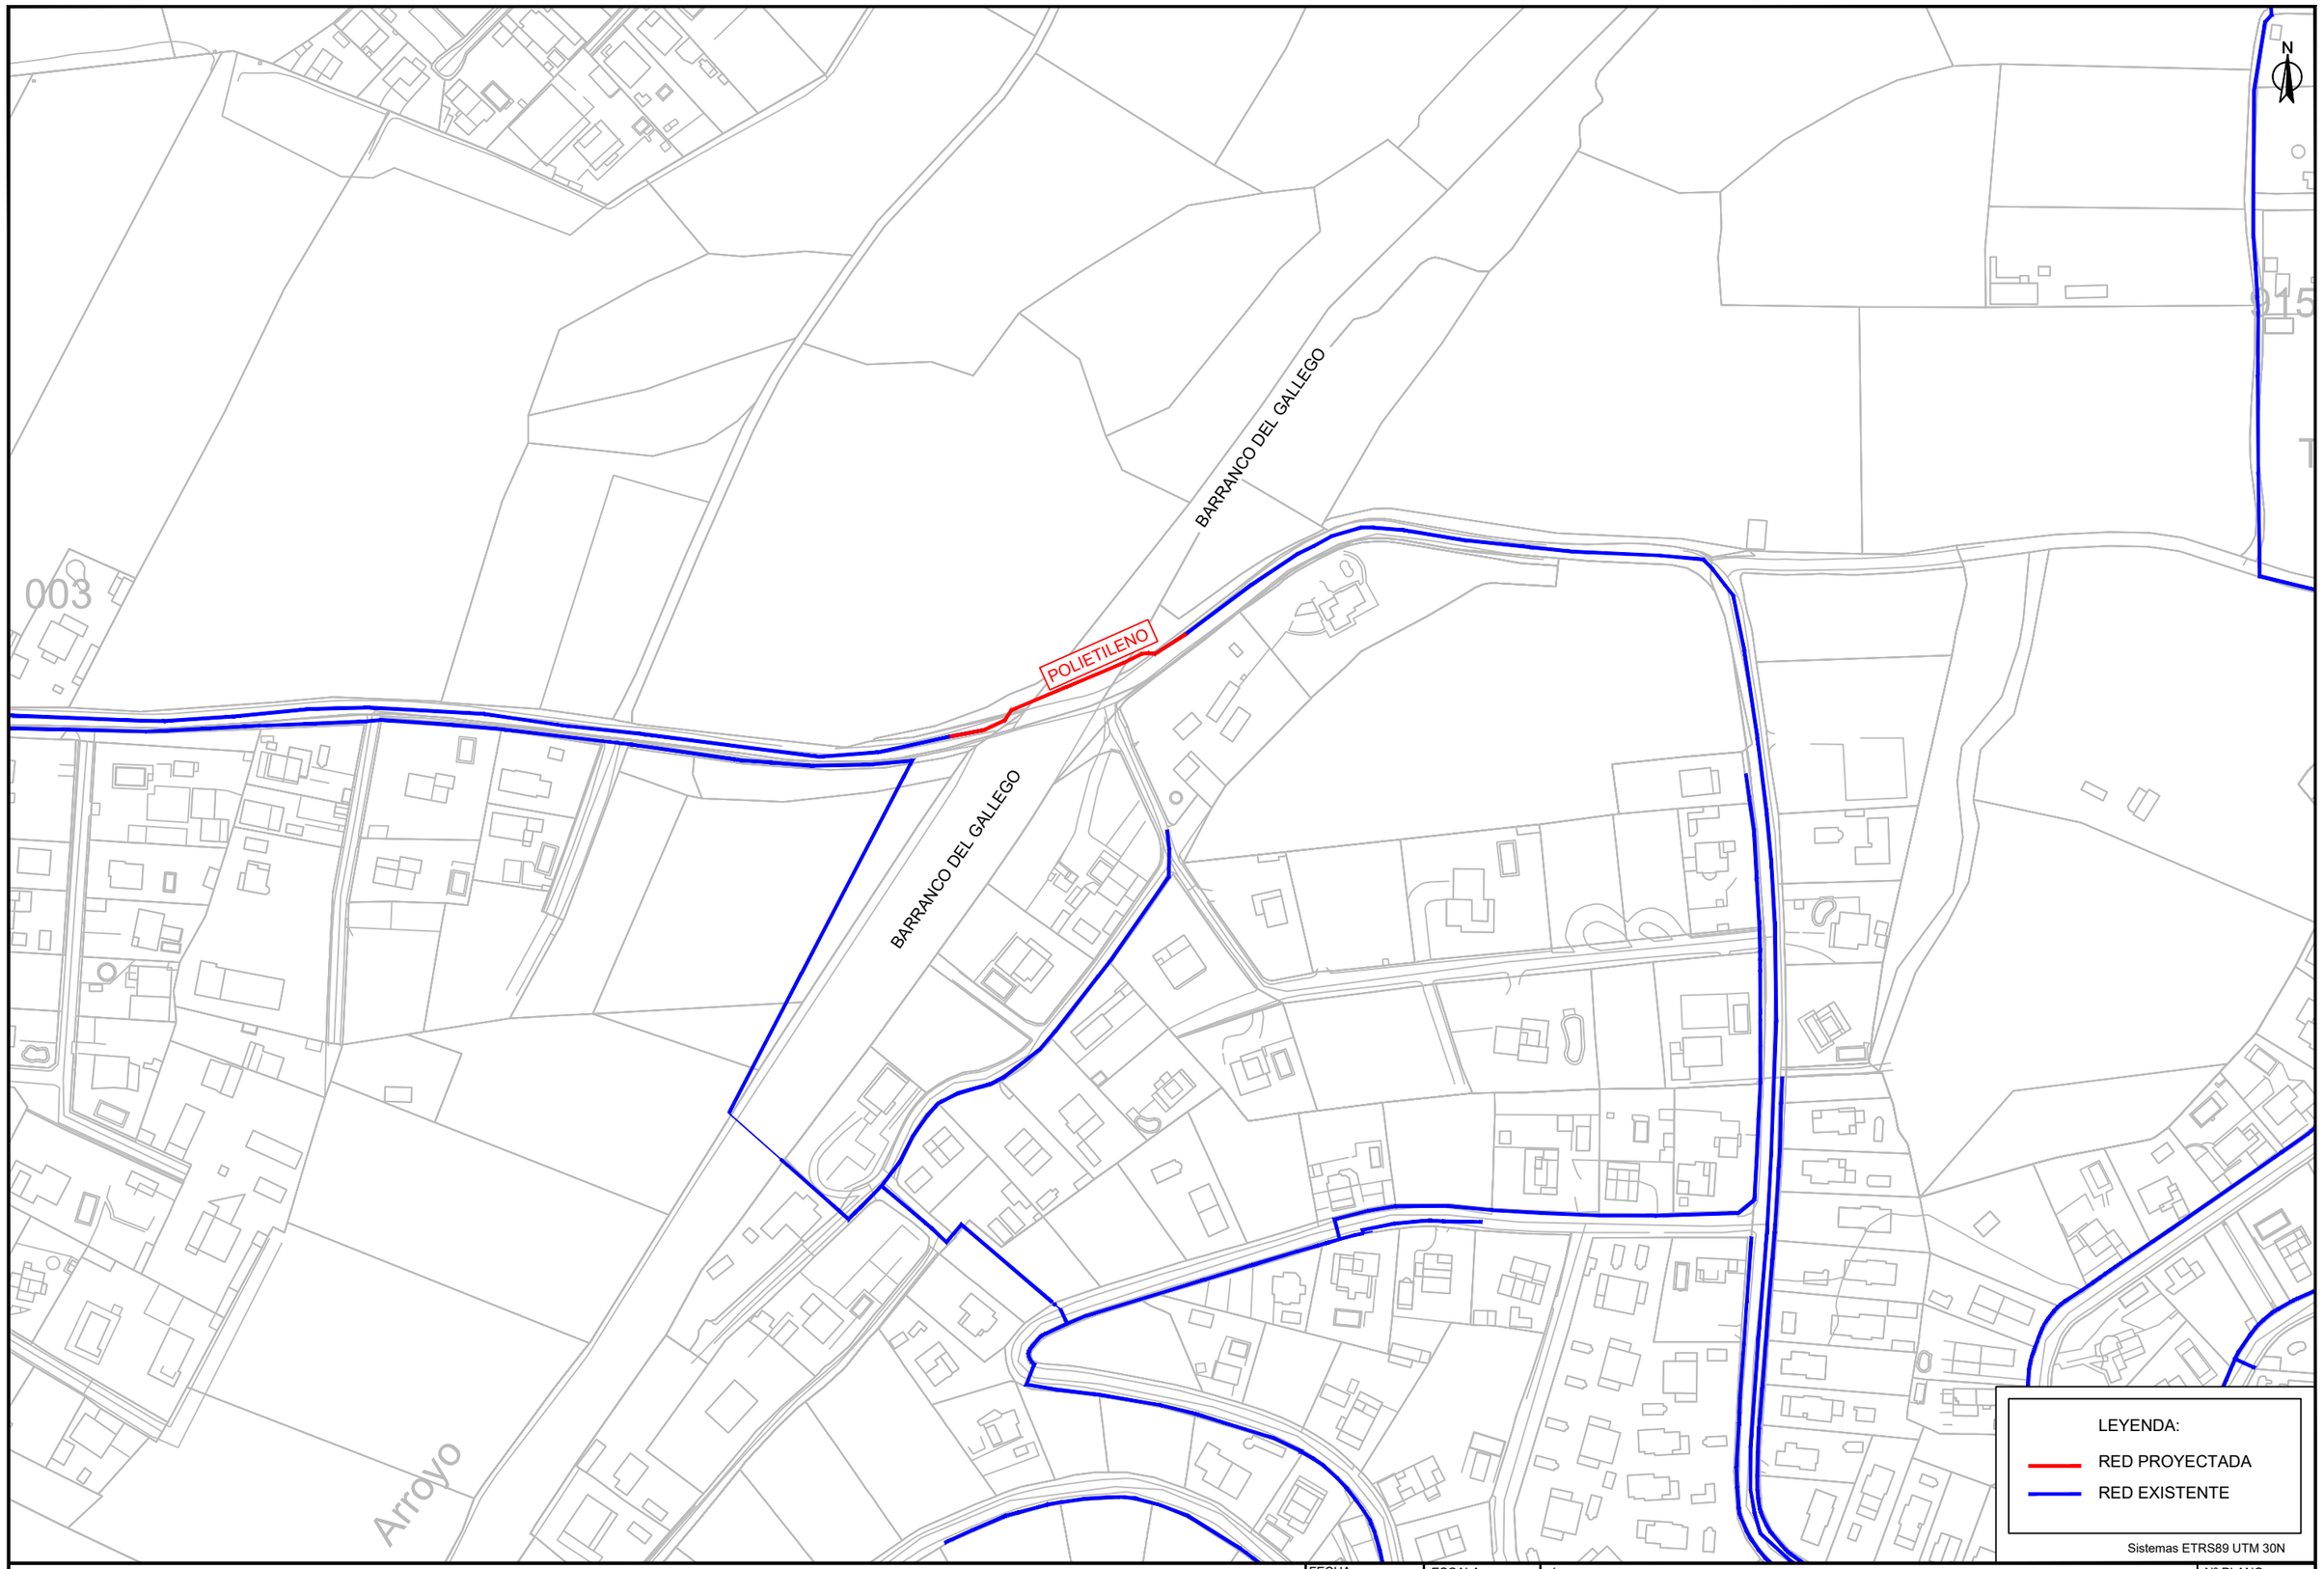

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:2000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	5

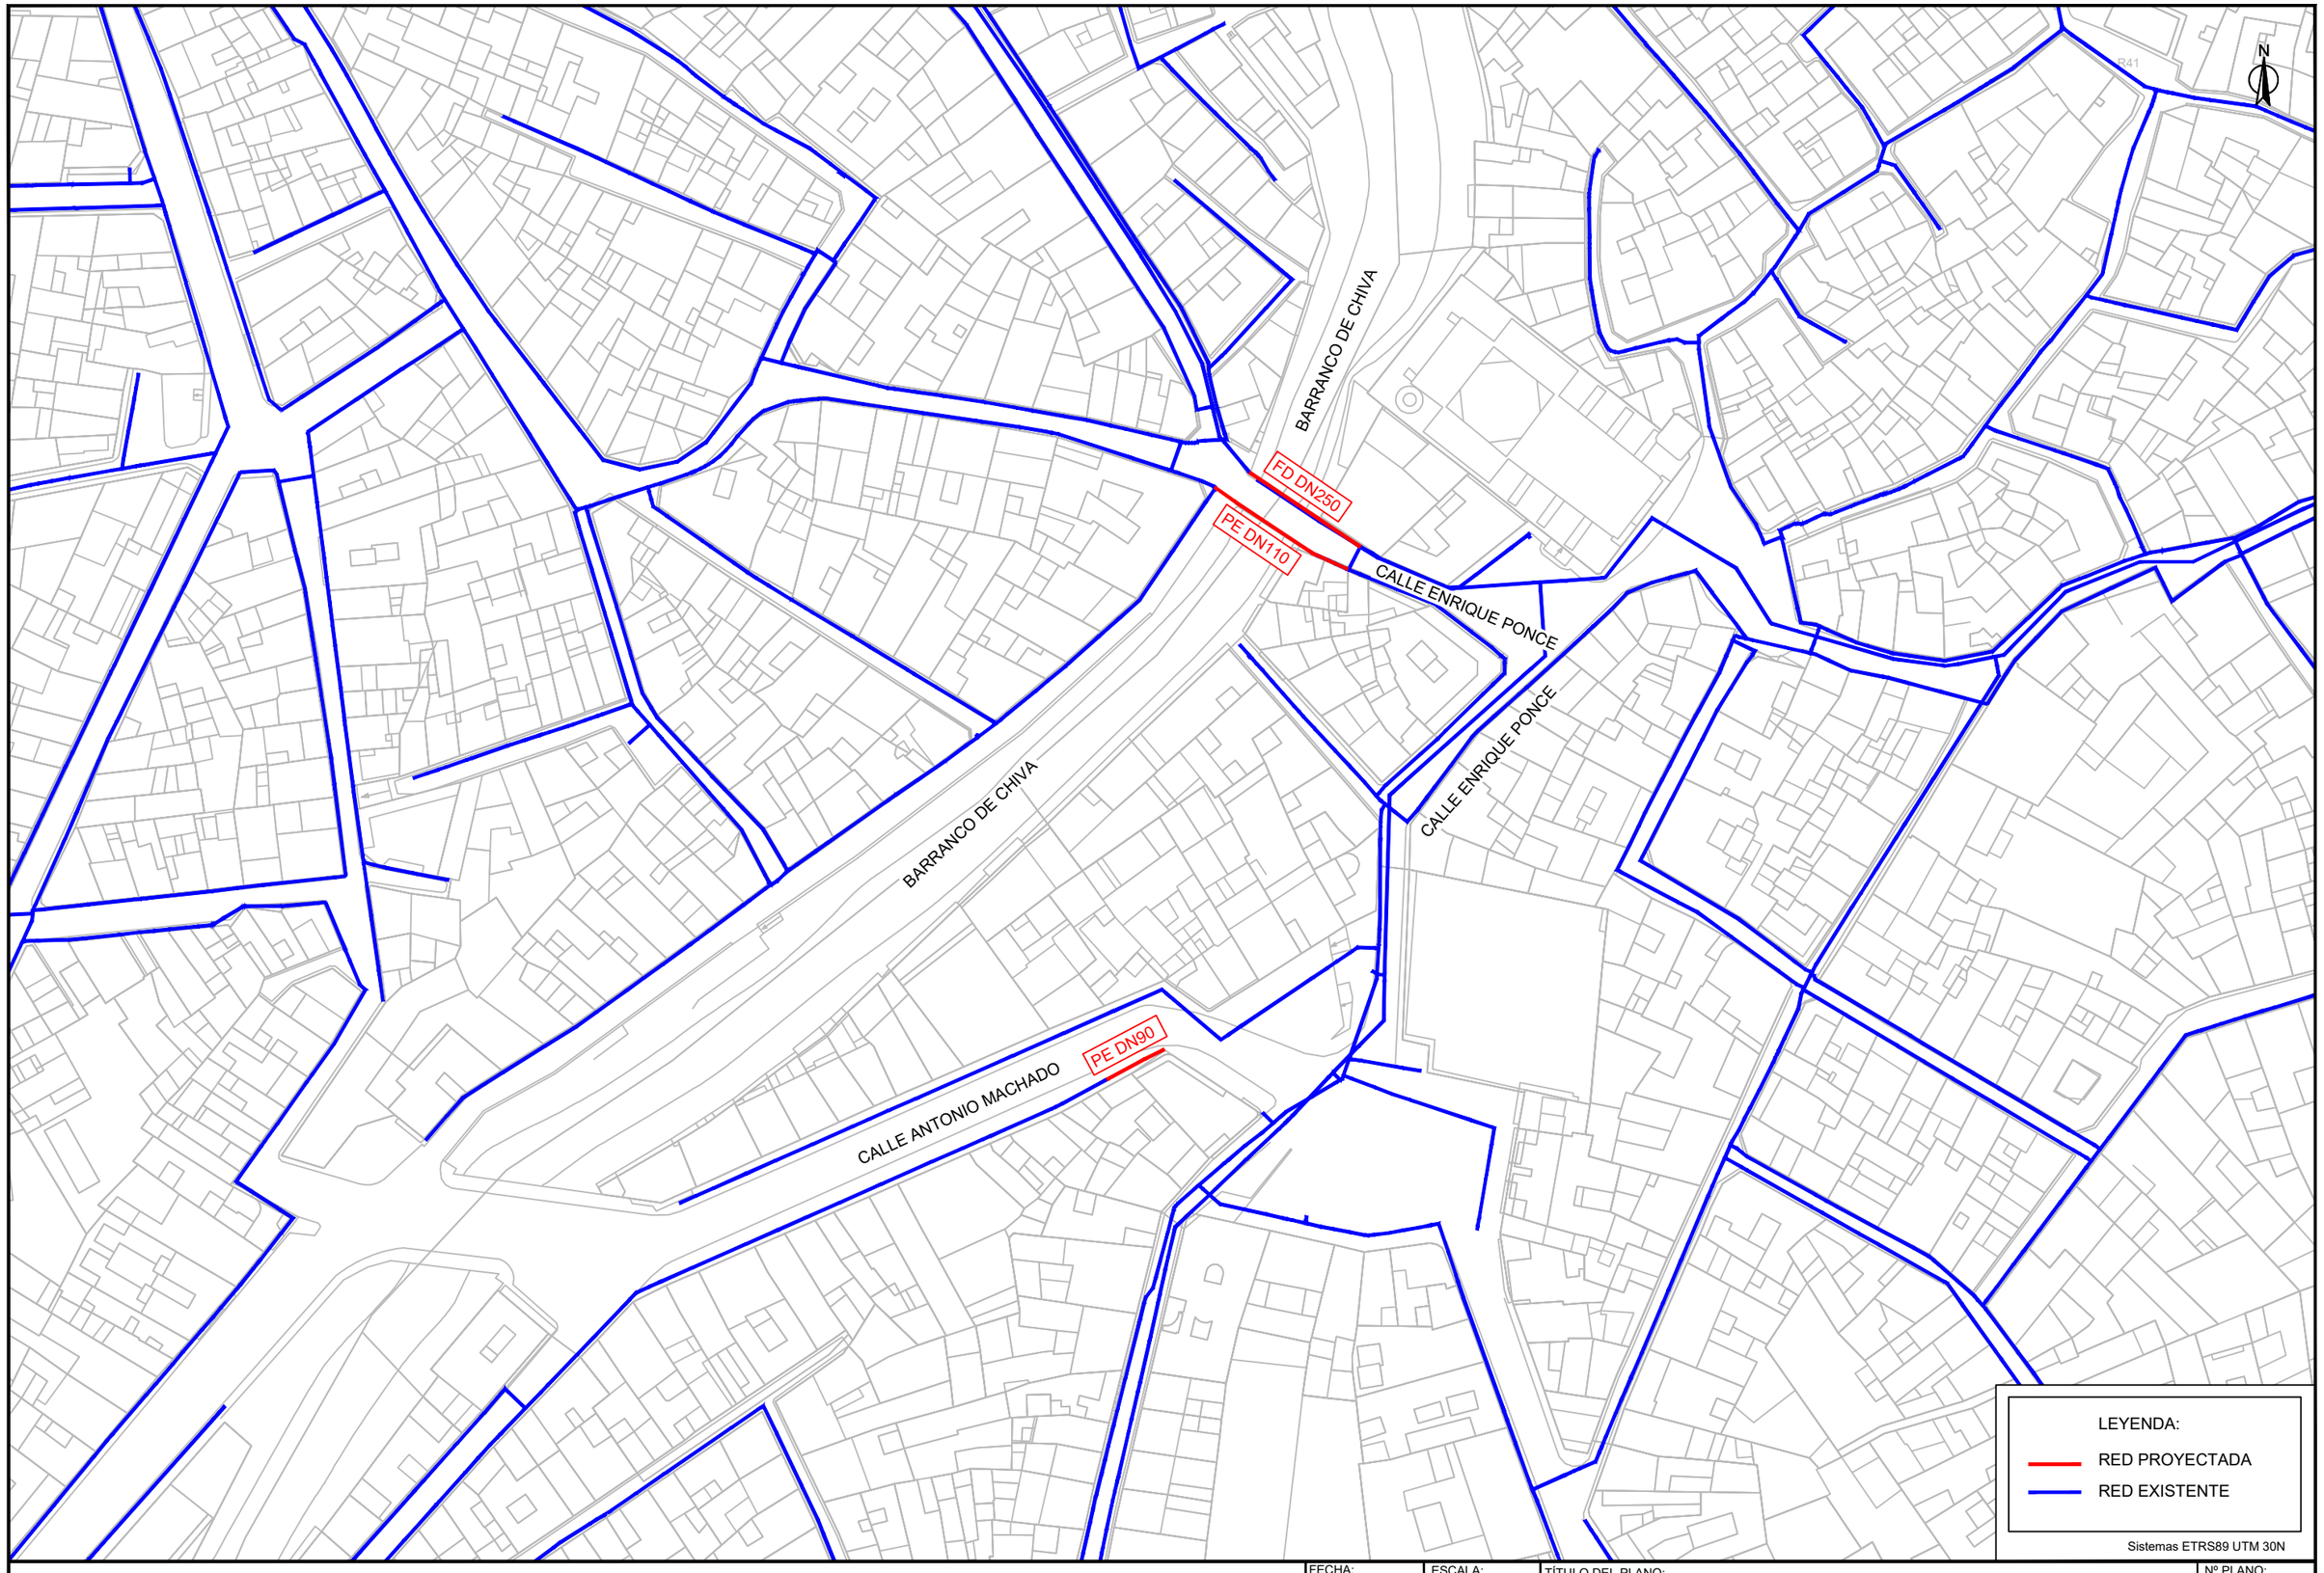

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	6

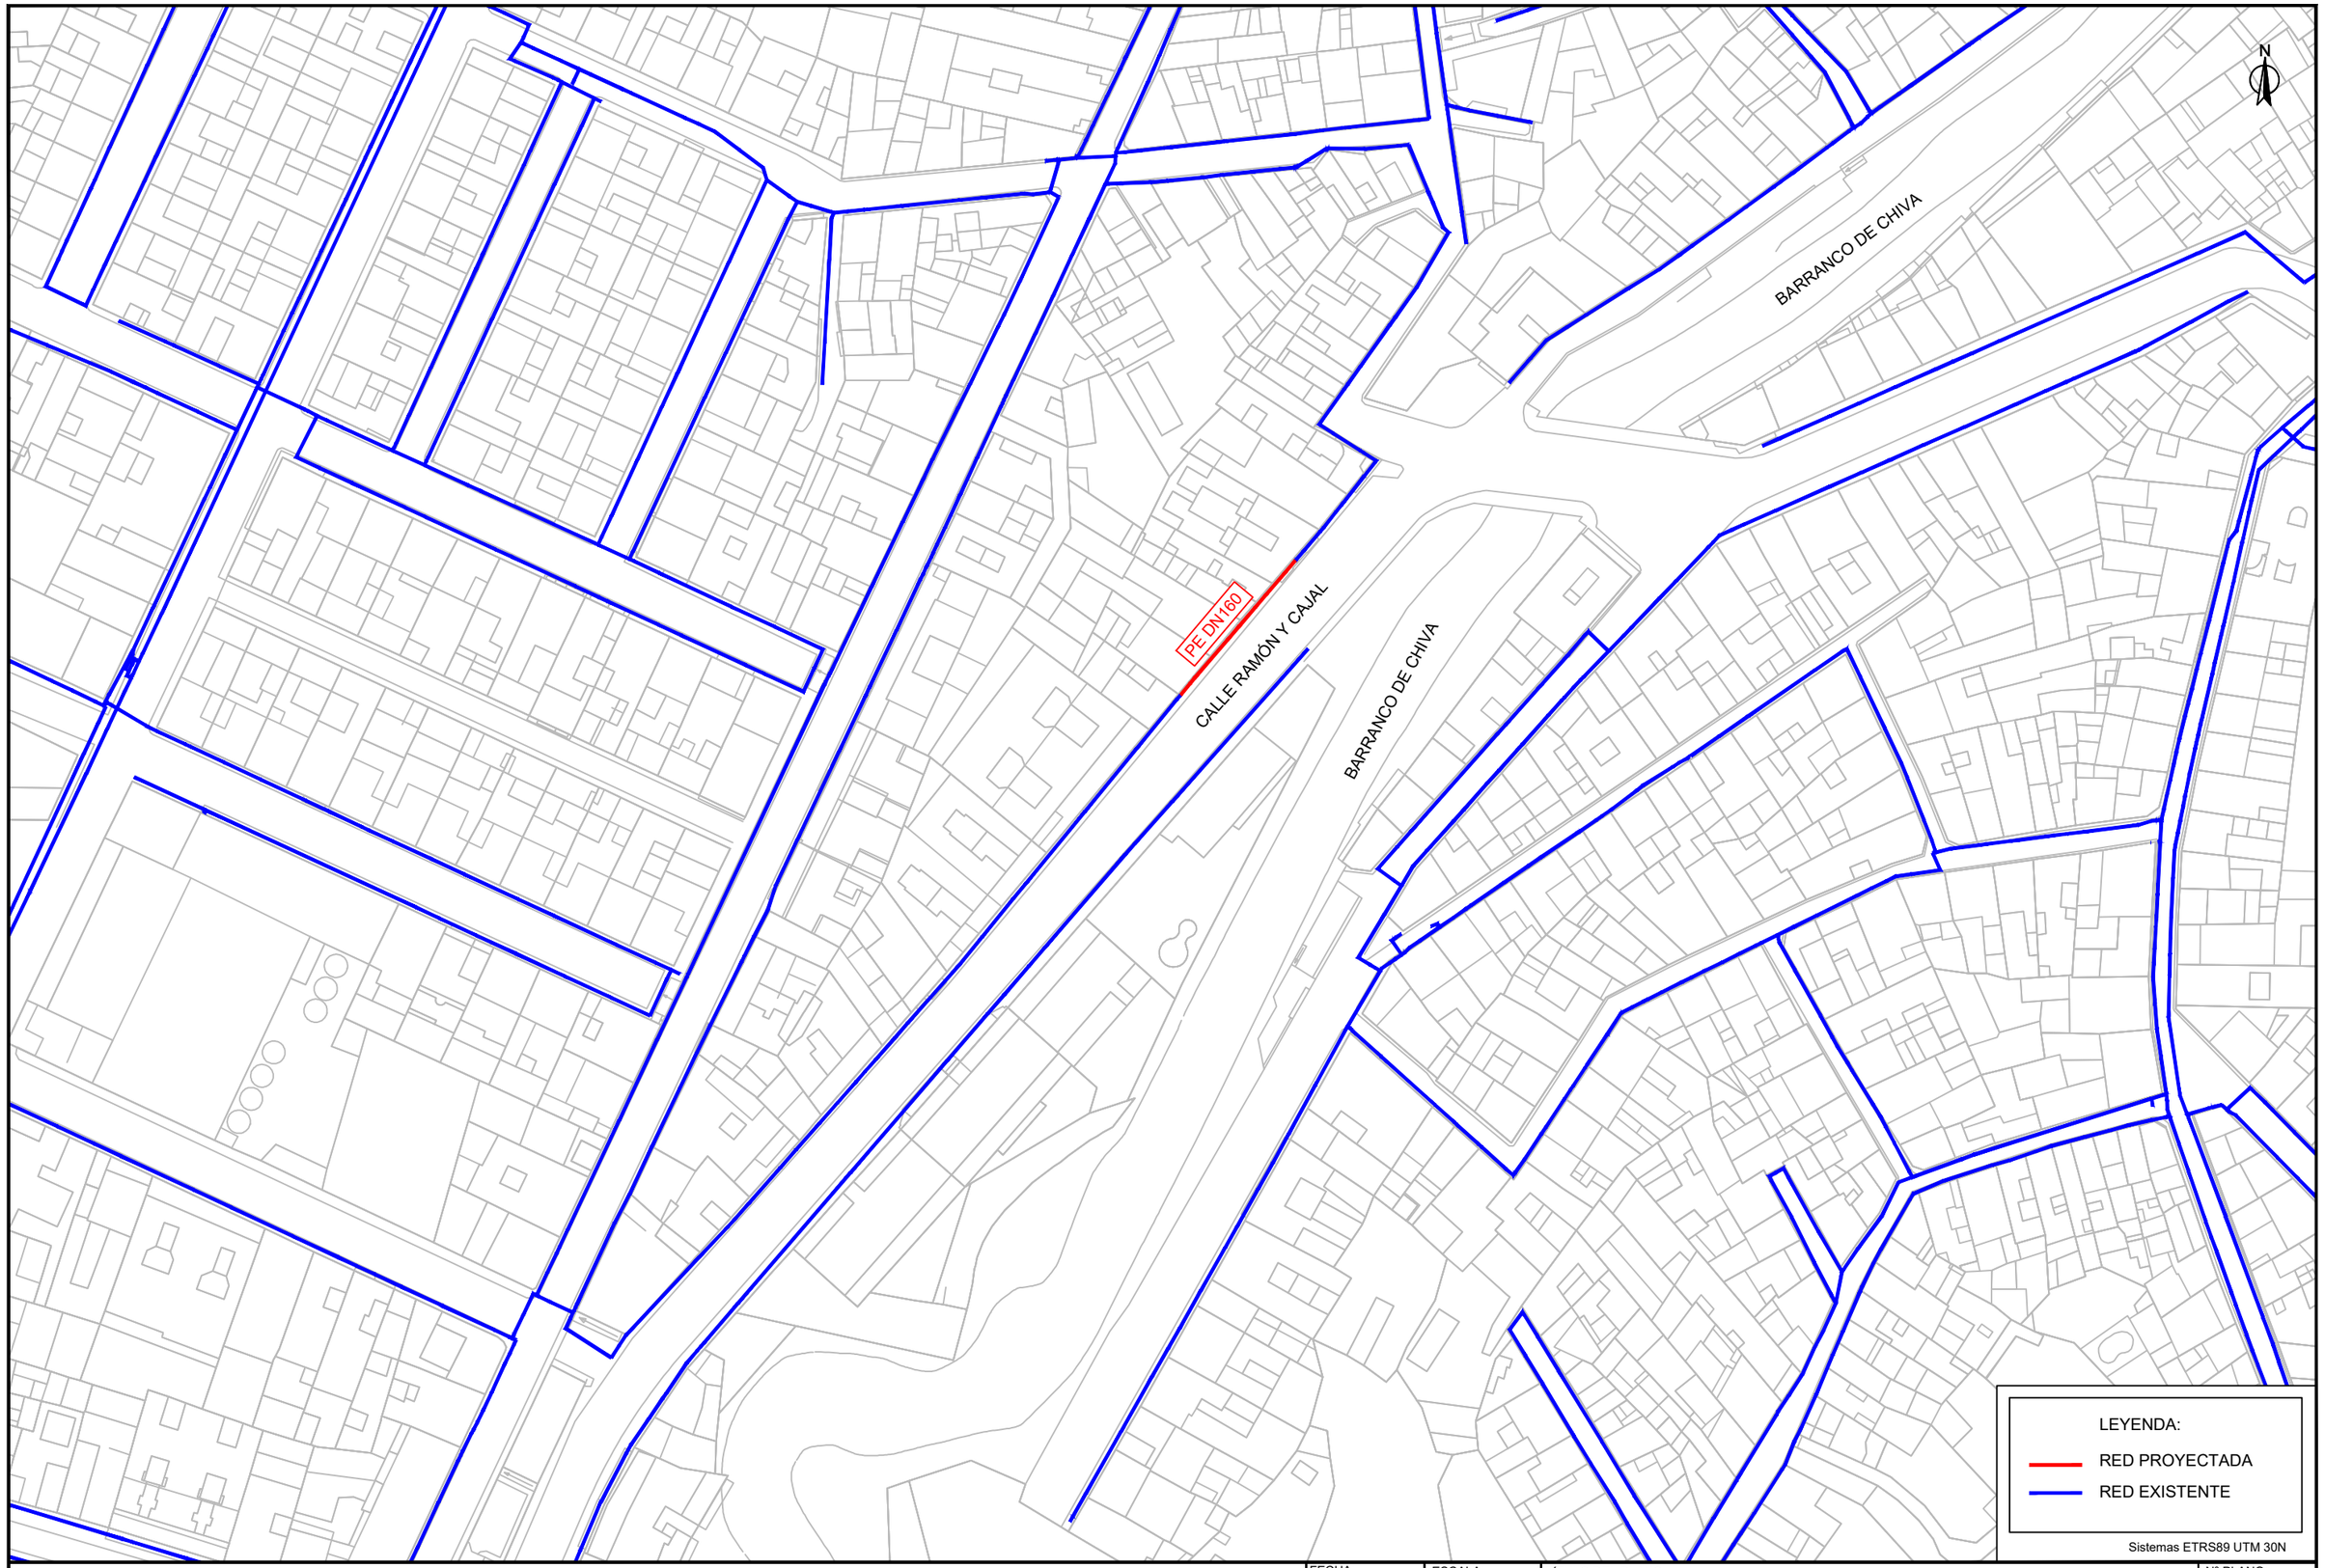

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	7

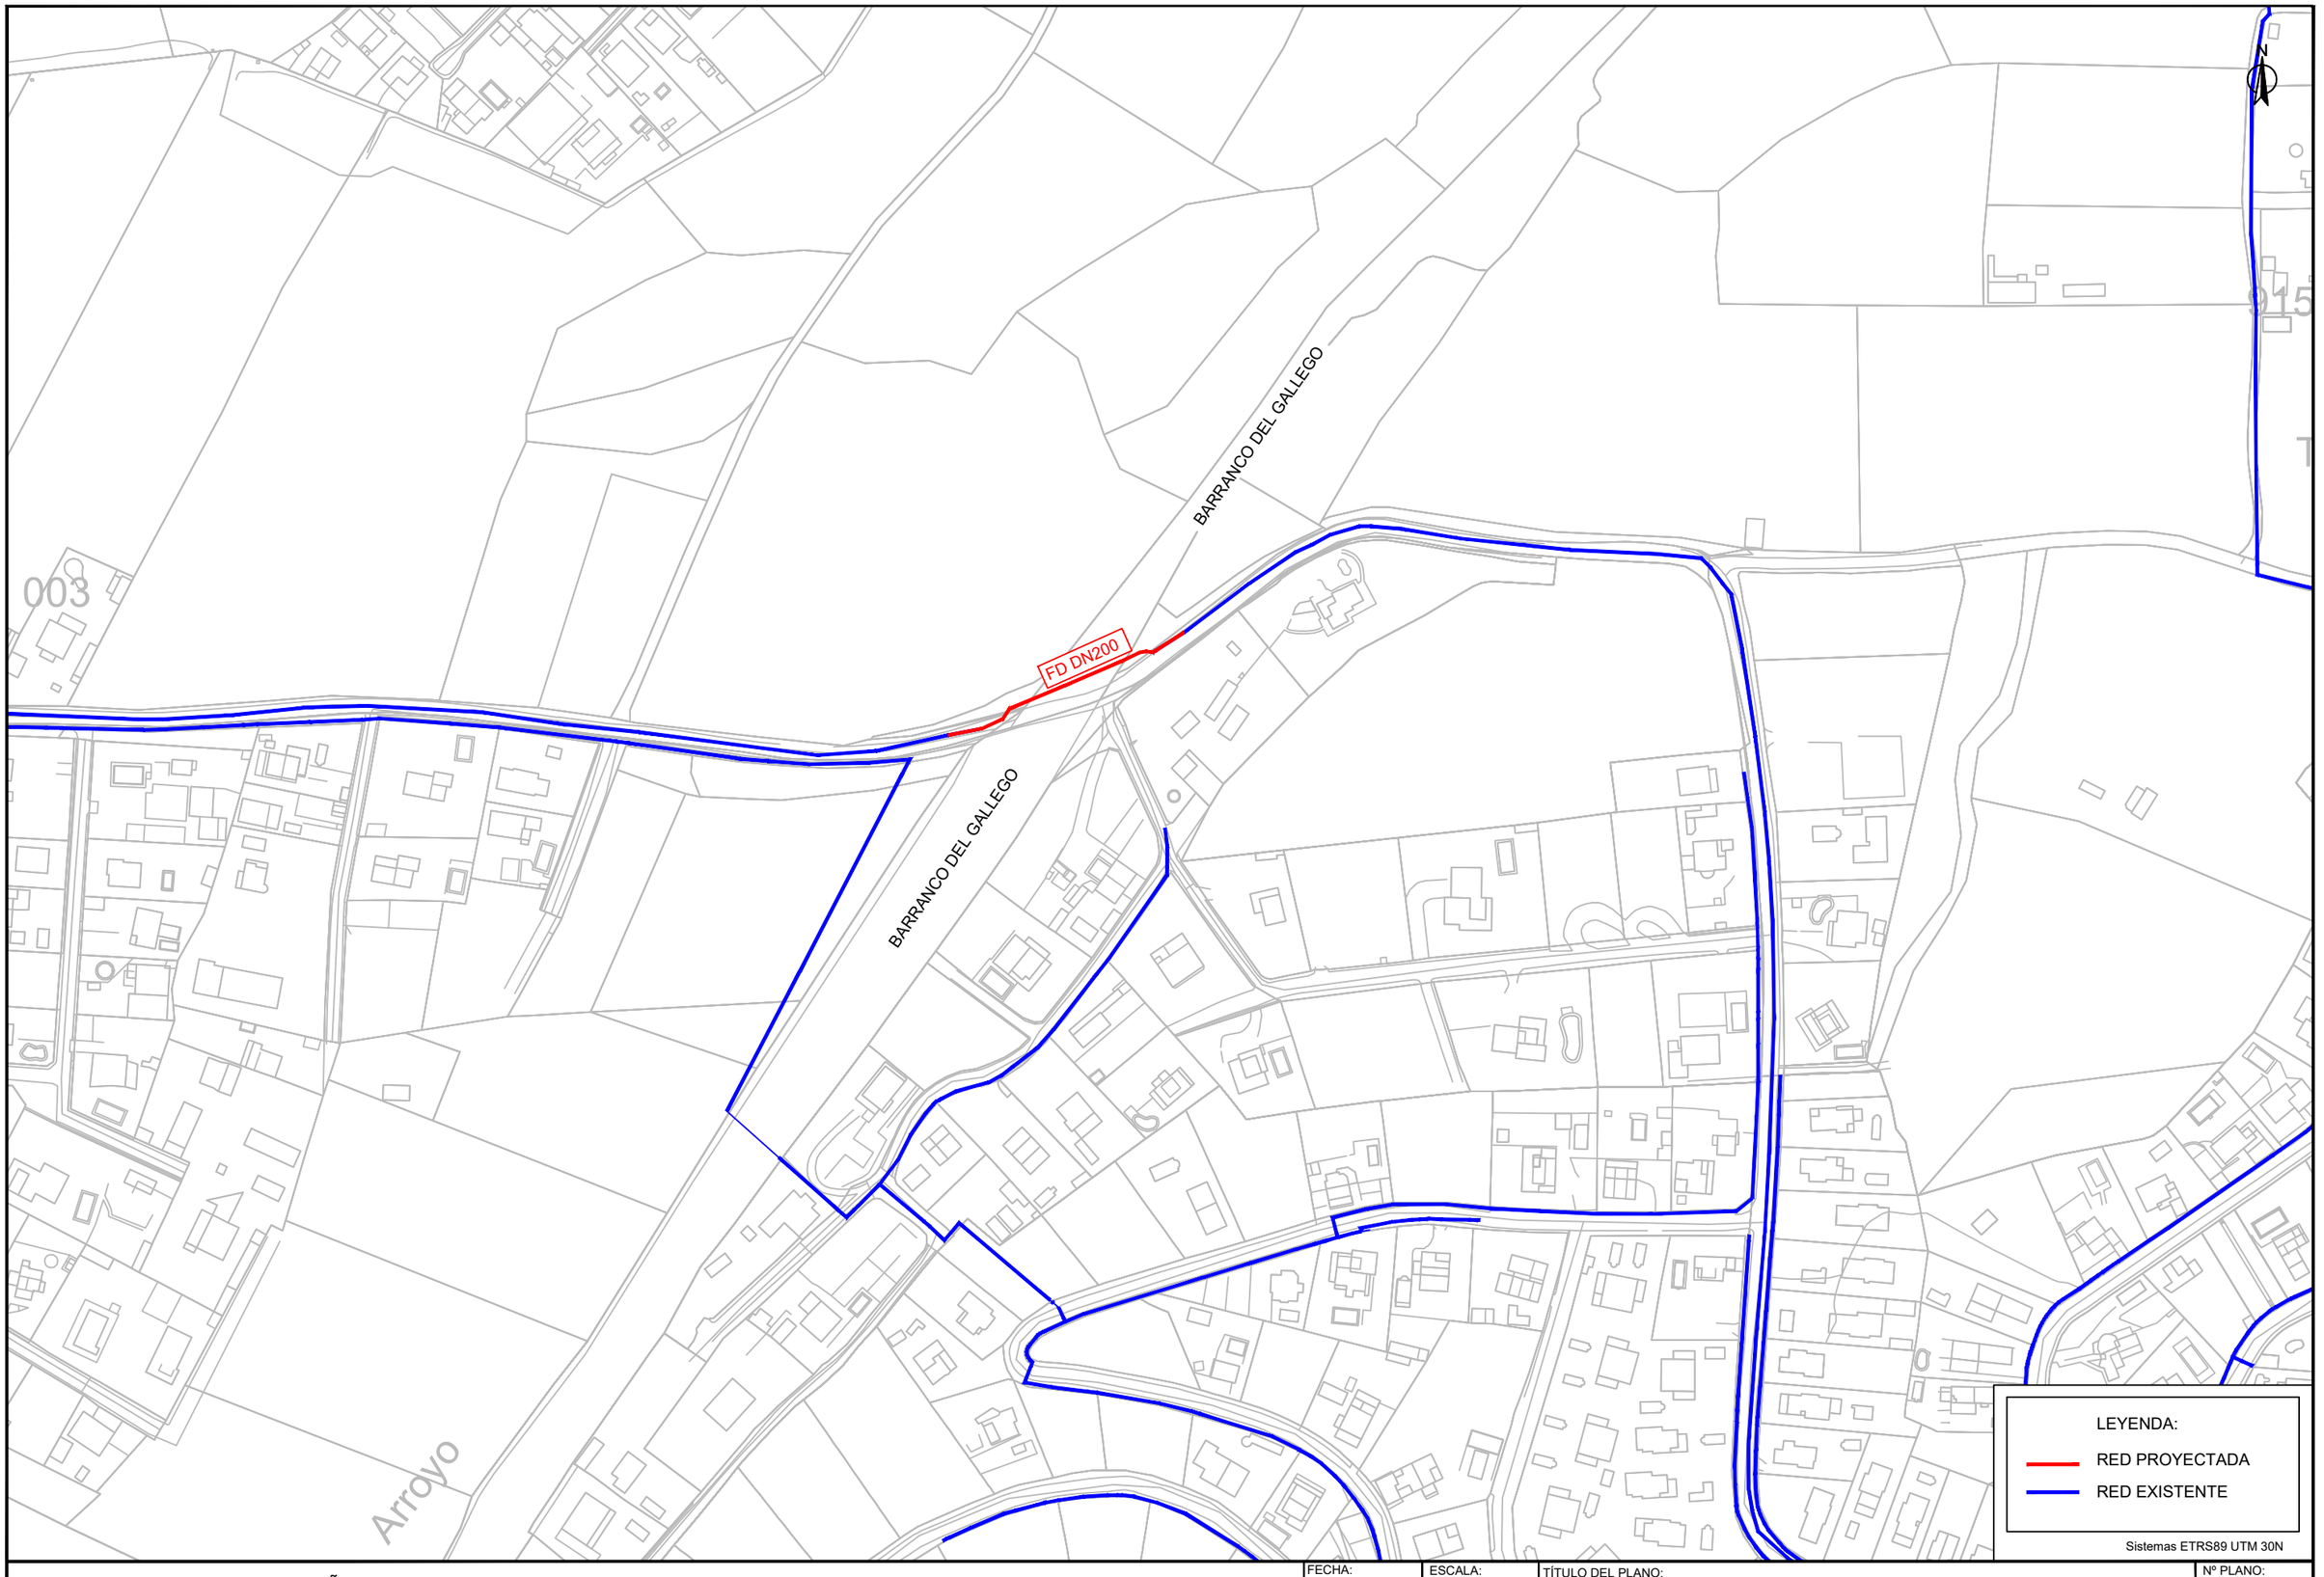

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:2000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	8

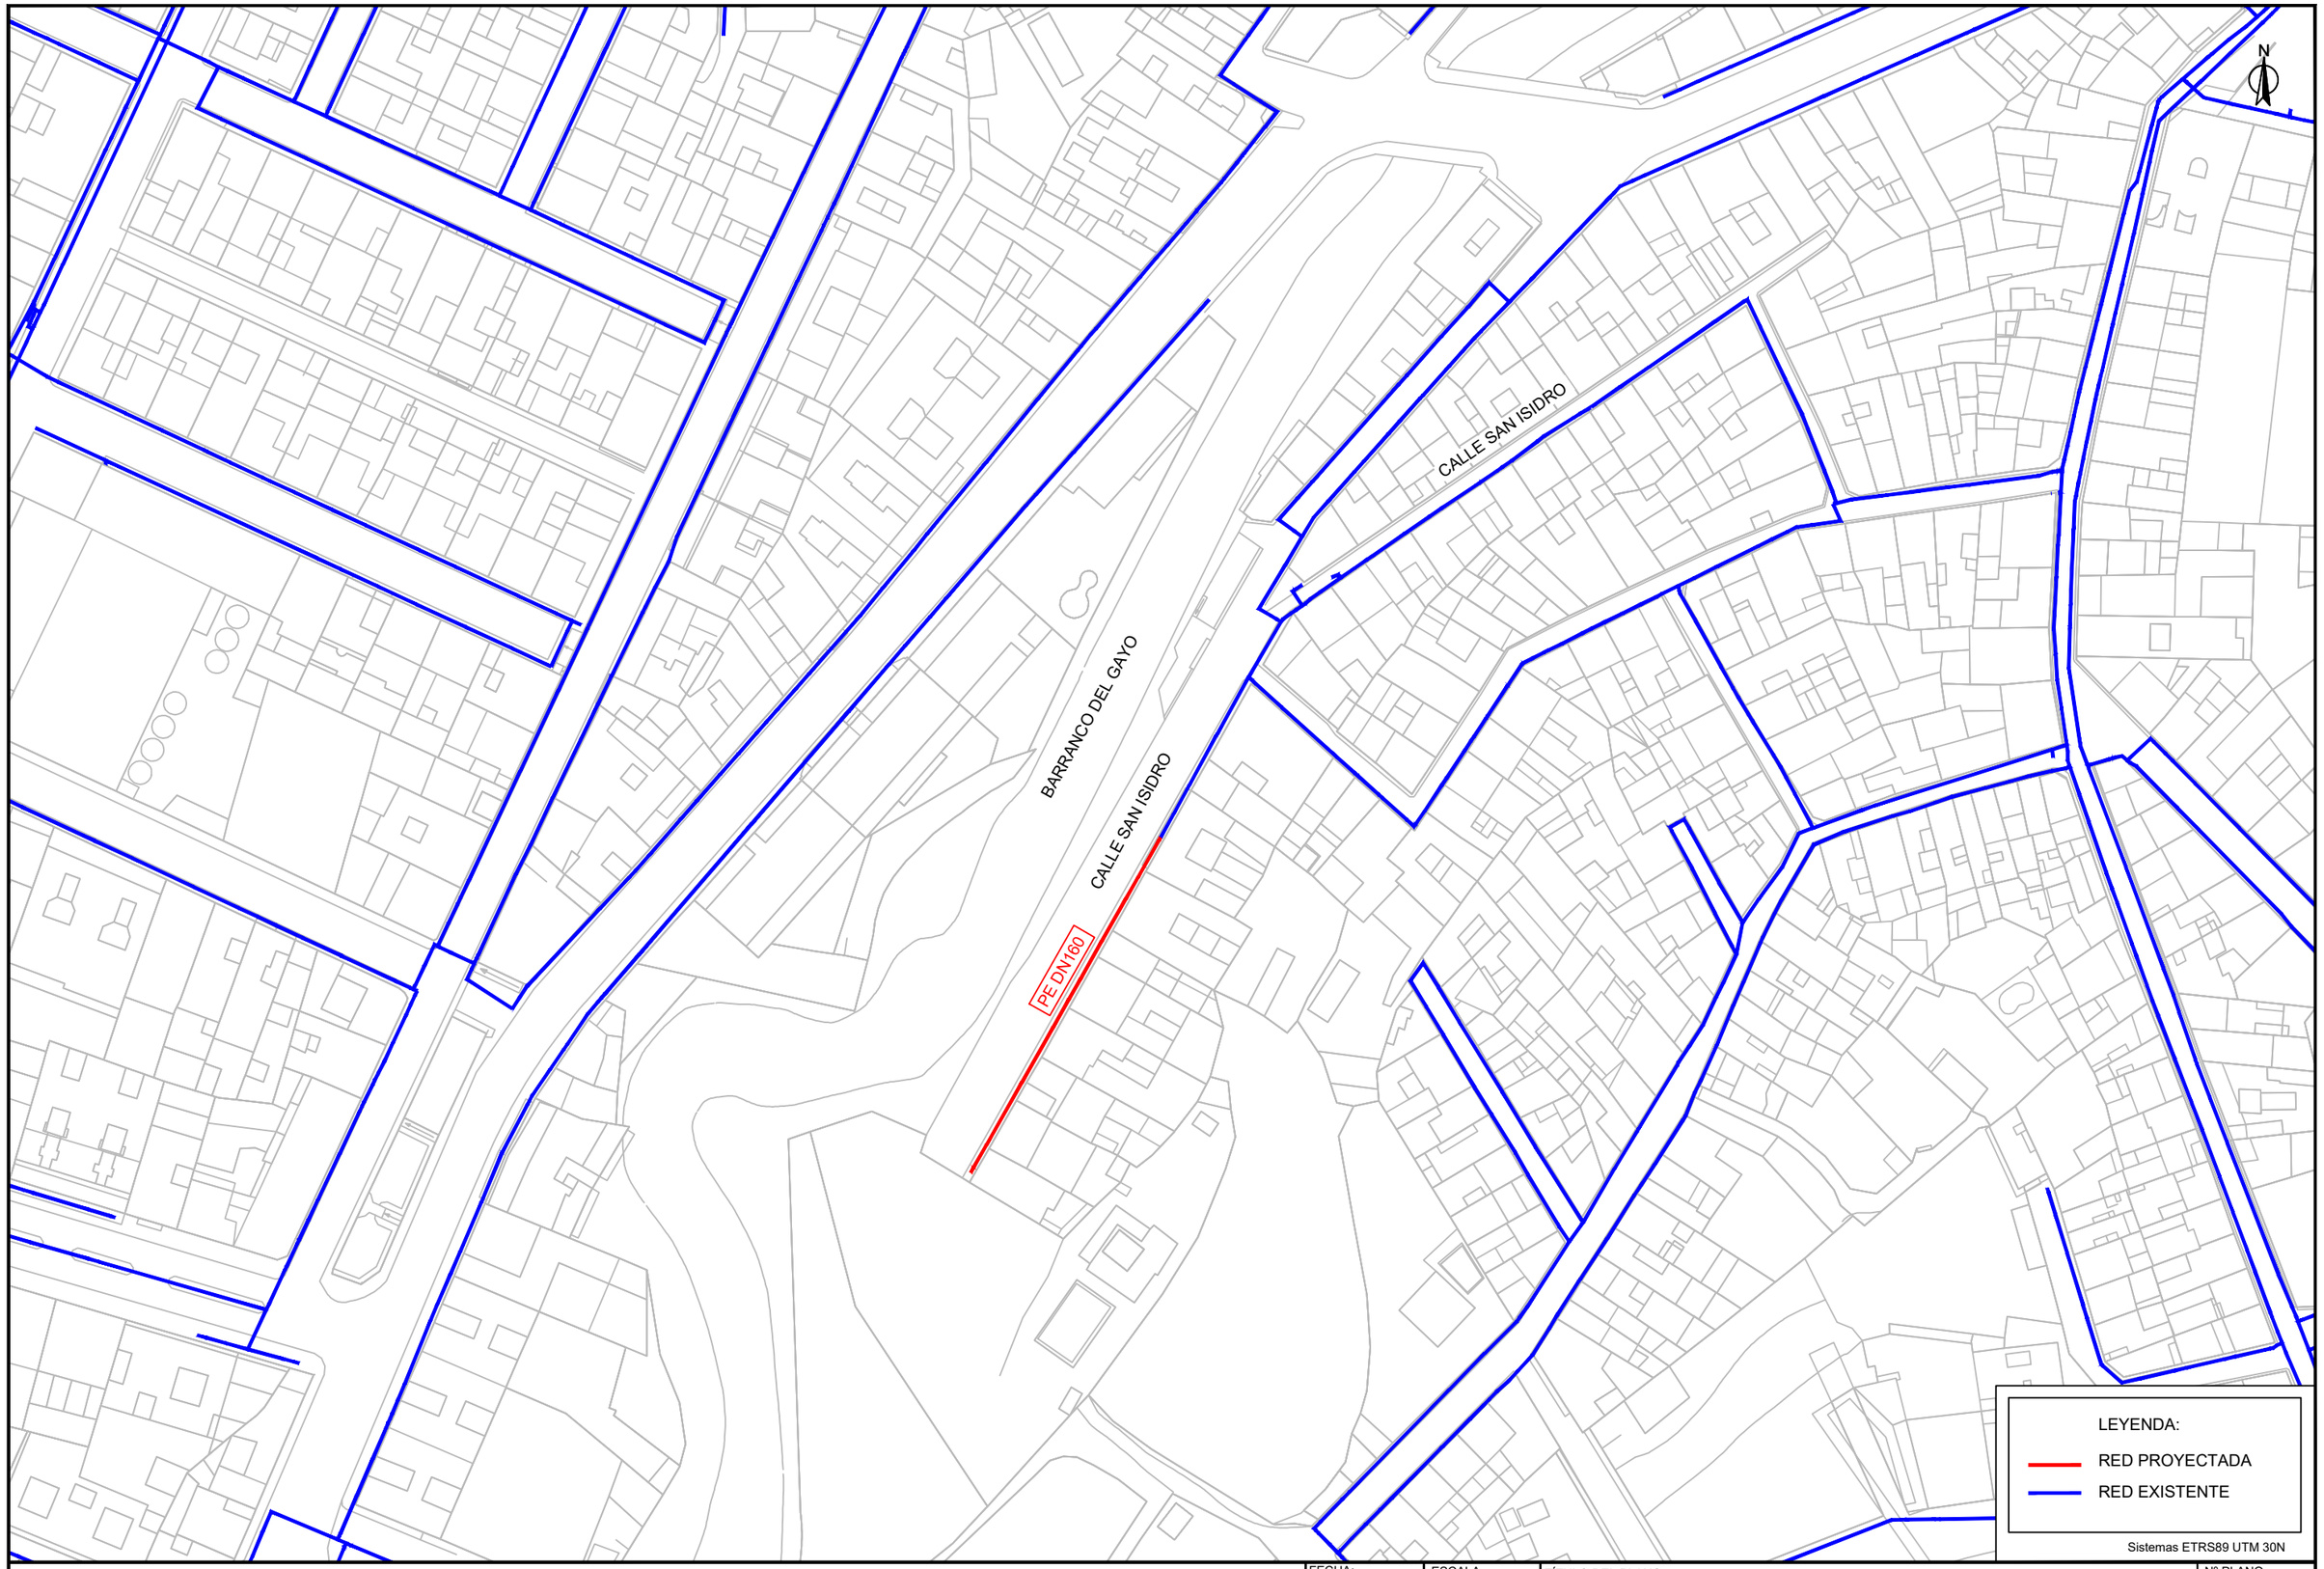

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	9

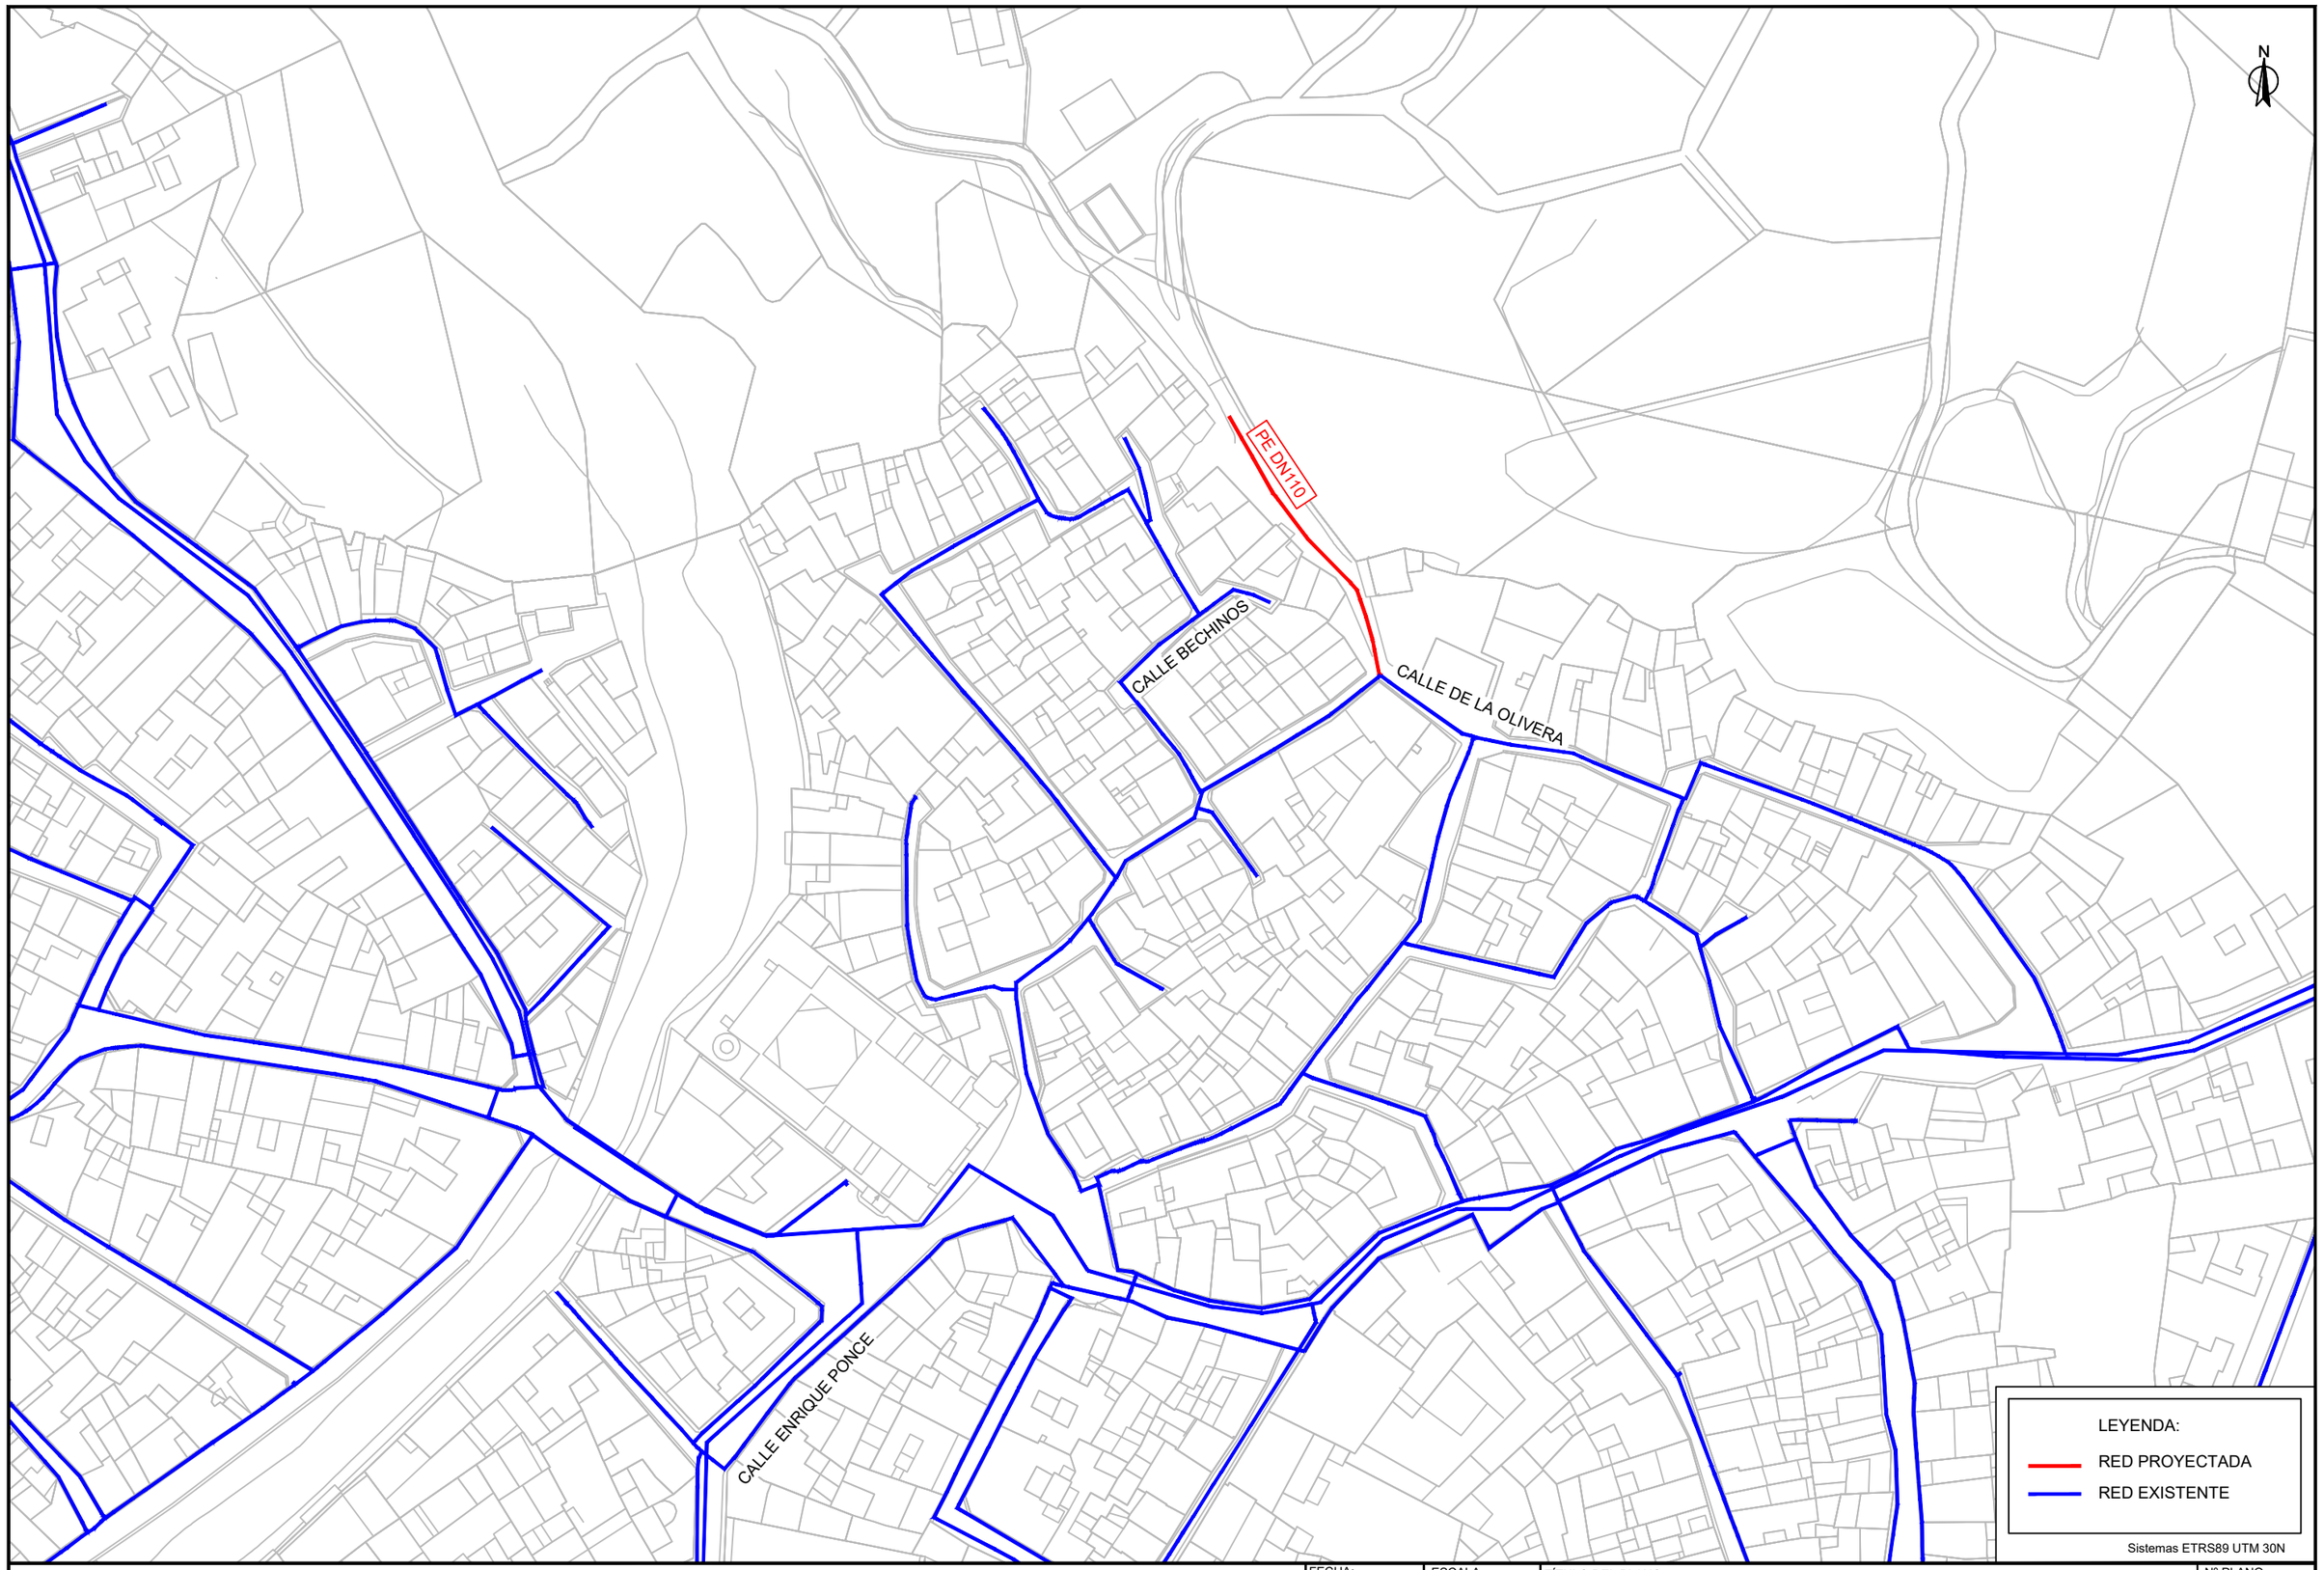

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	10

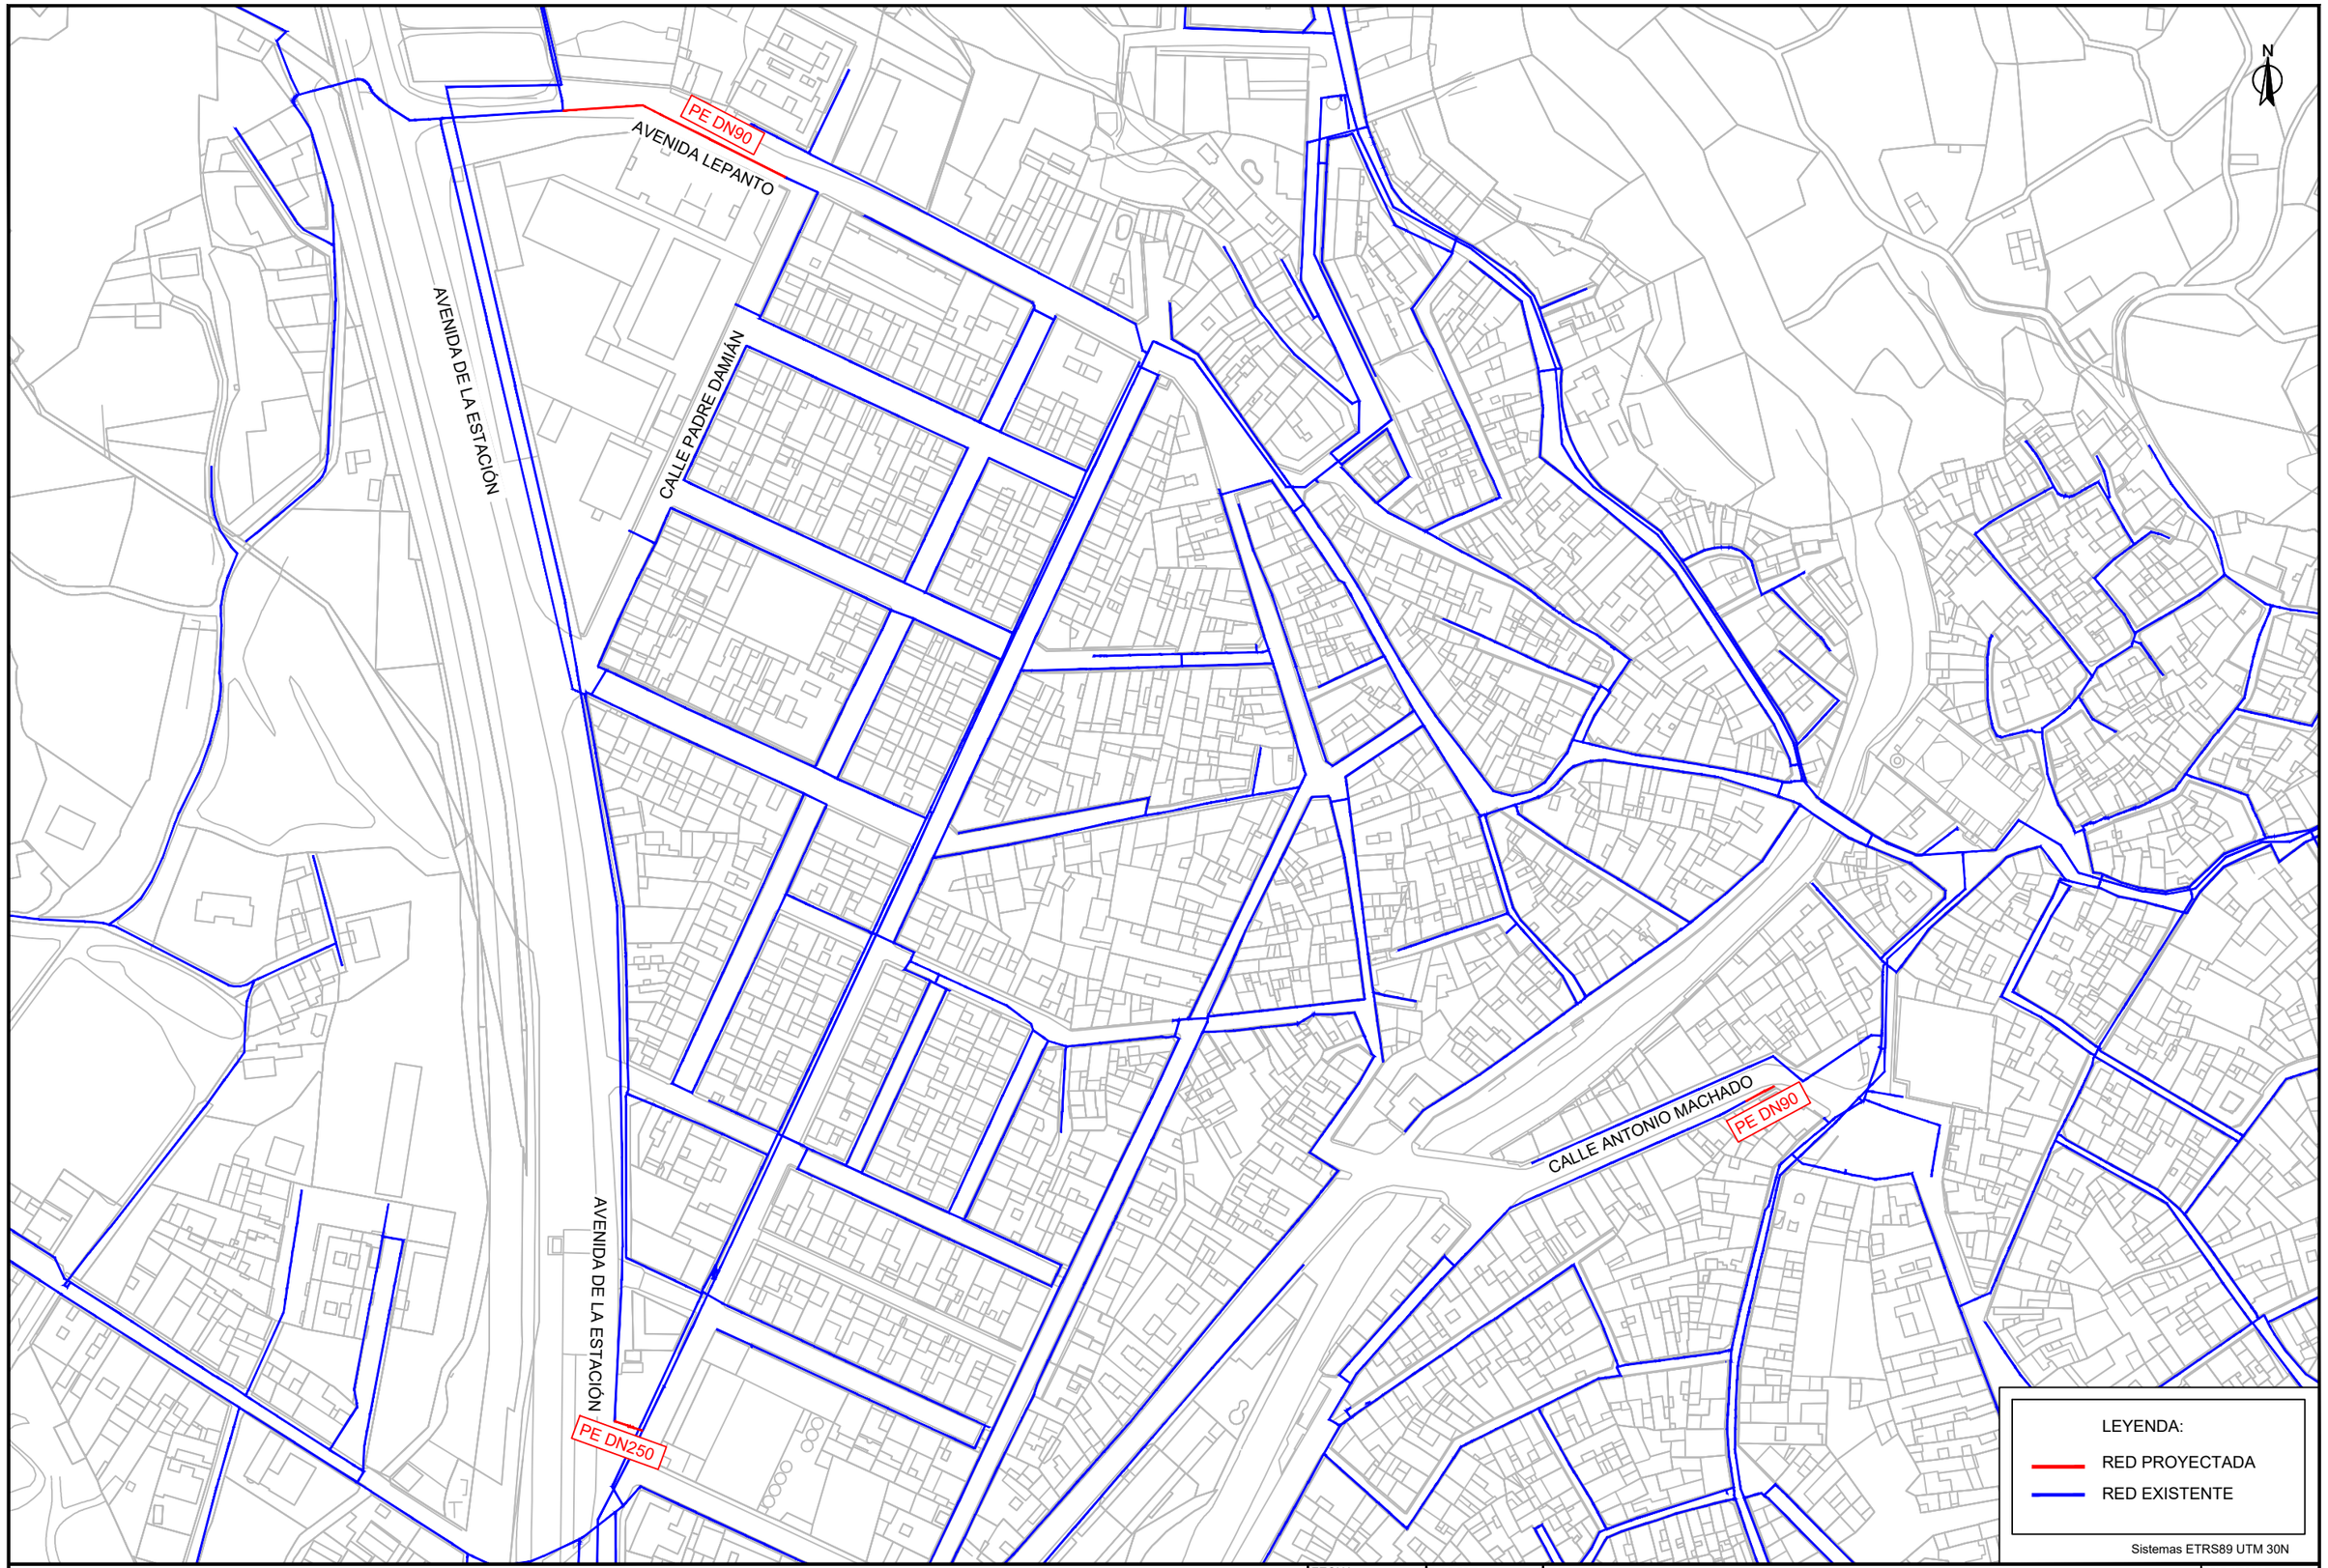

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:2000	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	11.1
	ORIGINAL A-3		HOJA 1 DE 3

CALLE SUBIDA CASTILLO

PE DN75

PE DN75

CALLE SUBIDA CASTILLO

PE DN75

N

LEYENDA:

RED PROYECTADA

RED EXISTENTE

Sistemas ETRS89 UTM 30N

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA: JULIO 2025

ESCALA: 1:2000

ORIGINAL A-3

TÍTULO DEL PLANO: PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES

Nº PLANO: 11.2

HOJA 2 DE 3

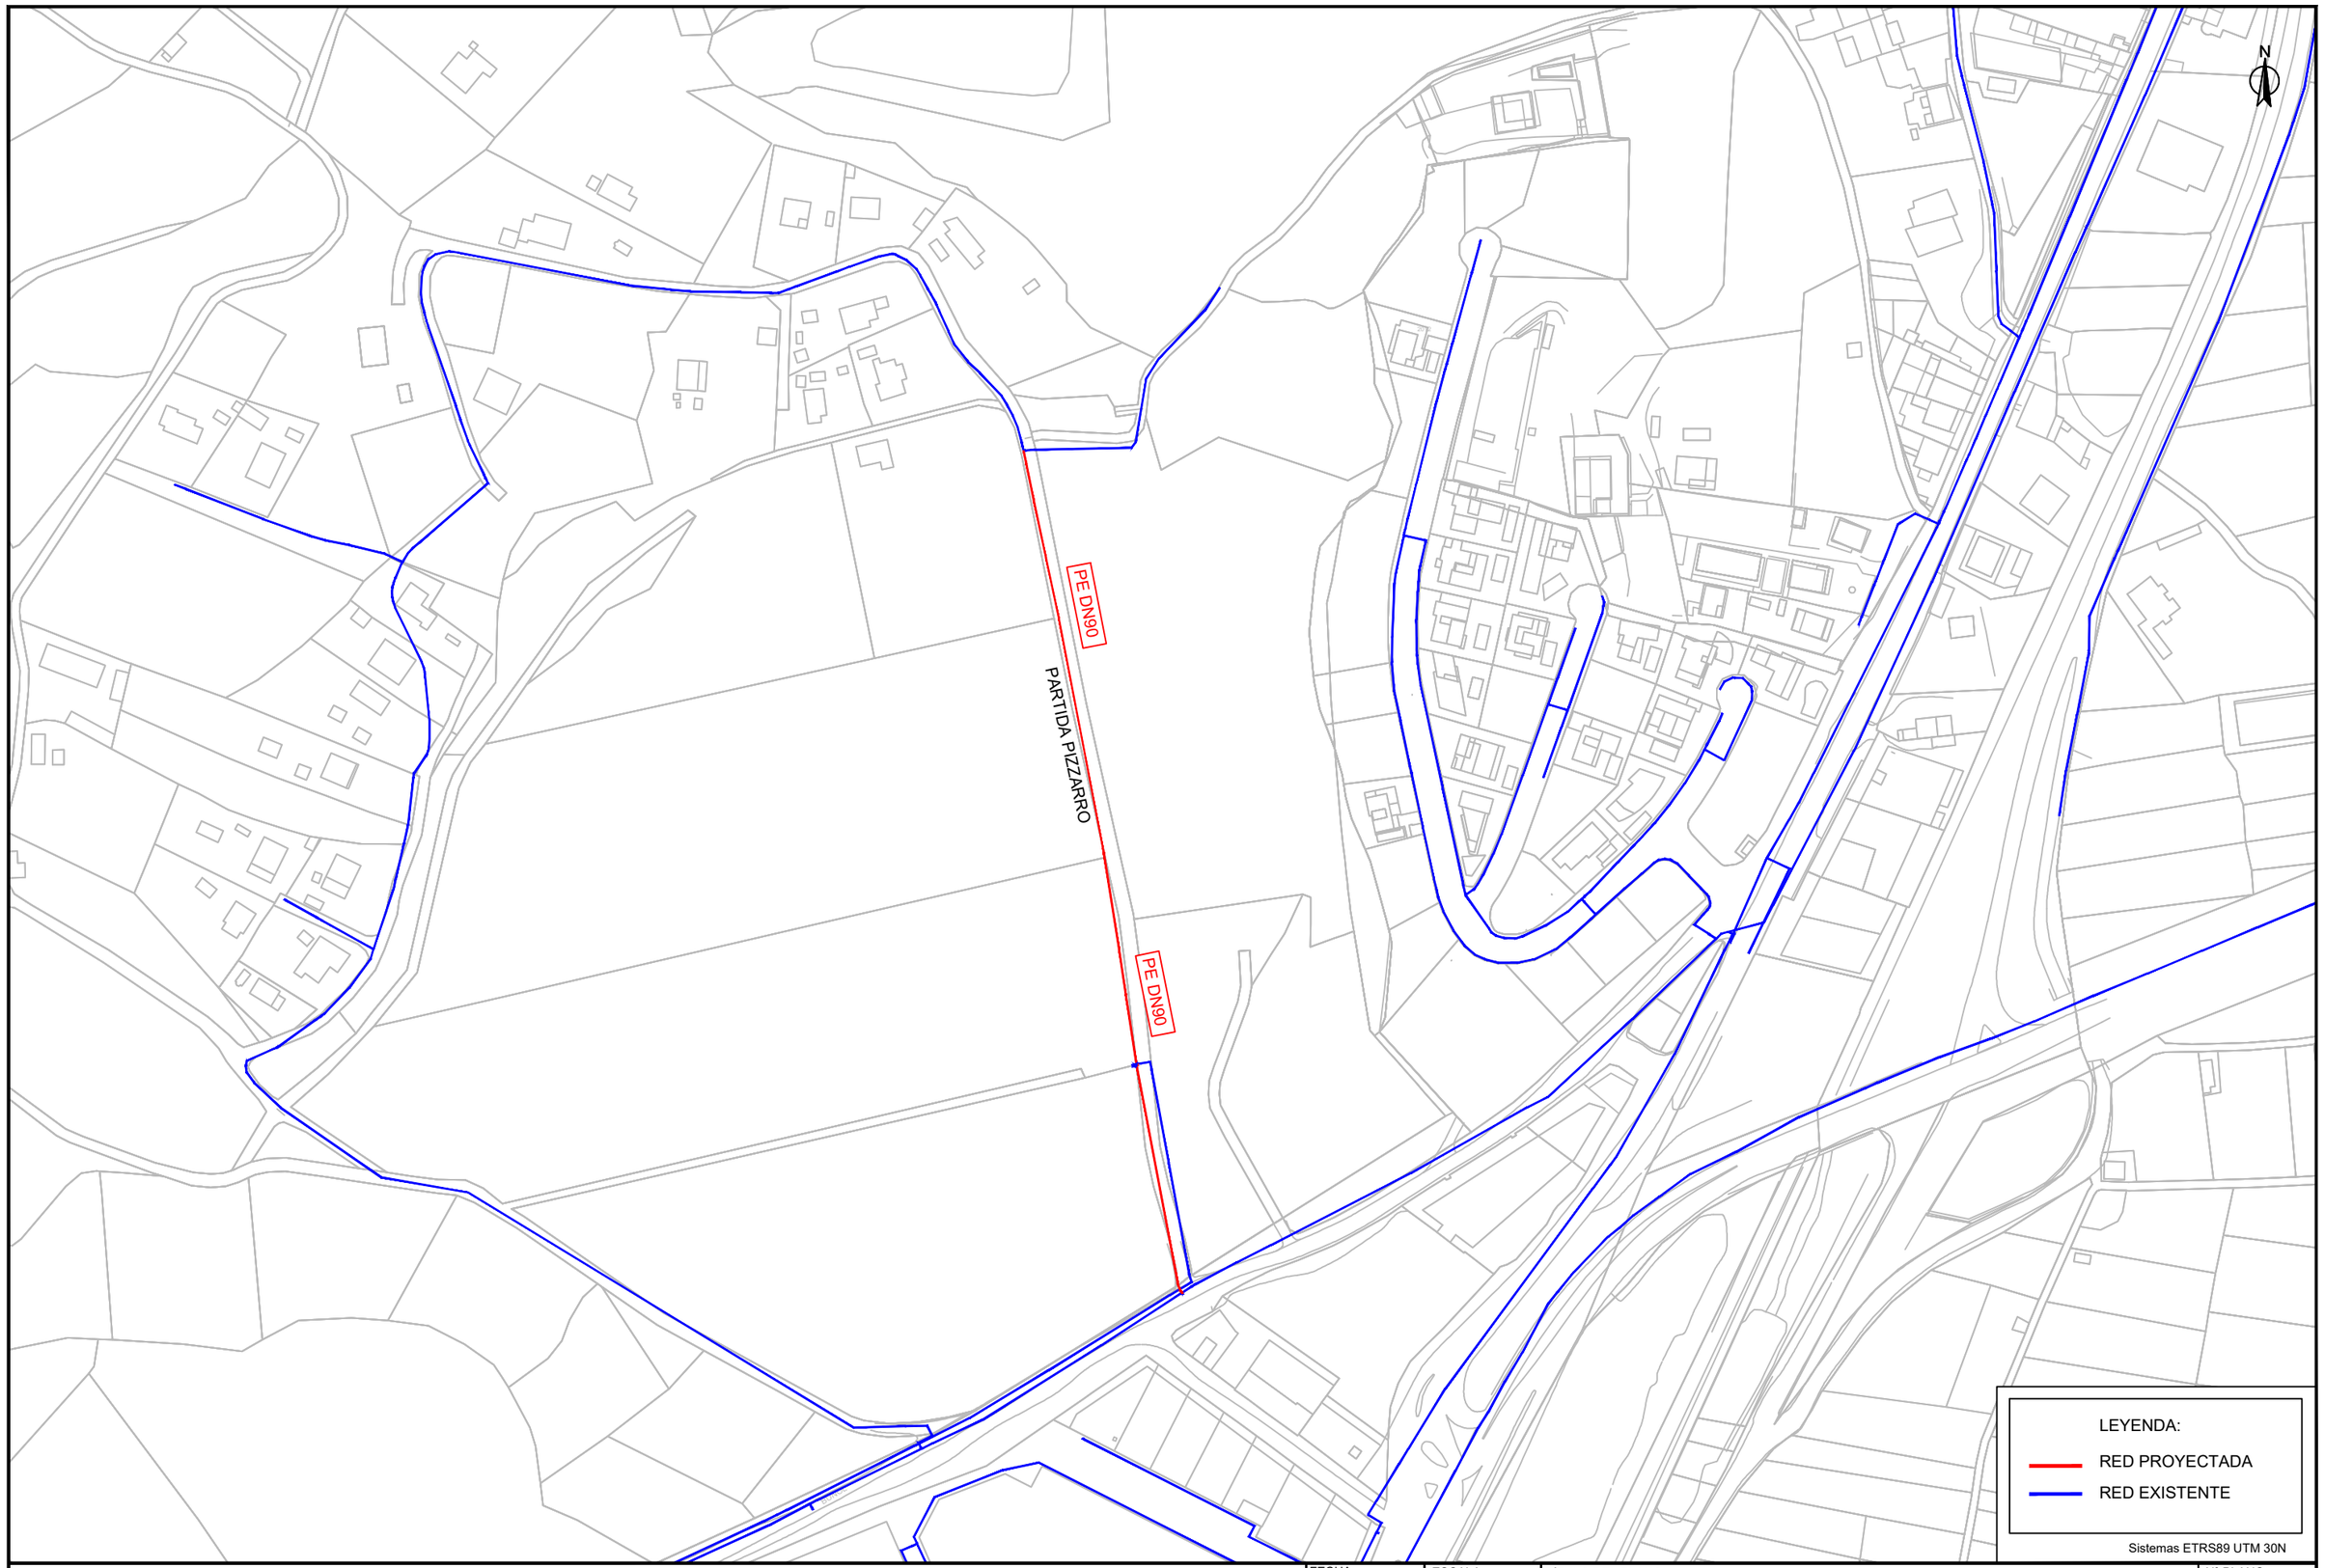

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:2000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	11.3 HOJA 3 DE 3

URB. LOMA DEL MIRALCAMPO

PE DN 110

BARRANCO DE GALLEGO

PE DN 110

BARRANCO DE GALLEGO

URBANIZACIÓN ENTREPINOS

URBANIZACIÓN SIERRA PERENCHIZA

N

LEYENDA:

RED PROYECTADA

RED EXISTENTE

Sistemas ETRS89 UTM 30N

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA: JULIO 2025

ESCALA: 1:4000

ORIGINAL A-3

TÍTULO DEL PLANO: PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES

Nº PLANO: 12

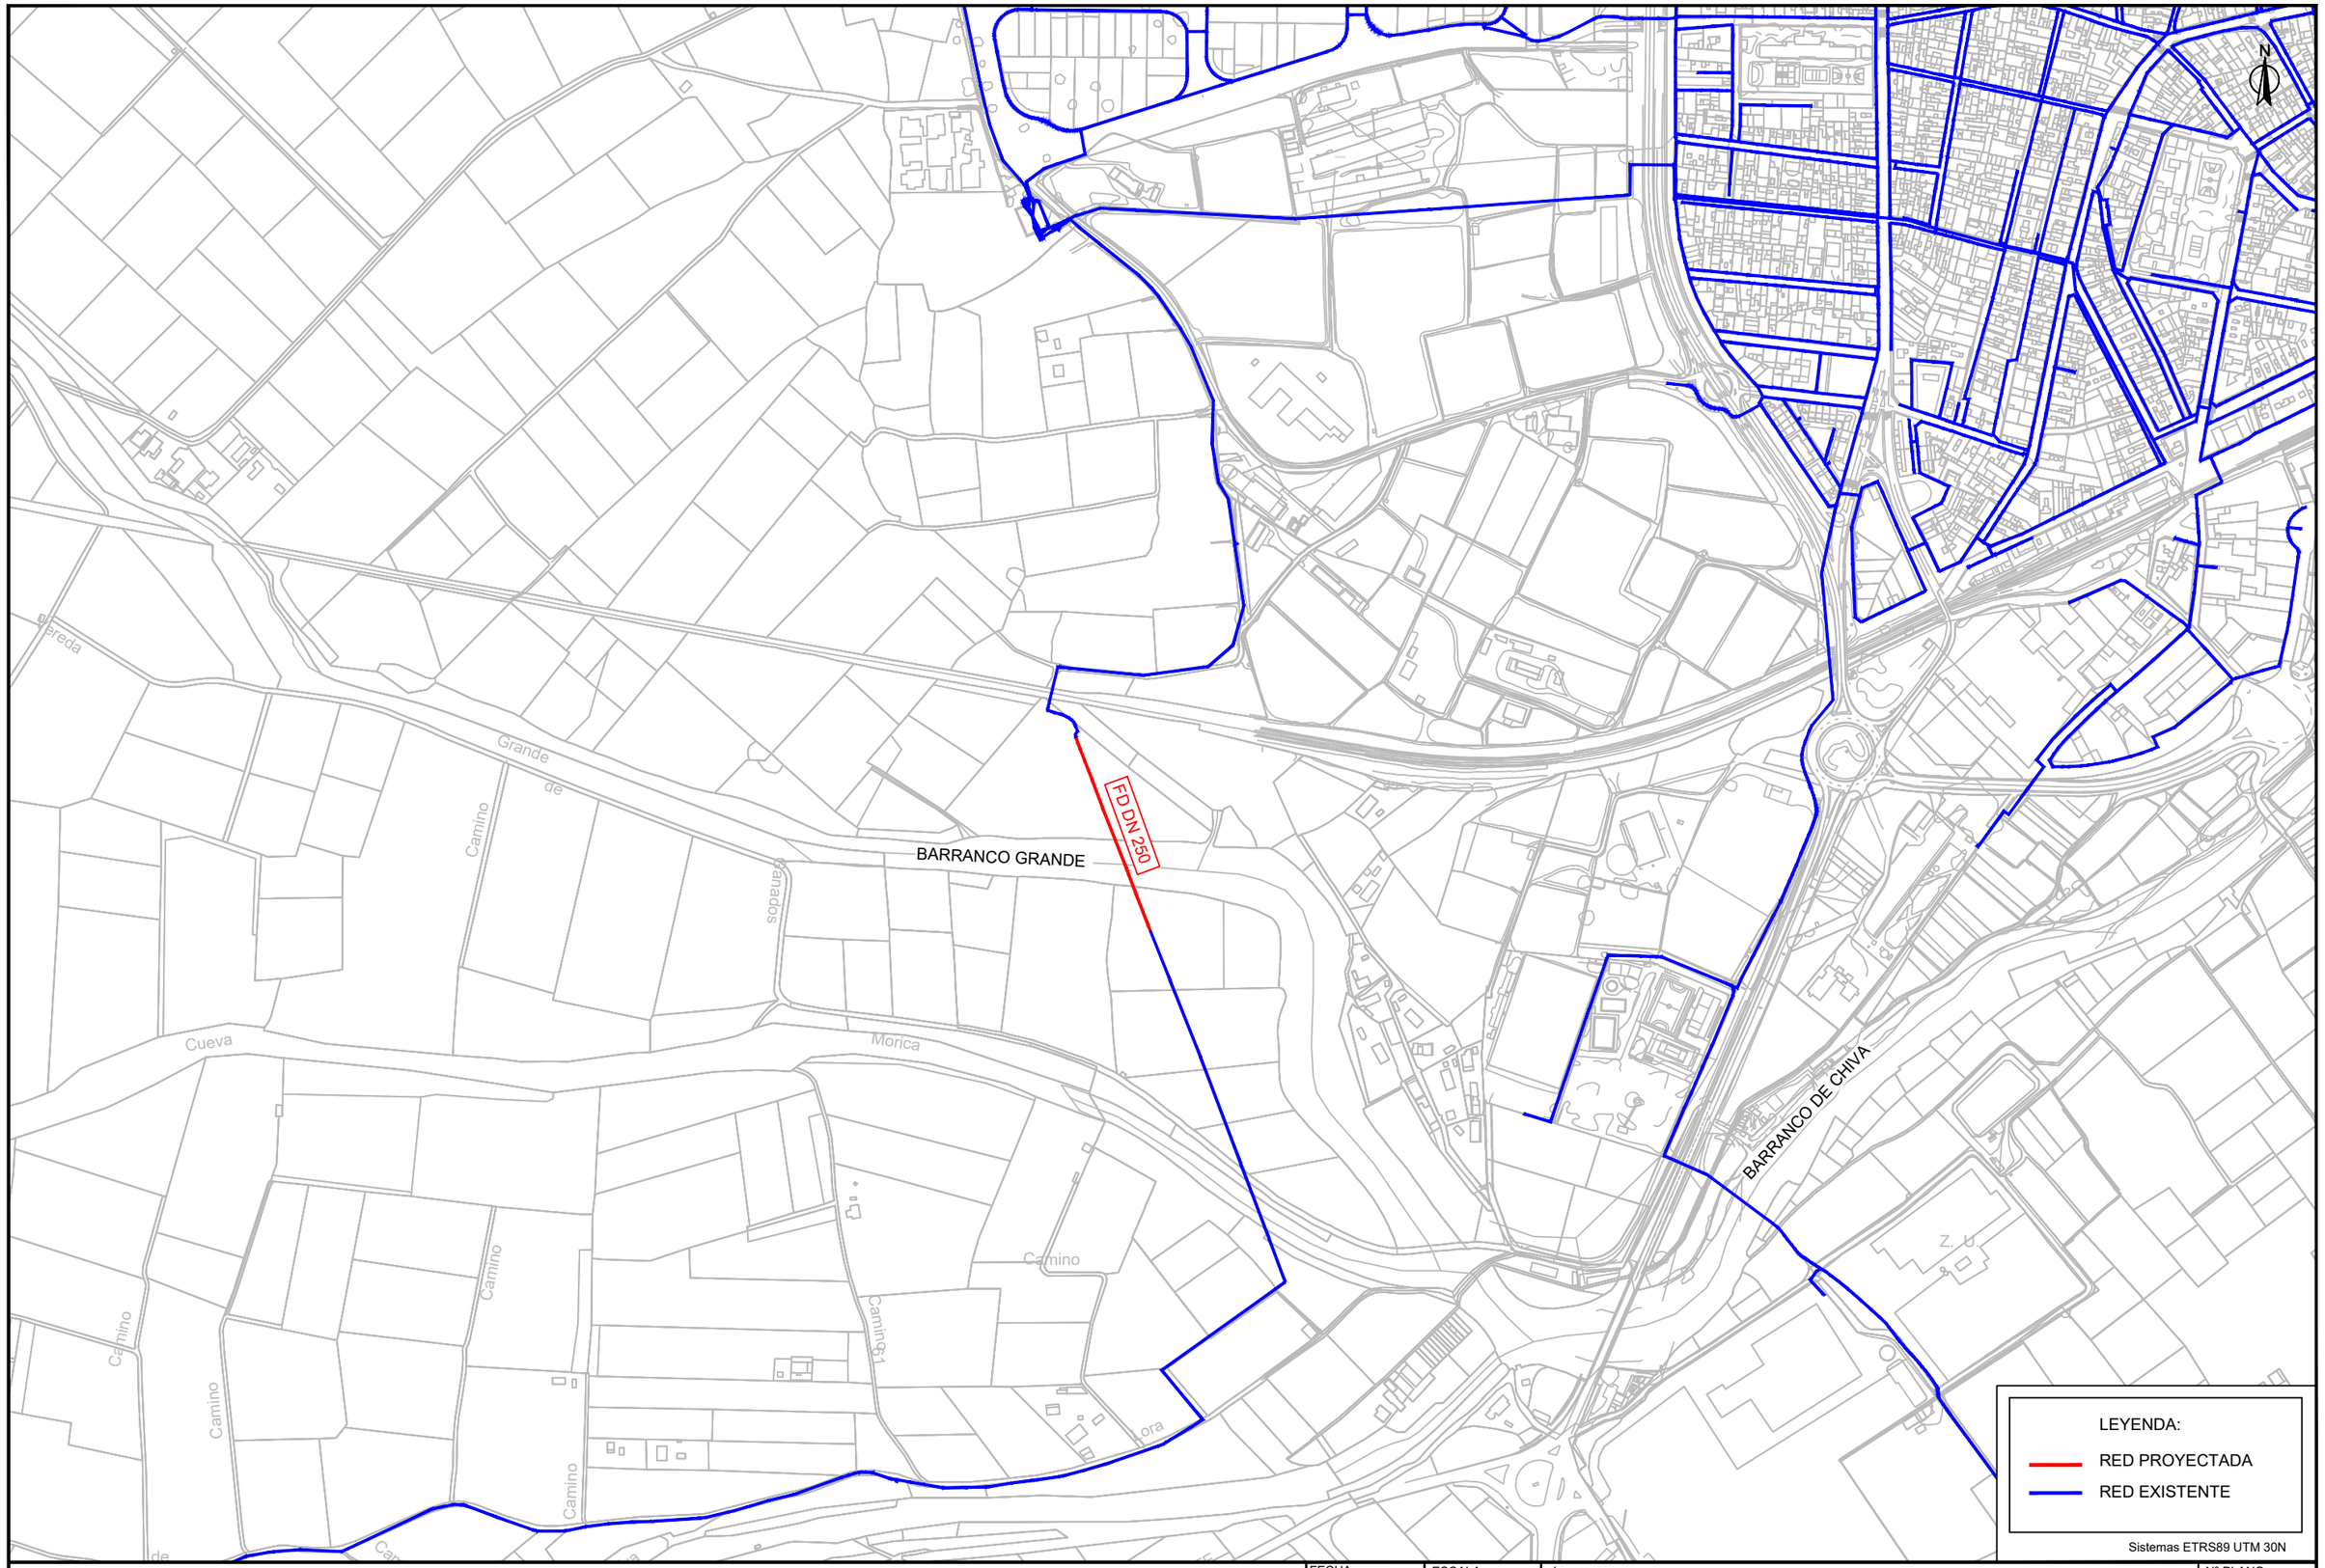

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:5000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	13

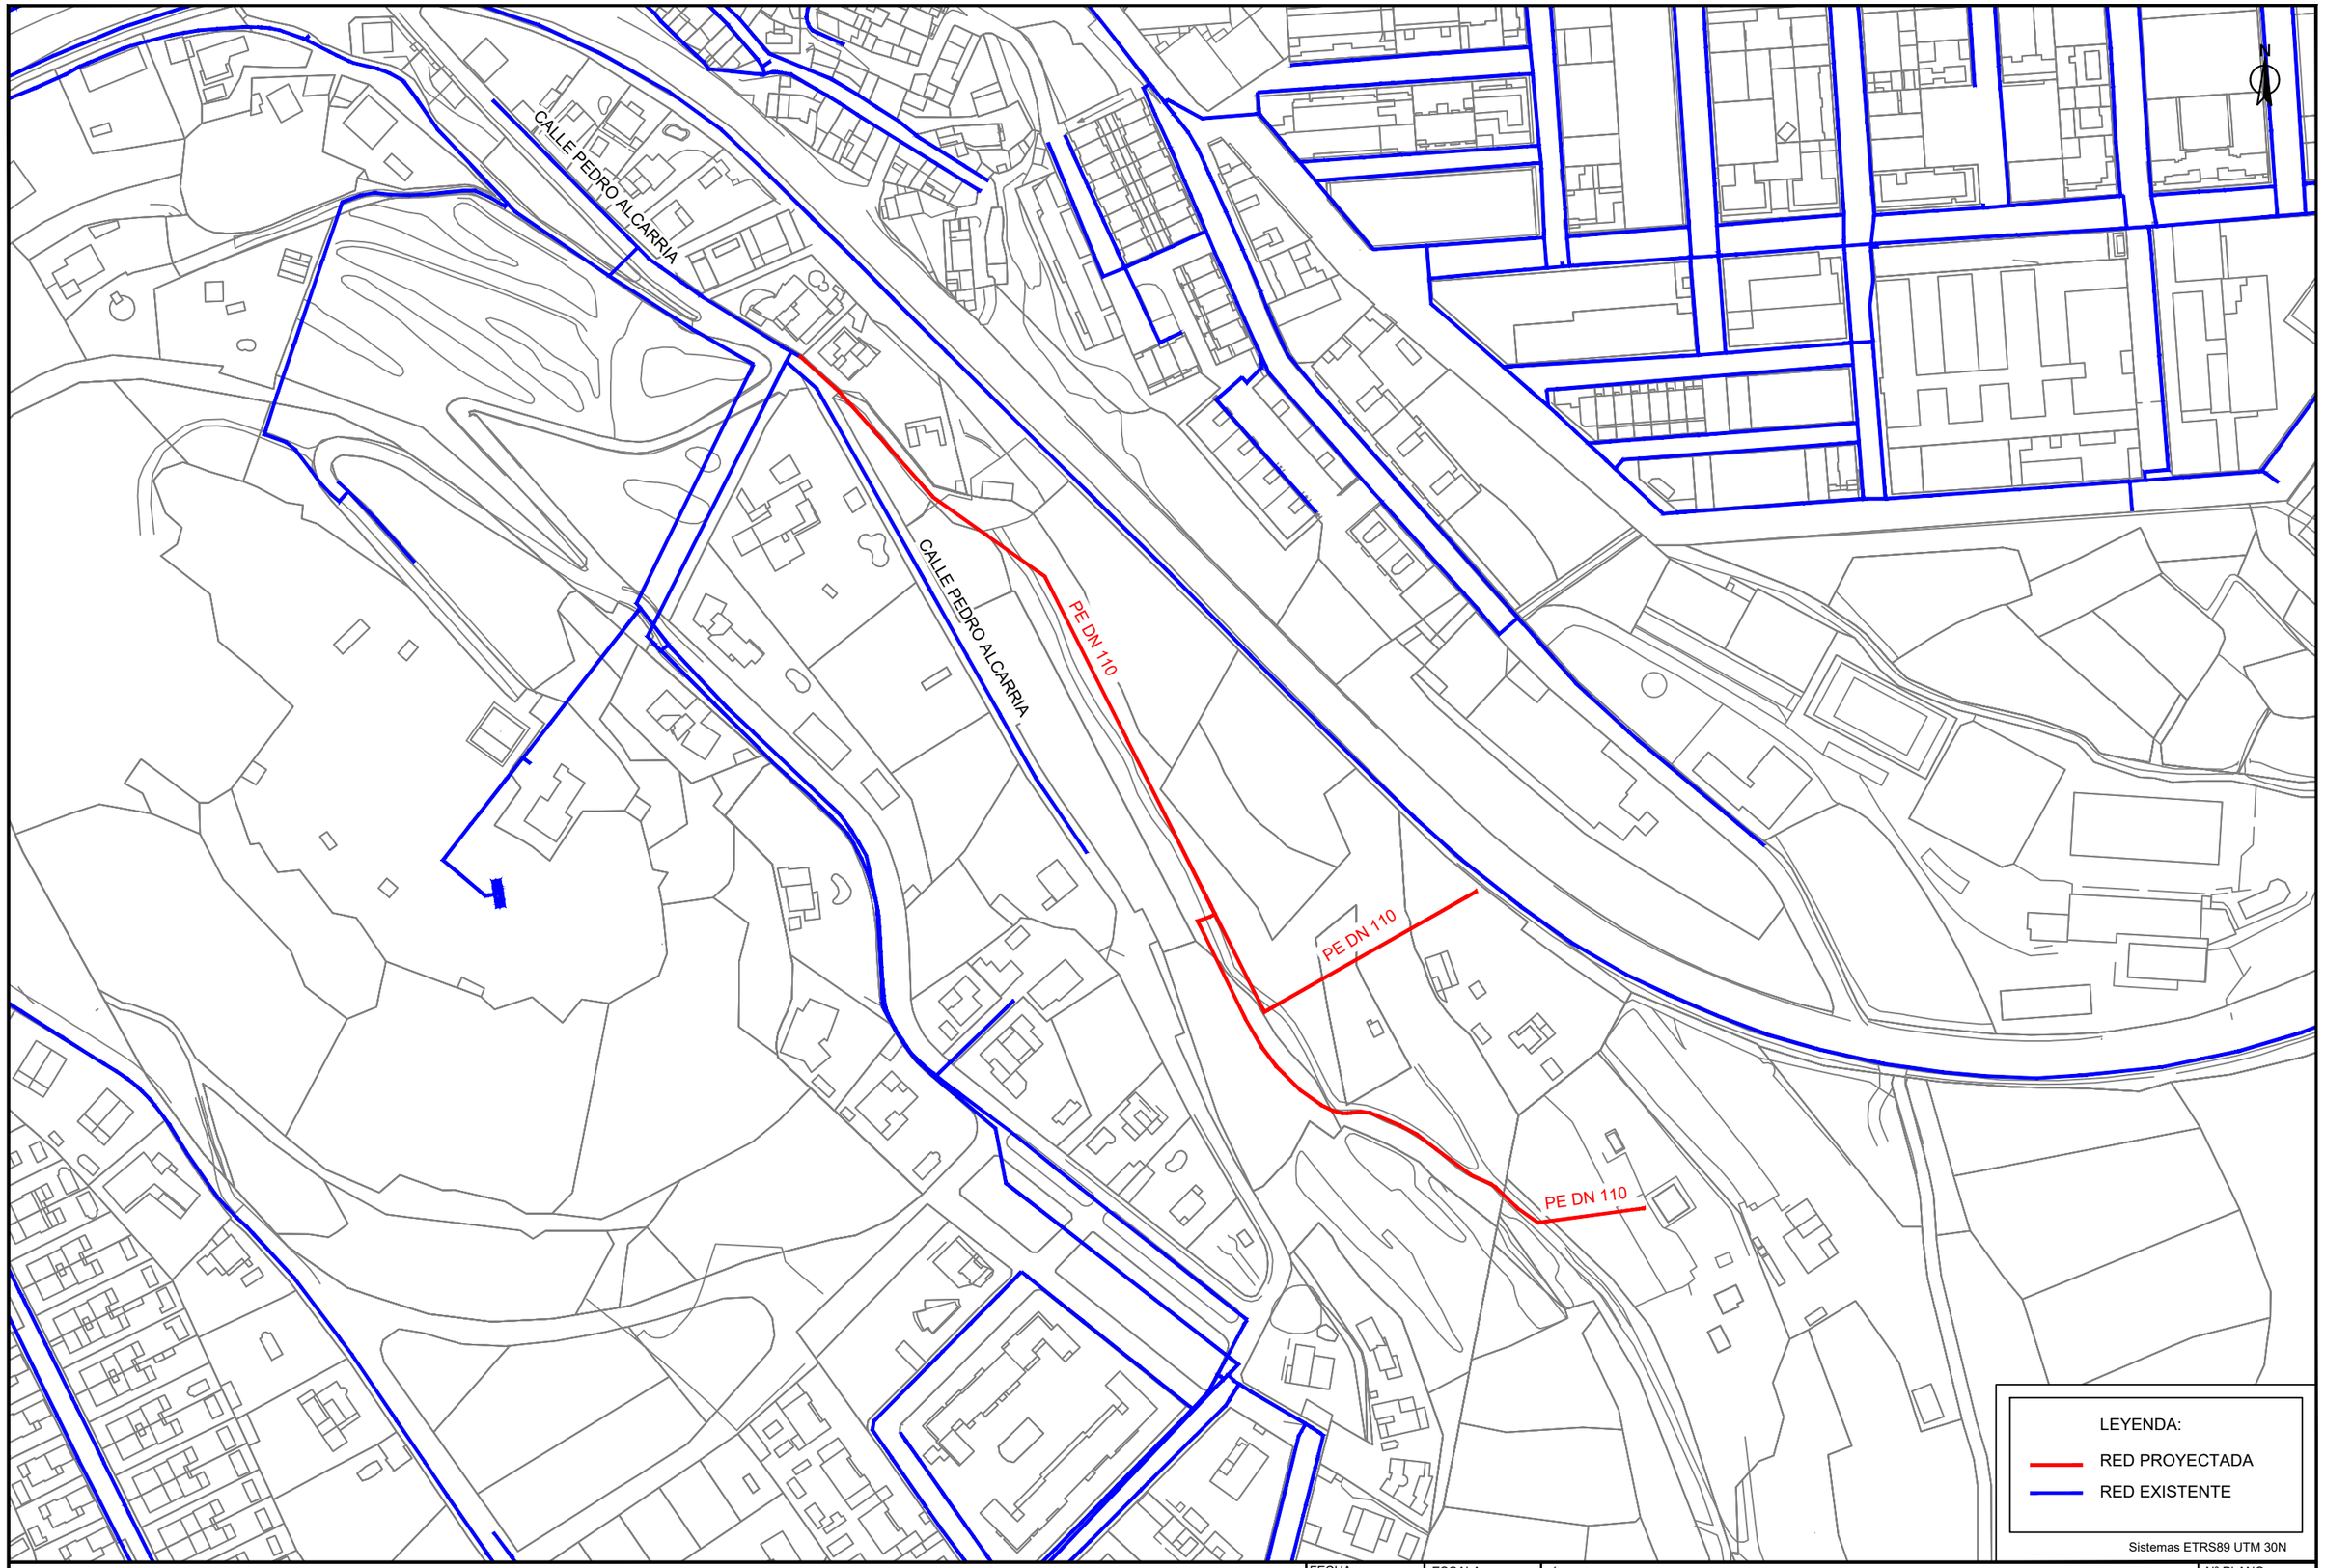

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:2000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	14

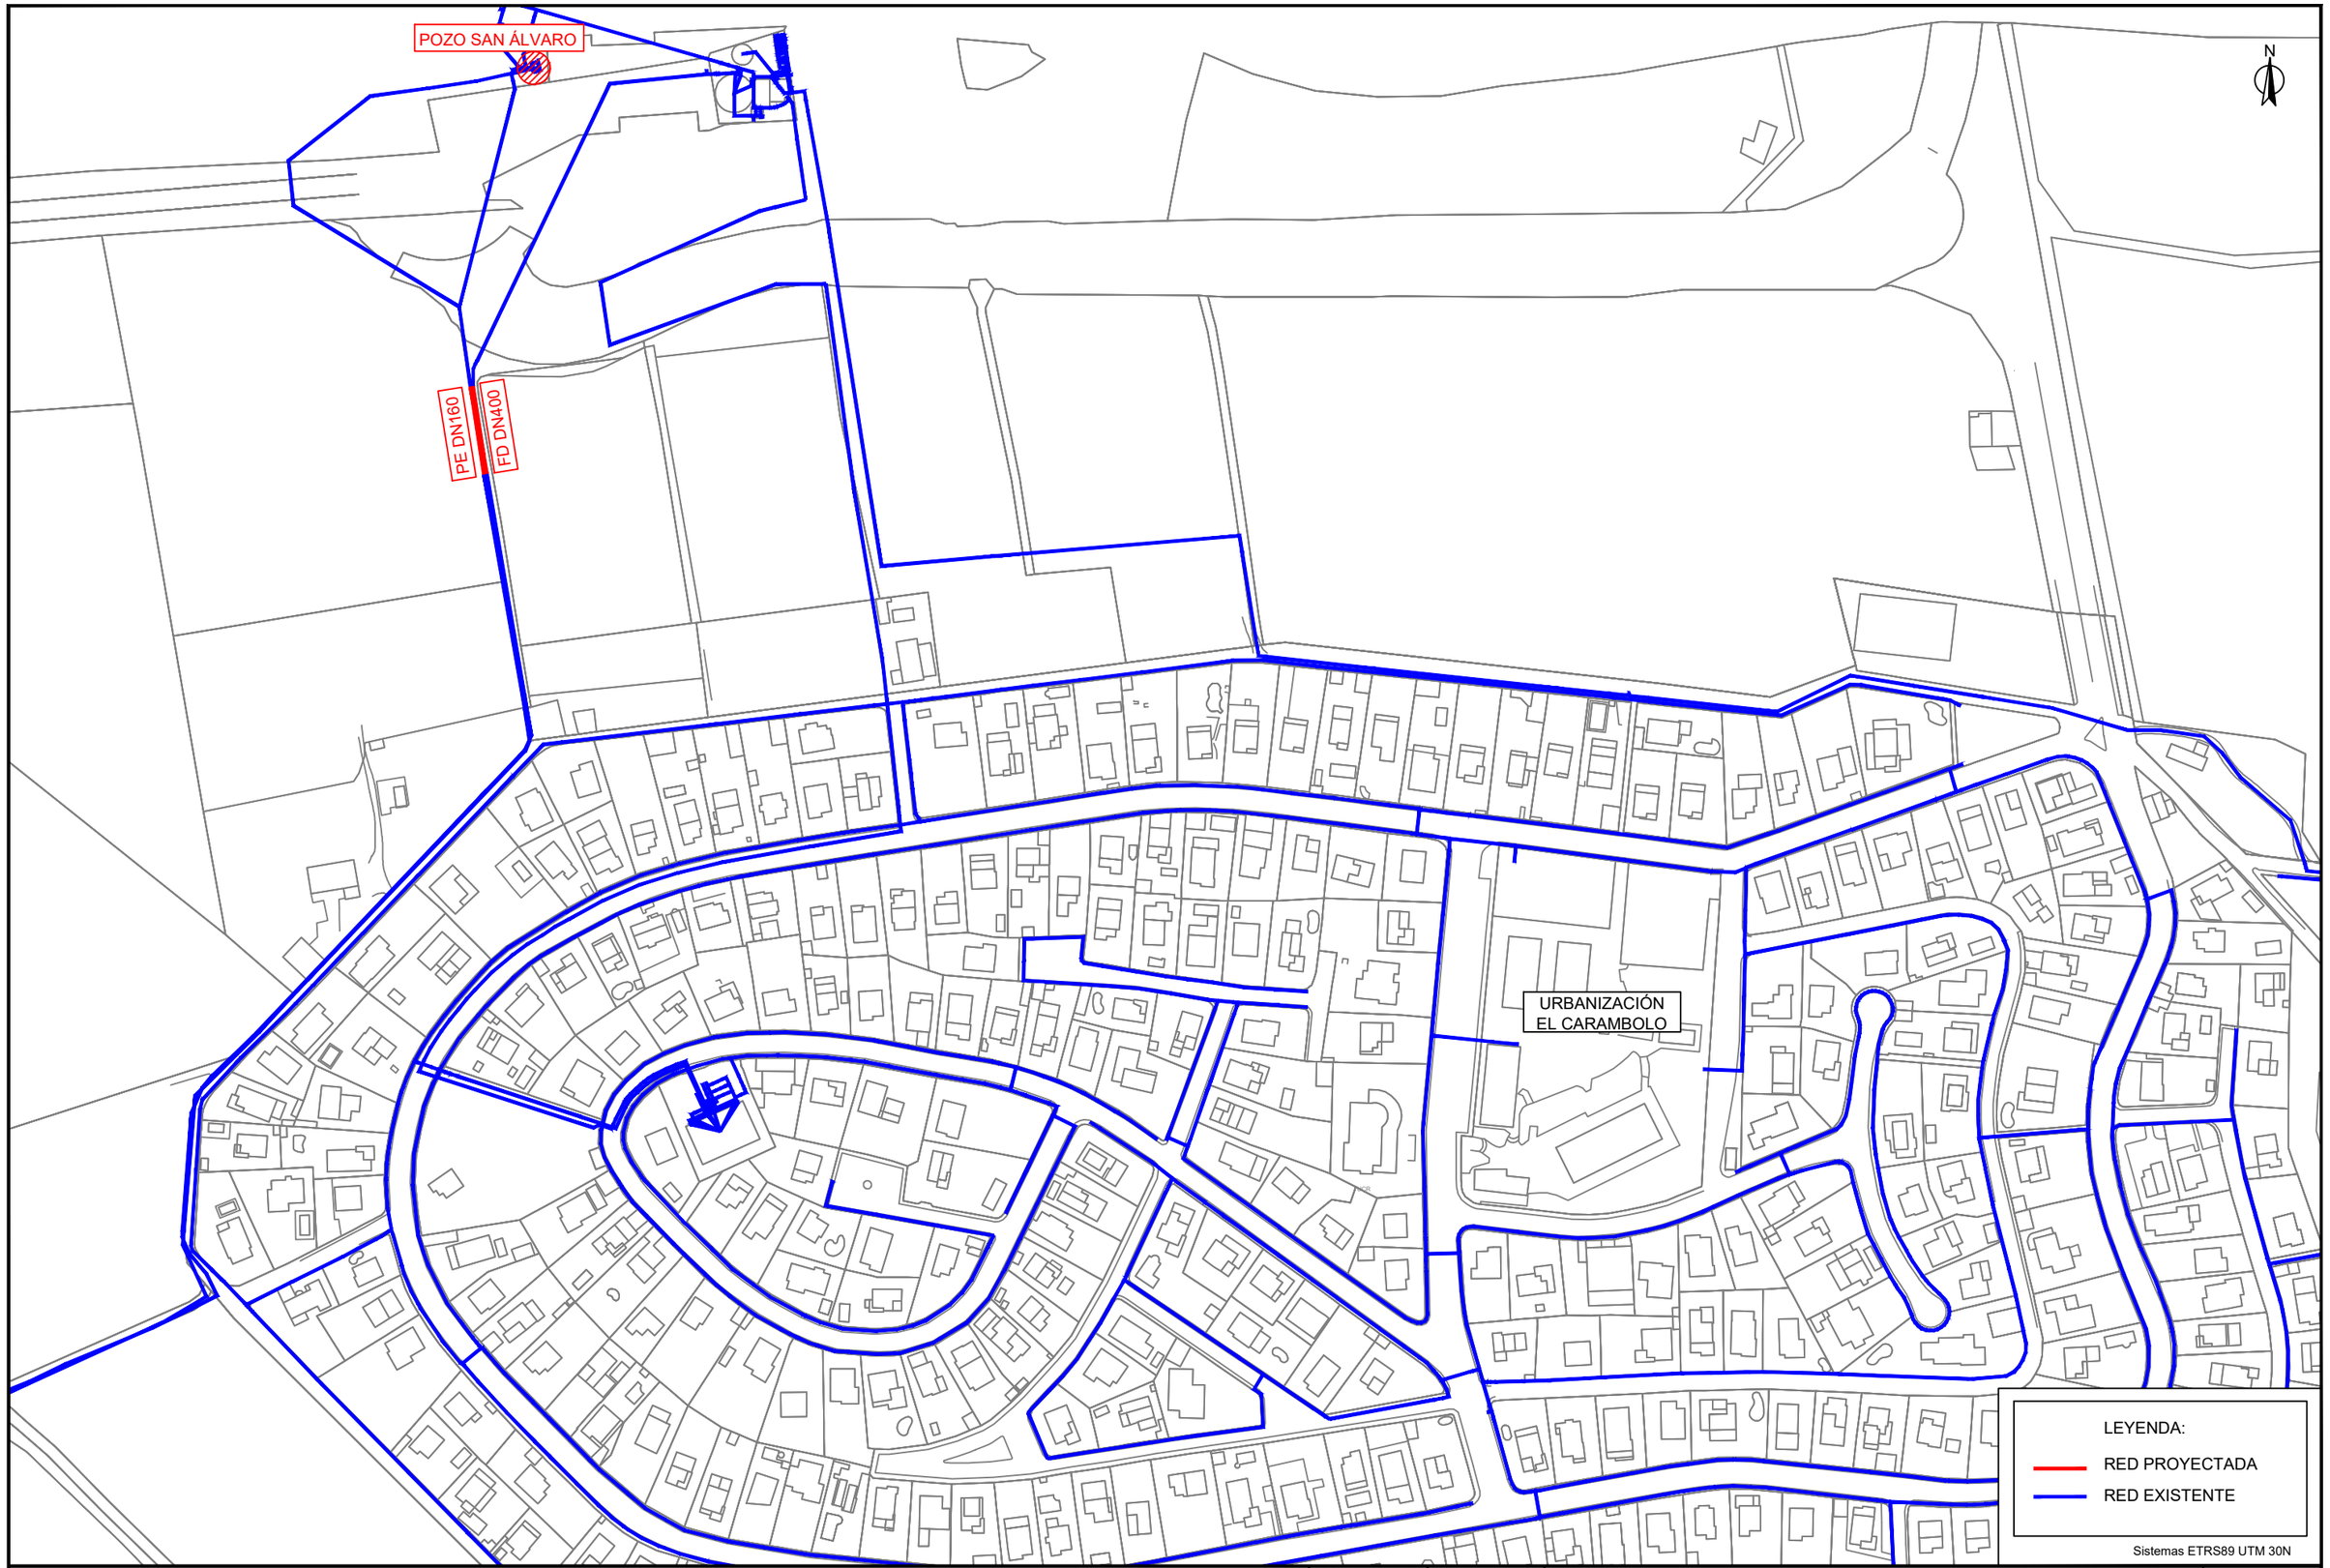

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:2000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	15

VÁLVULA DE CIERRE

SECCION A-A'

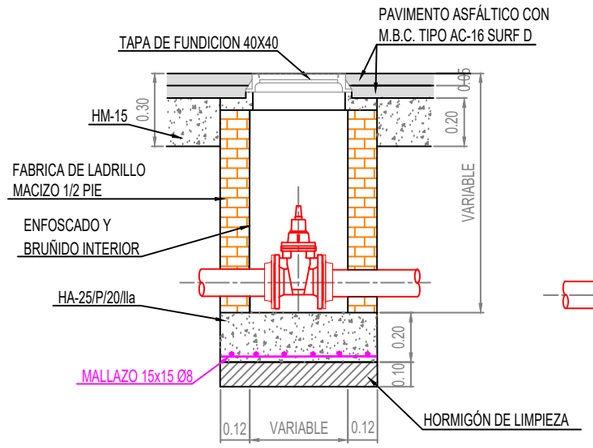

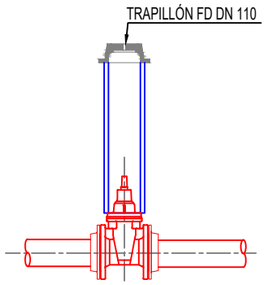

PLANTA



INSTALACIÓN DE ACOMETIDA

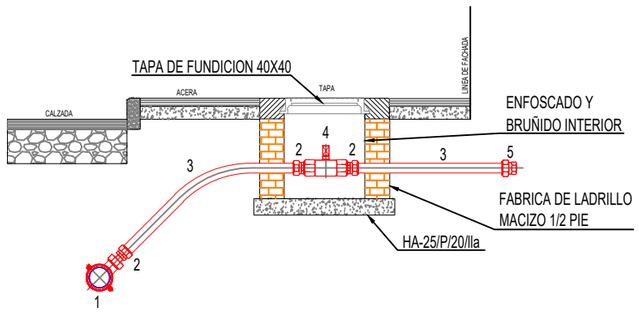

LEYENDA

1. COLLARIN TOMA FD CON SALIDA ROSCADA Ø1 1/2"
2. ENLACE LATÓN Ø80 - 1 1/2" ROSCA MACHO
3. TUBERÍA POLIETILENO Ø 80 mm. (10ATM)
4. VÁLVULA DE ESFERA (DE LATÓN) Ø1 1/2" CON EXTREMOS ROSCA HEMBRA
5. ENLACE LATÓN Ø80 - 1 1/2" ROSCA HEMBRA

VENTOSA TRIFUNCIONAL 1"

SECCION A-A'

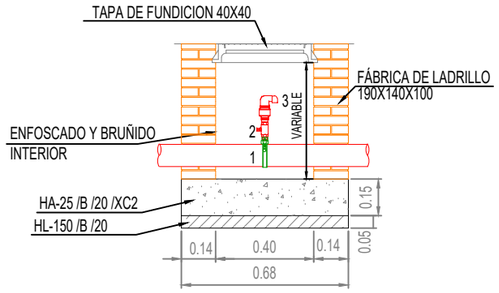

PLANTA

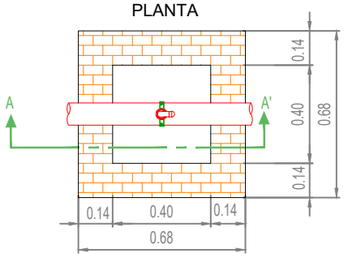

LEYENDA

1. COLLARIN TOMA PEØ90 o PEØ110 o PEØ160 CON SALIDA ROSCADA 1"
2. VÁLVULA DE BOLA 1"
3. VENTOSA TRIFUNCIONAL 1"

PORTILLA CUADRADA 40x40

ALZADO



PLANTA



TRAPILLÓN

SECCIÓN



PLANTA



DESAGÜE

SECCION A-A'

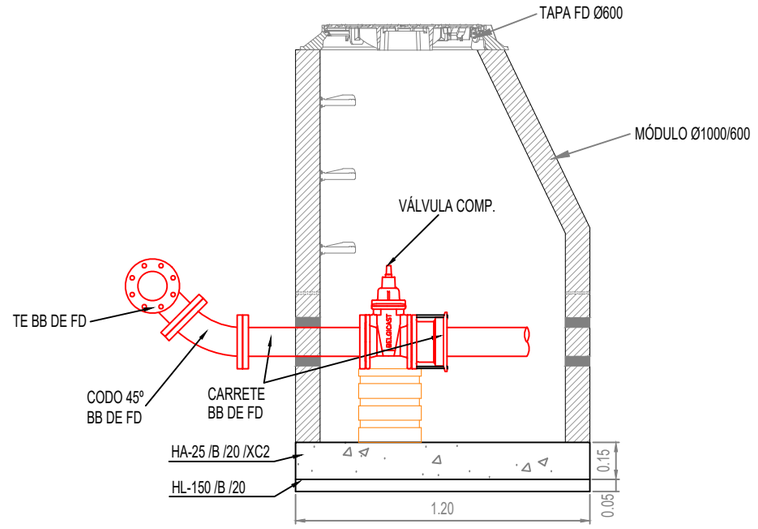

PLANTA

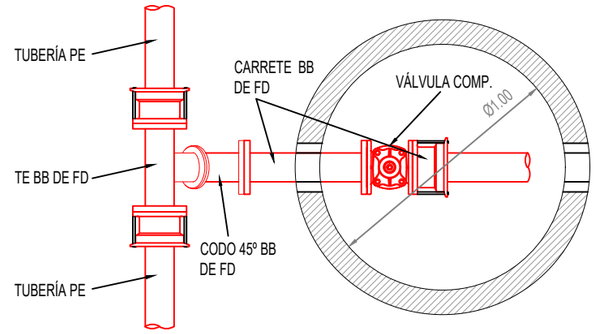

TAPA Ø600





MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:25	DETALLES	16.1
	ORIGINAL A-3		HOJA 1 DE 2

TIPO 1

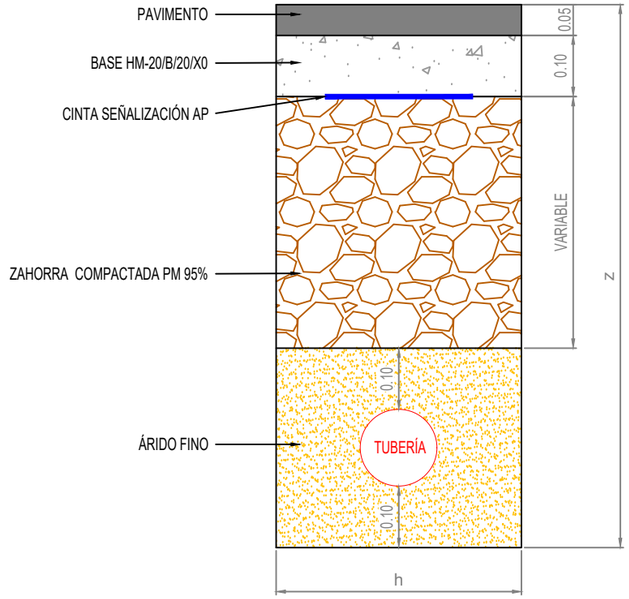

TIPO 2

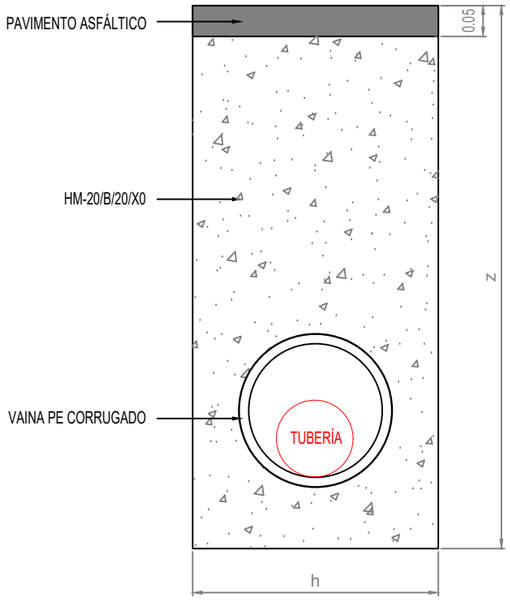

TIPO 3

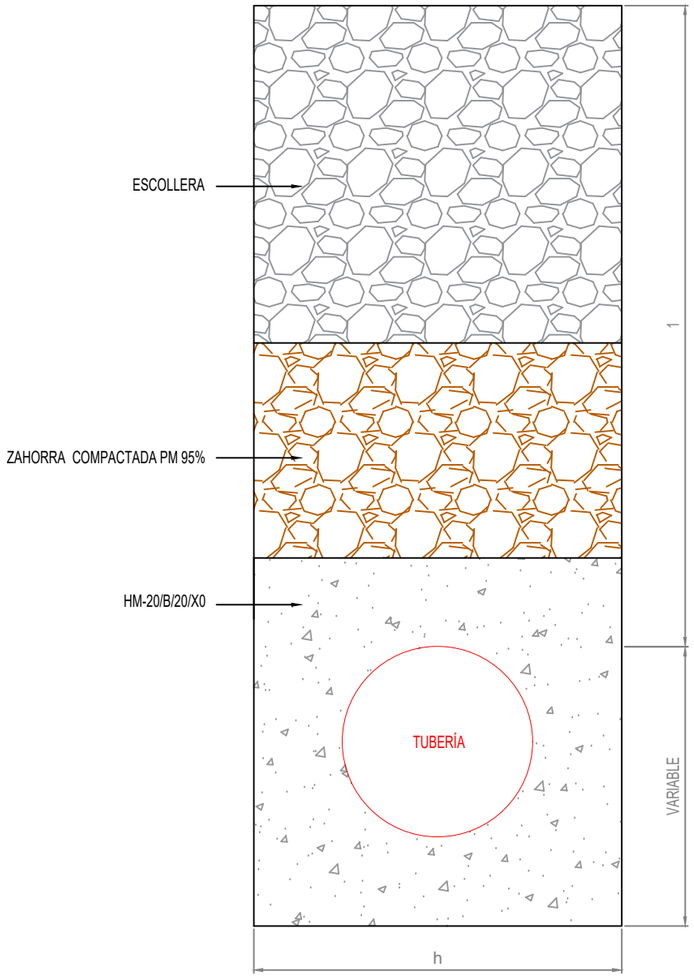

TABLA

DIÁMETRO	ANCHO (h)	PROFUNDIDAD (z)
75<Ø<100	0.40 m	1.00 m
150<Ø<400	0.60 m	1.20 m

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA: JULIO 2025

ESCALA: 1:10 ORIGINAL A-3

TÍTULO DEL PLANO: DETALLES. ZANJAS TIPO

Nº PLANO: 16.2 HOJA 2 DE 2

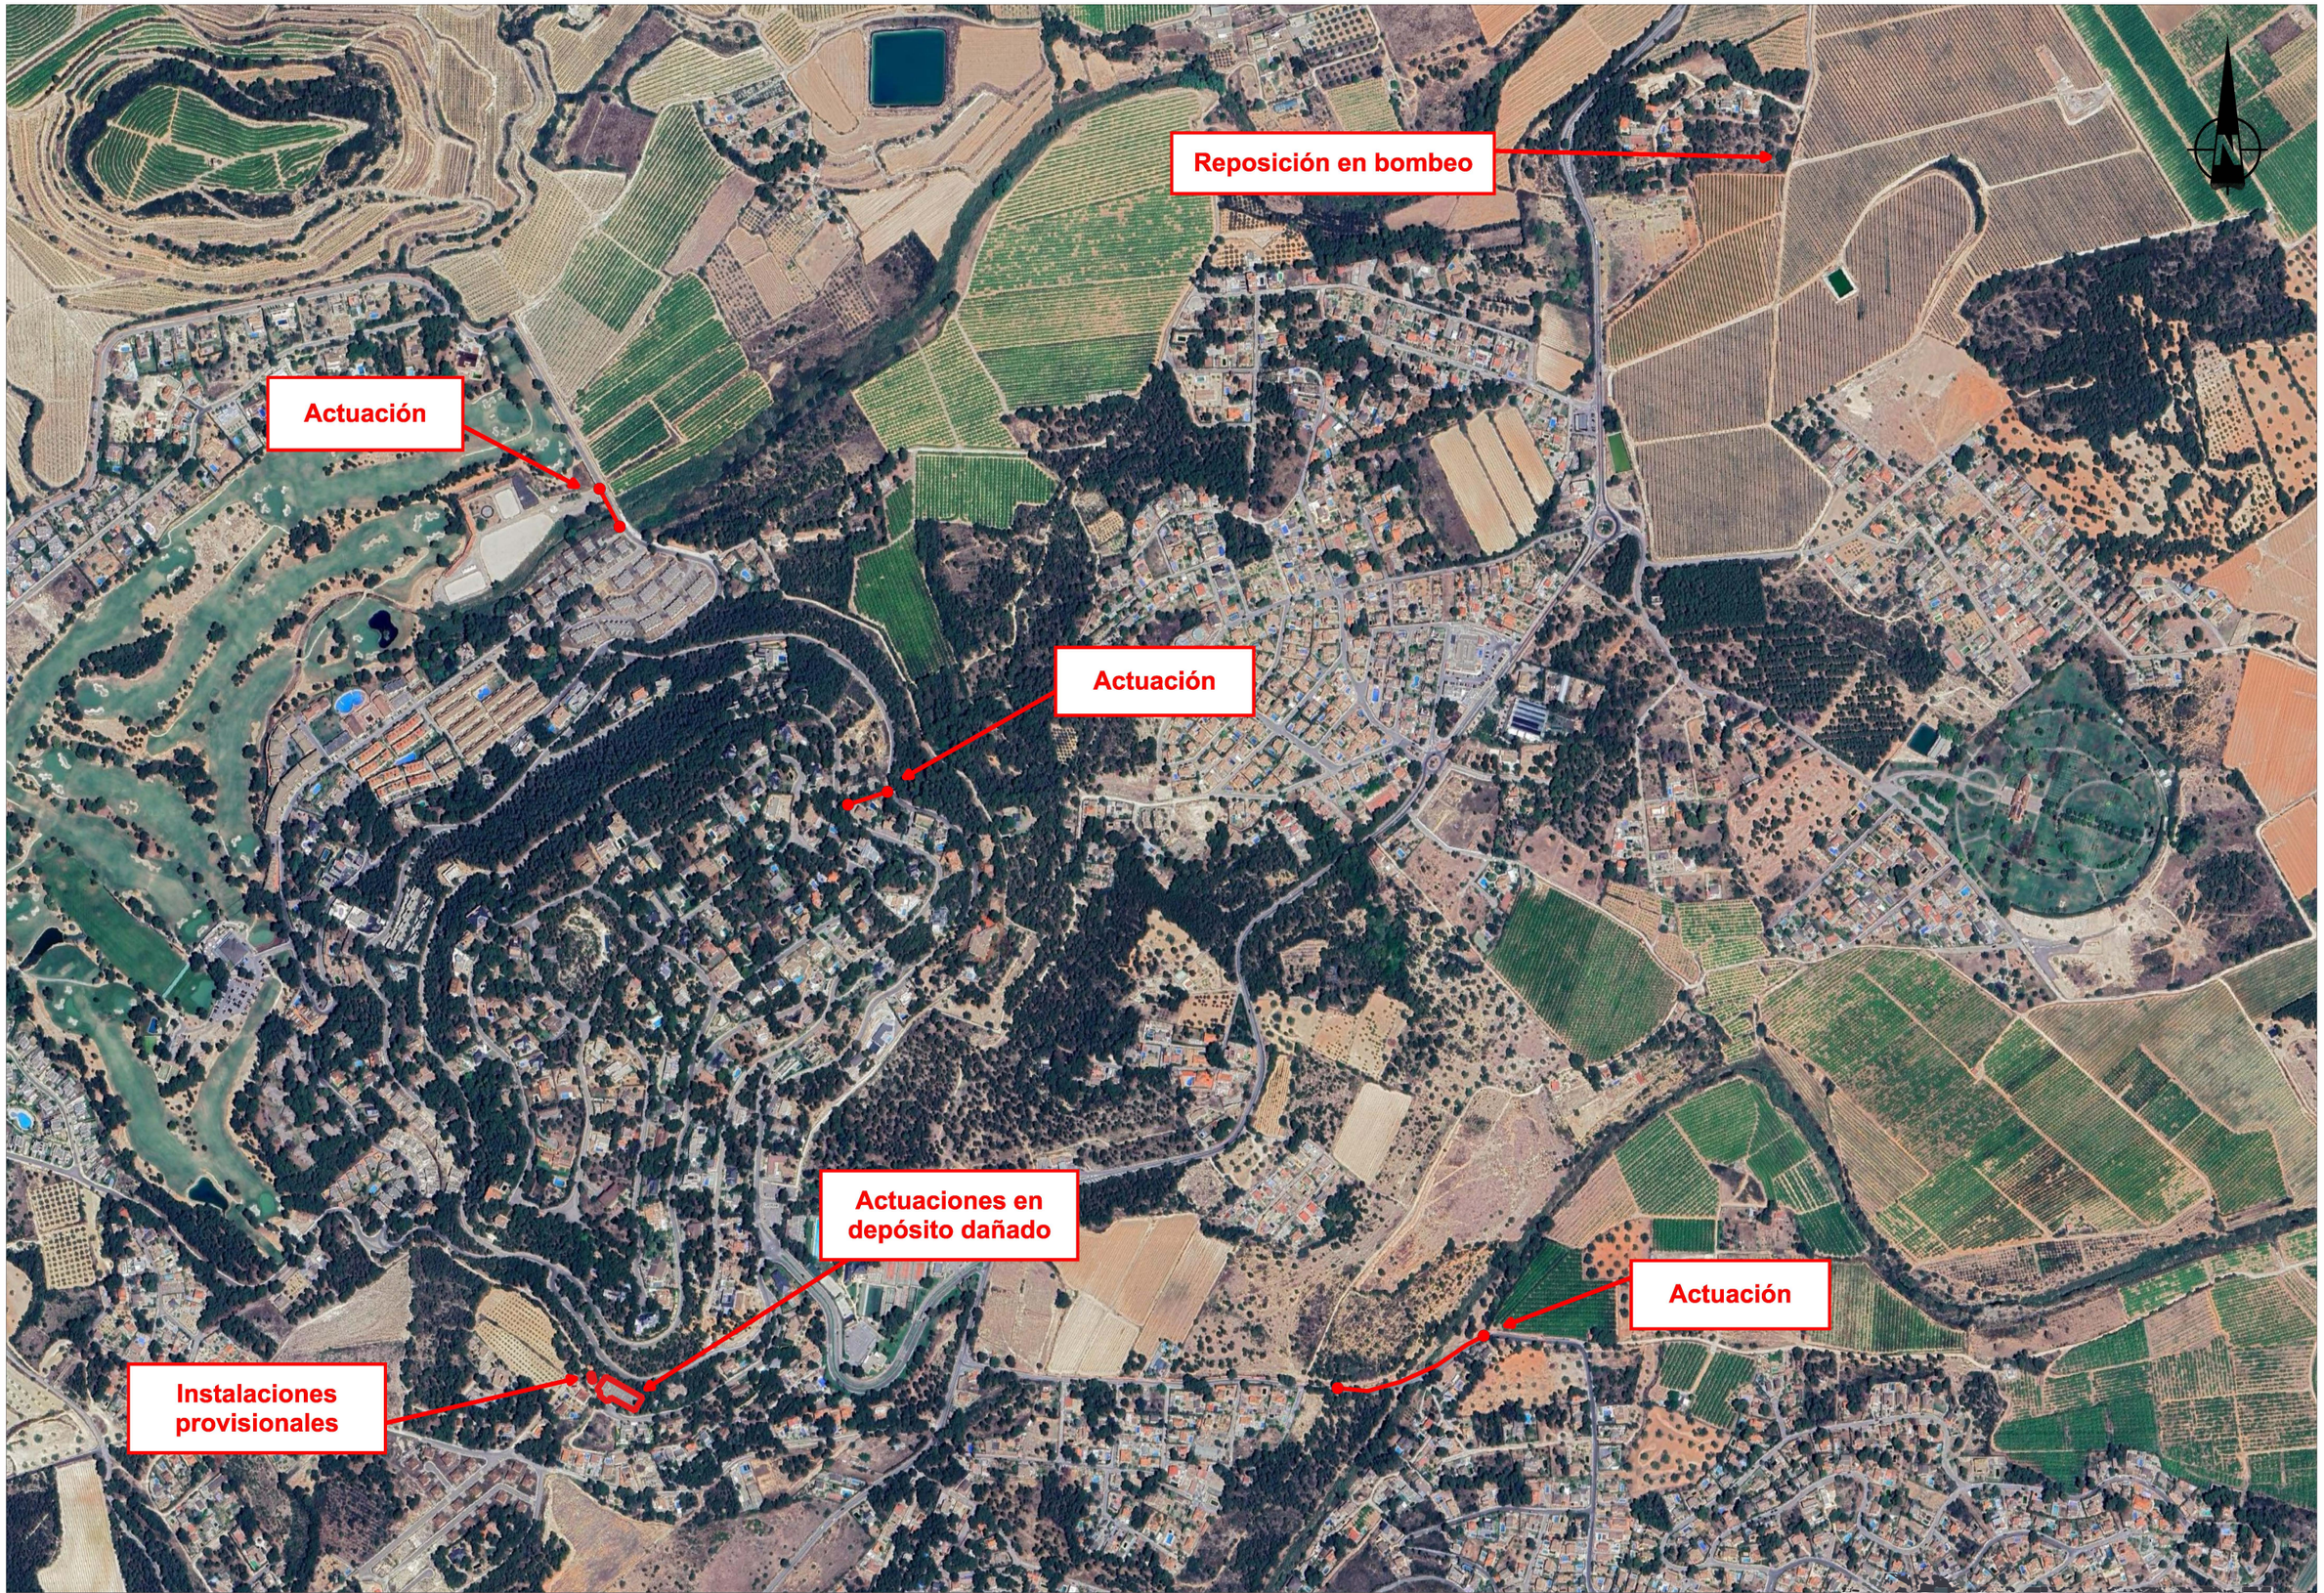

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA	ESCALA	TITULO DEL PLANO	PLANO Nº
JULIO 2025	1:1.250 ORIGINAL DIN A3	CHIVA ACTUACIONES ABASTECIMIENTO HIDRAQUA	17

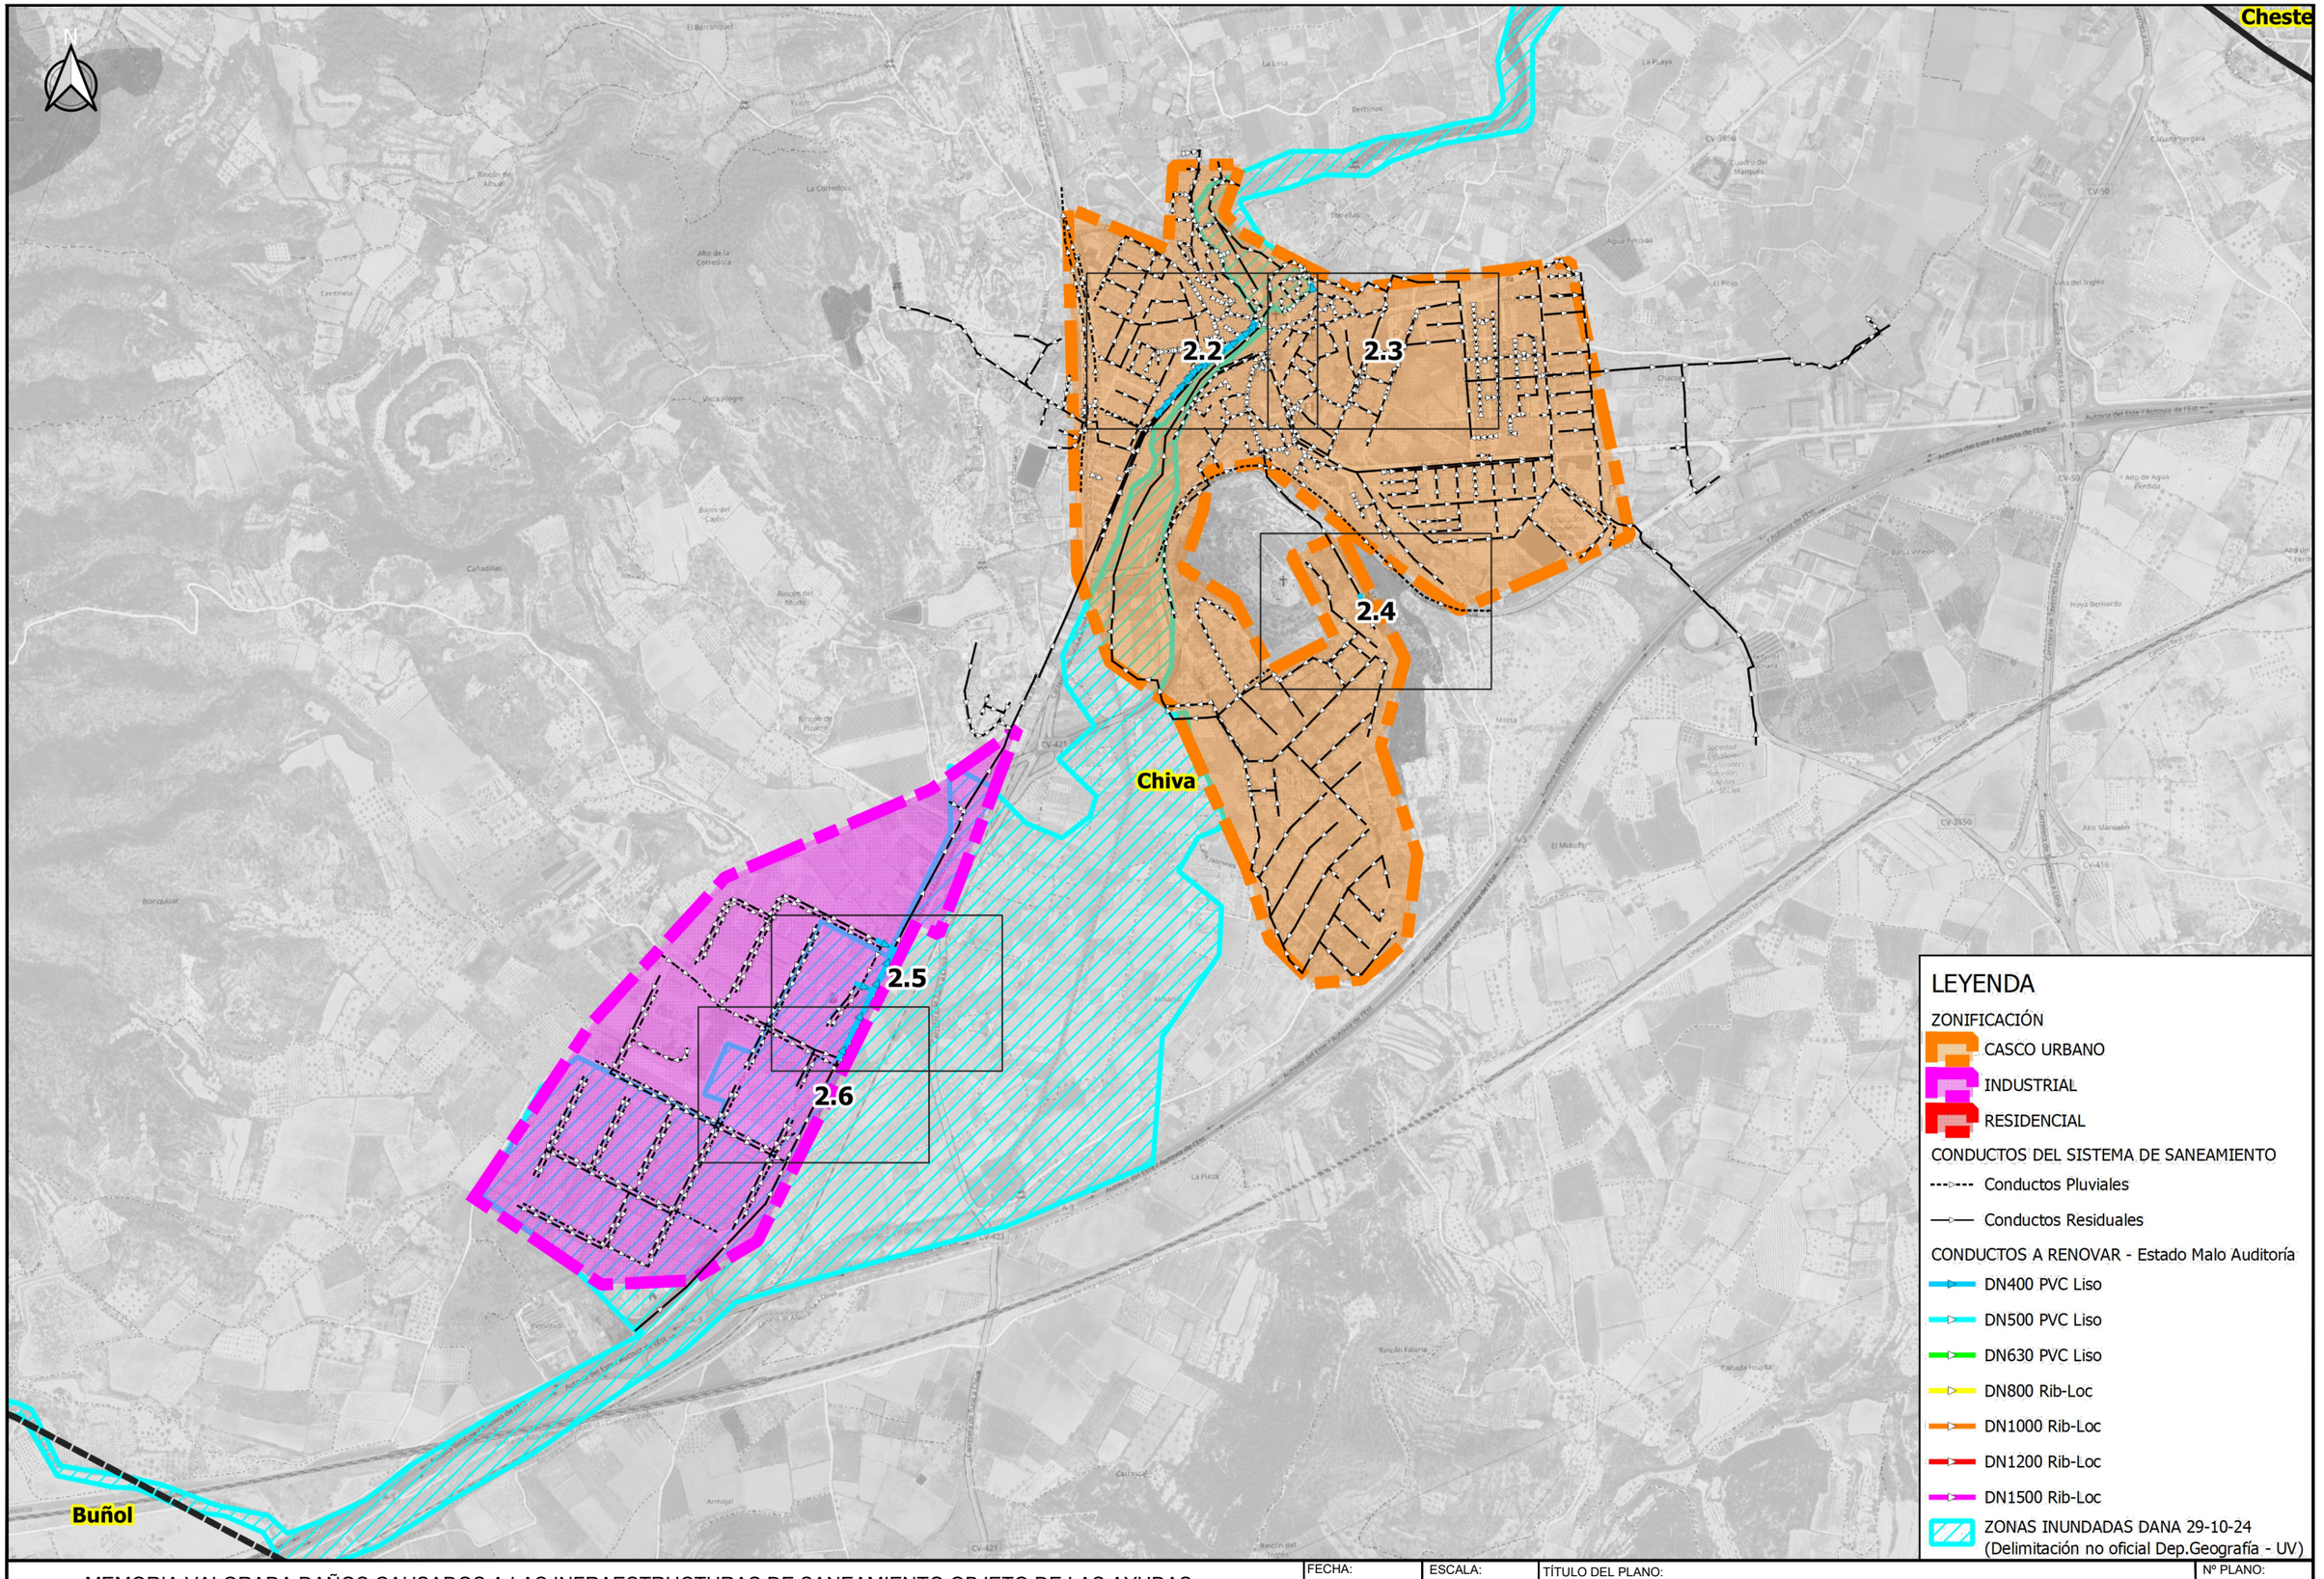

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:15.000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	18.1

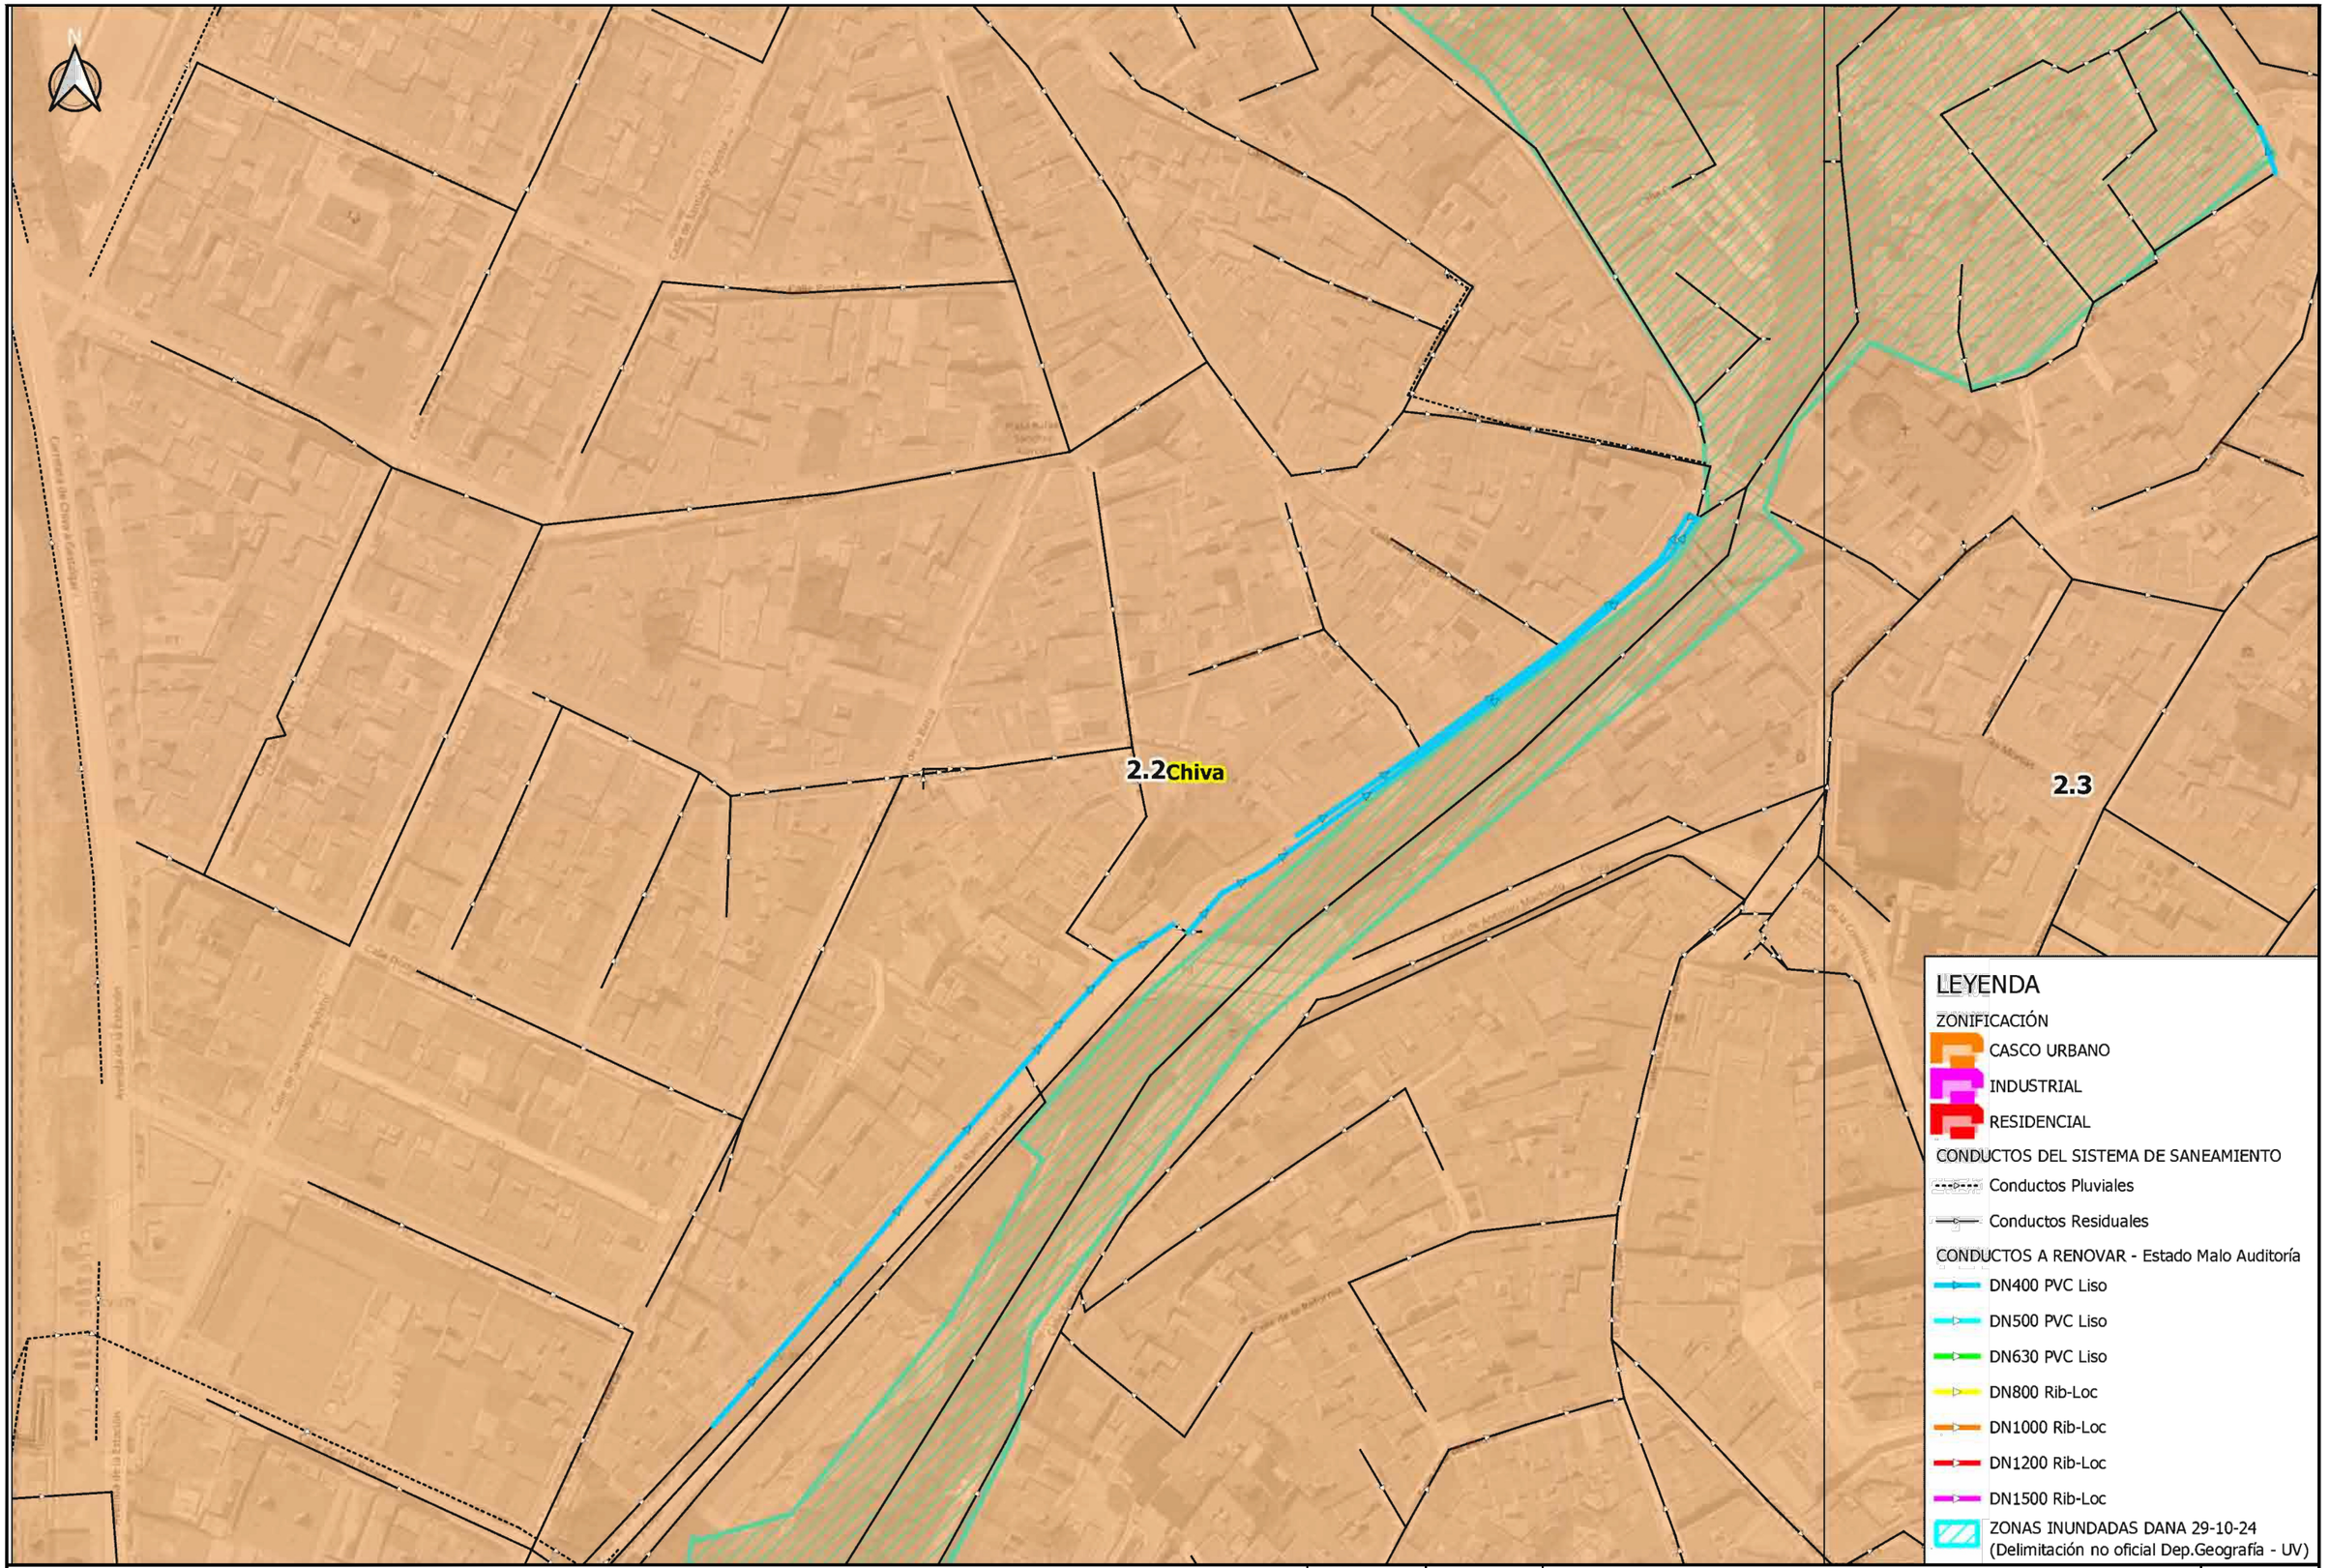

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1.500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	18.2

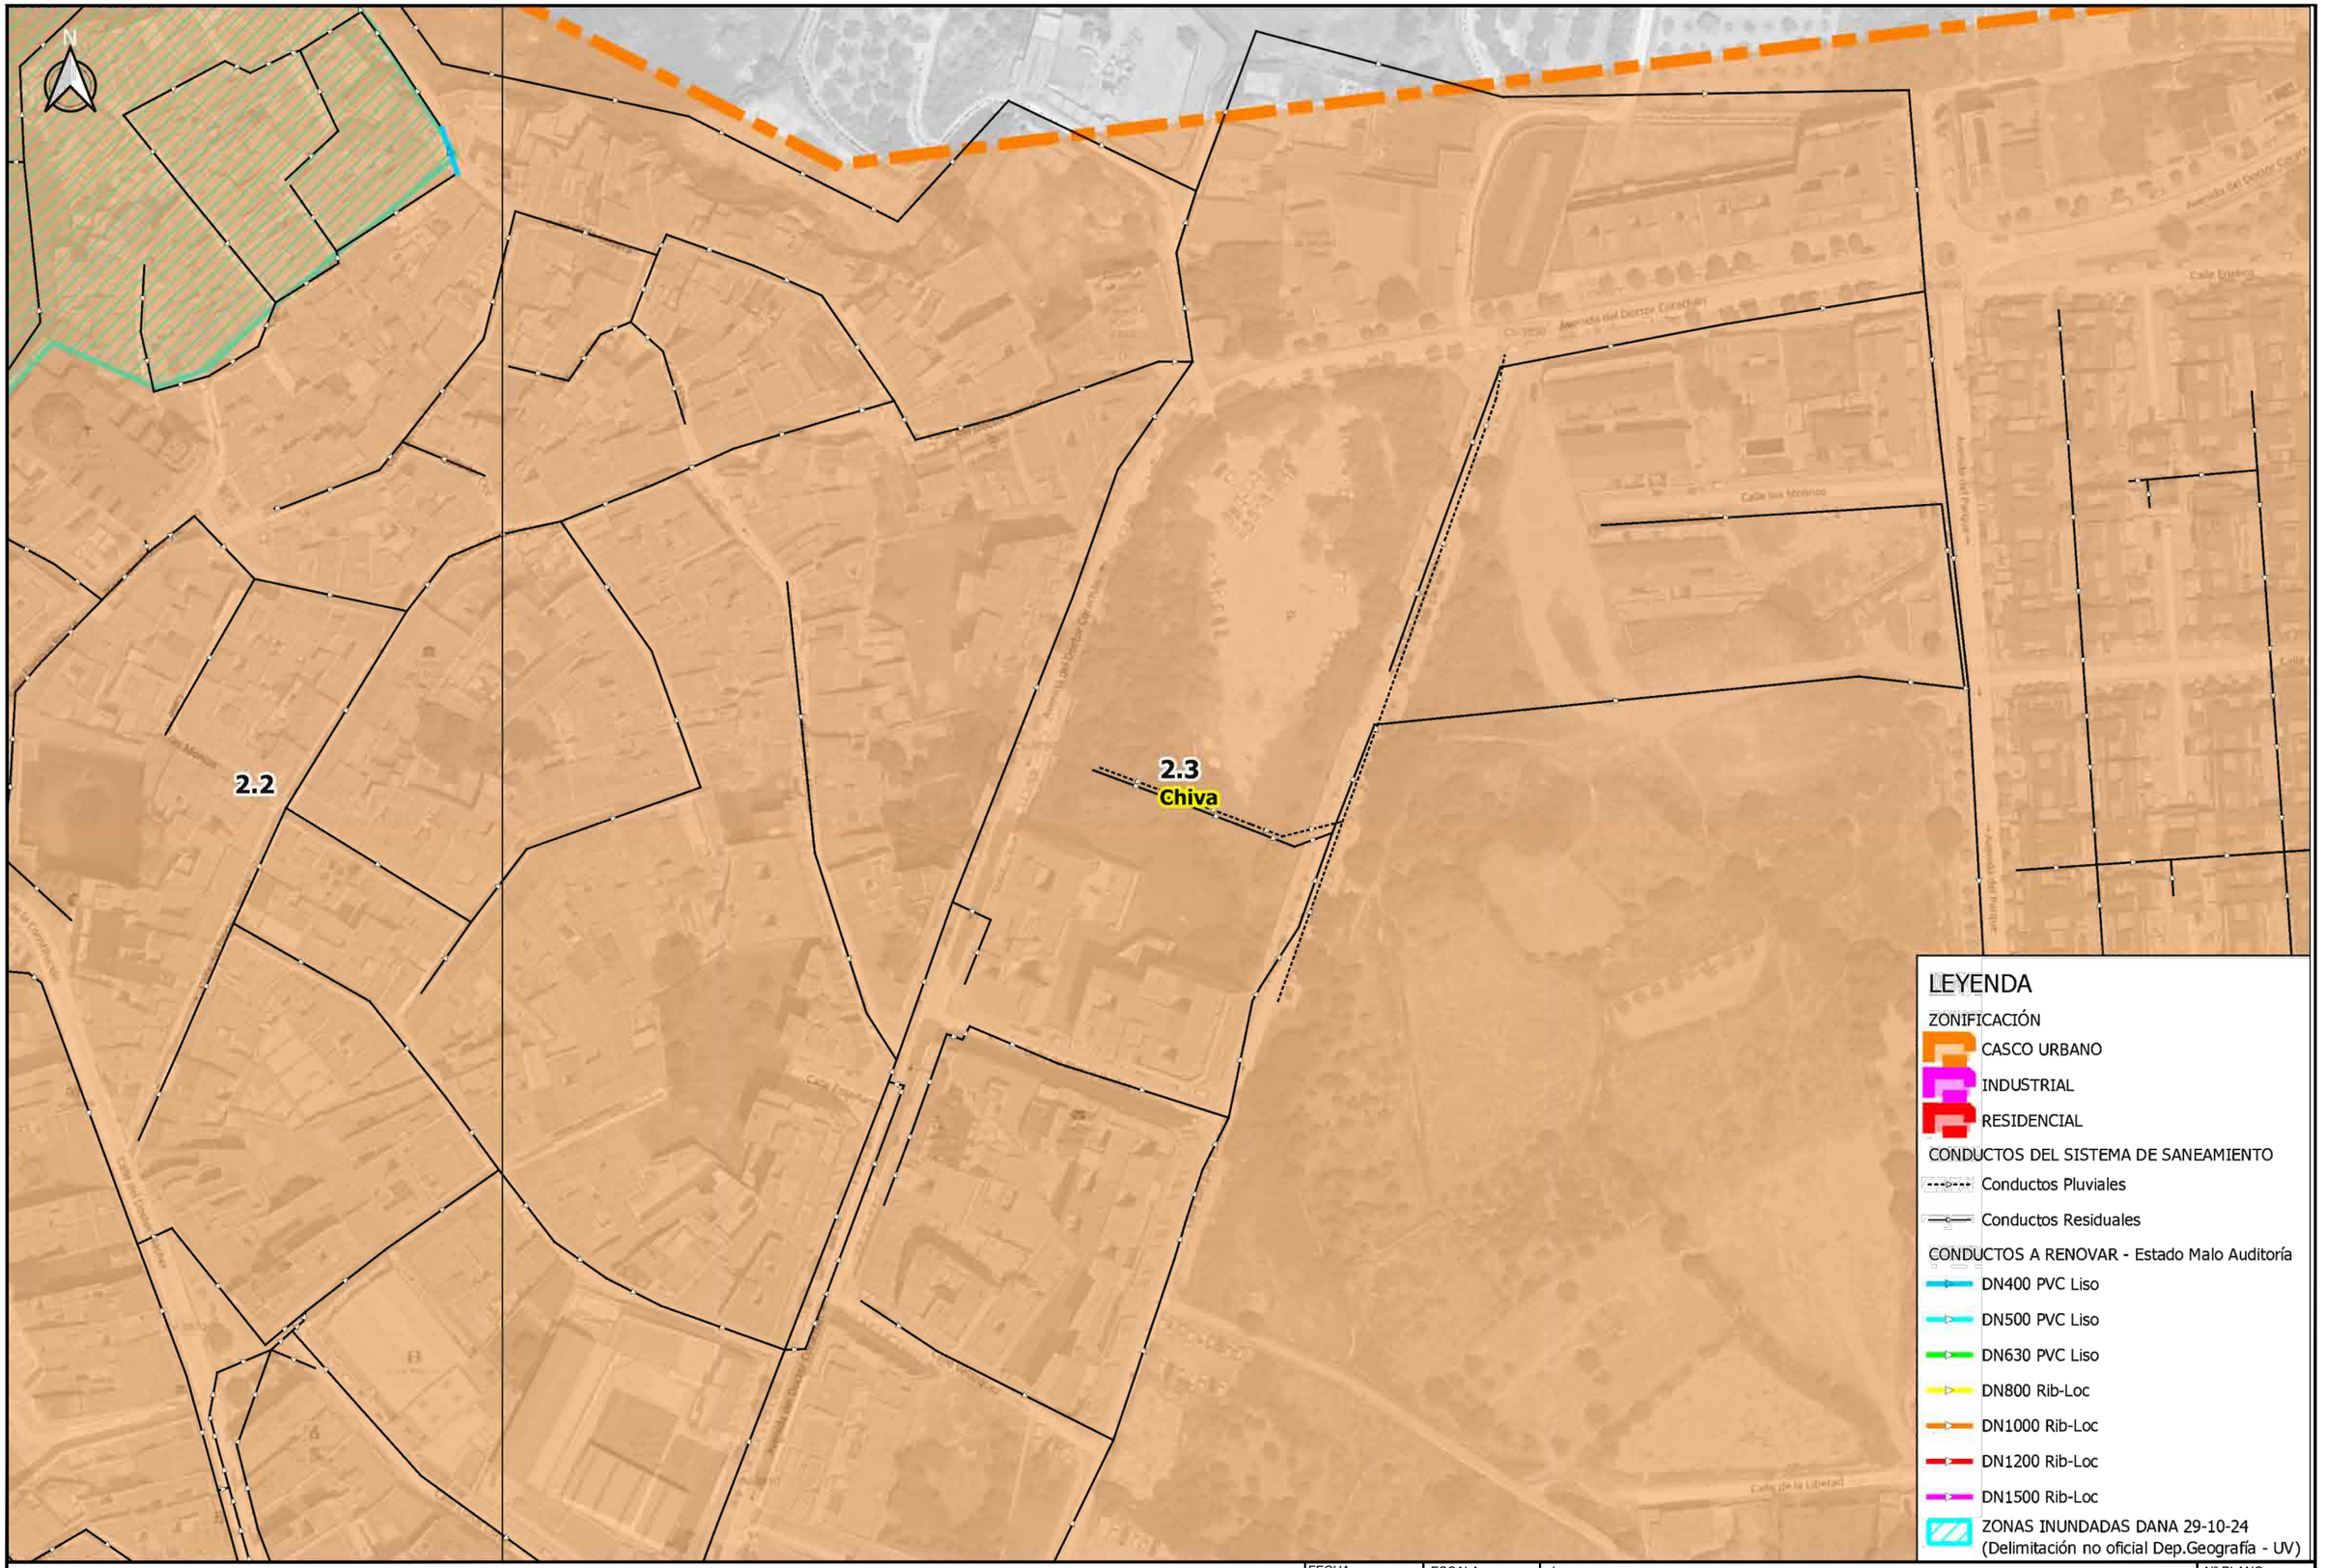

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1.500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	18.3

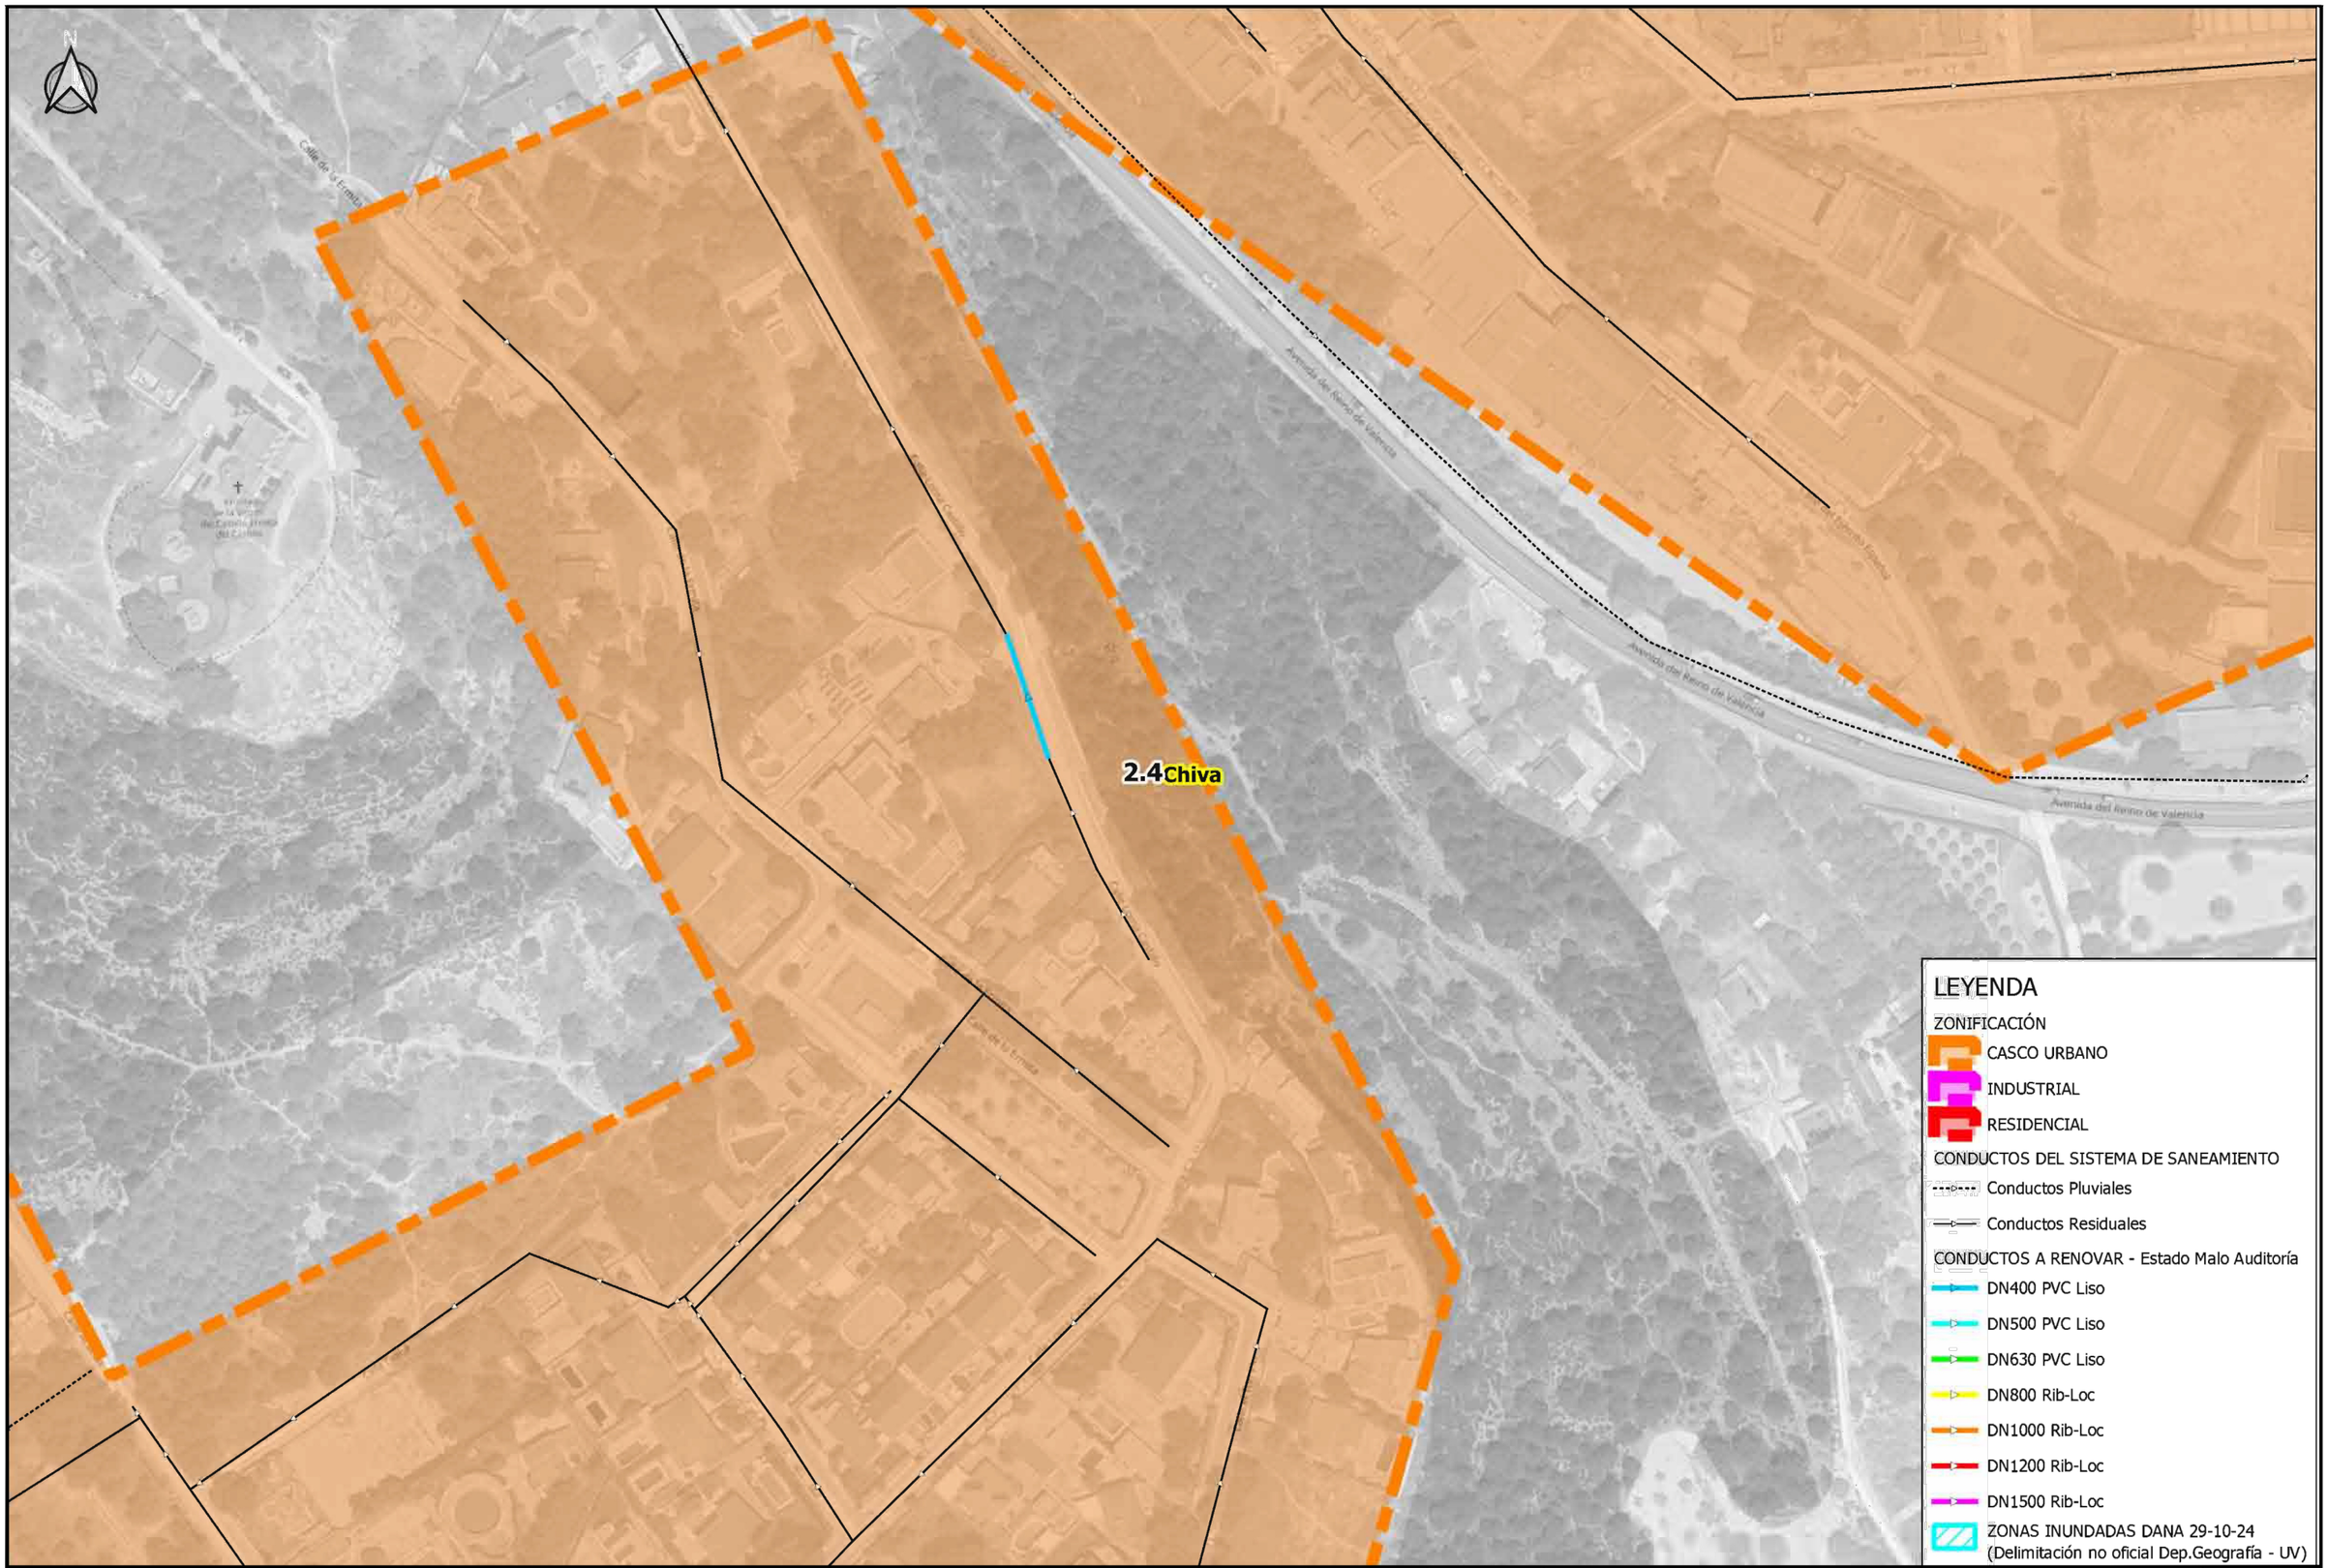

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1.500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	18.4

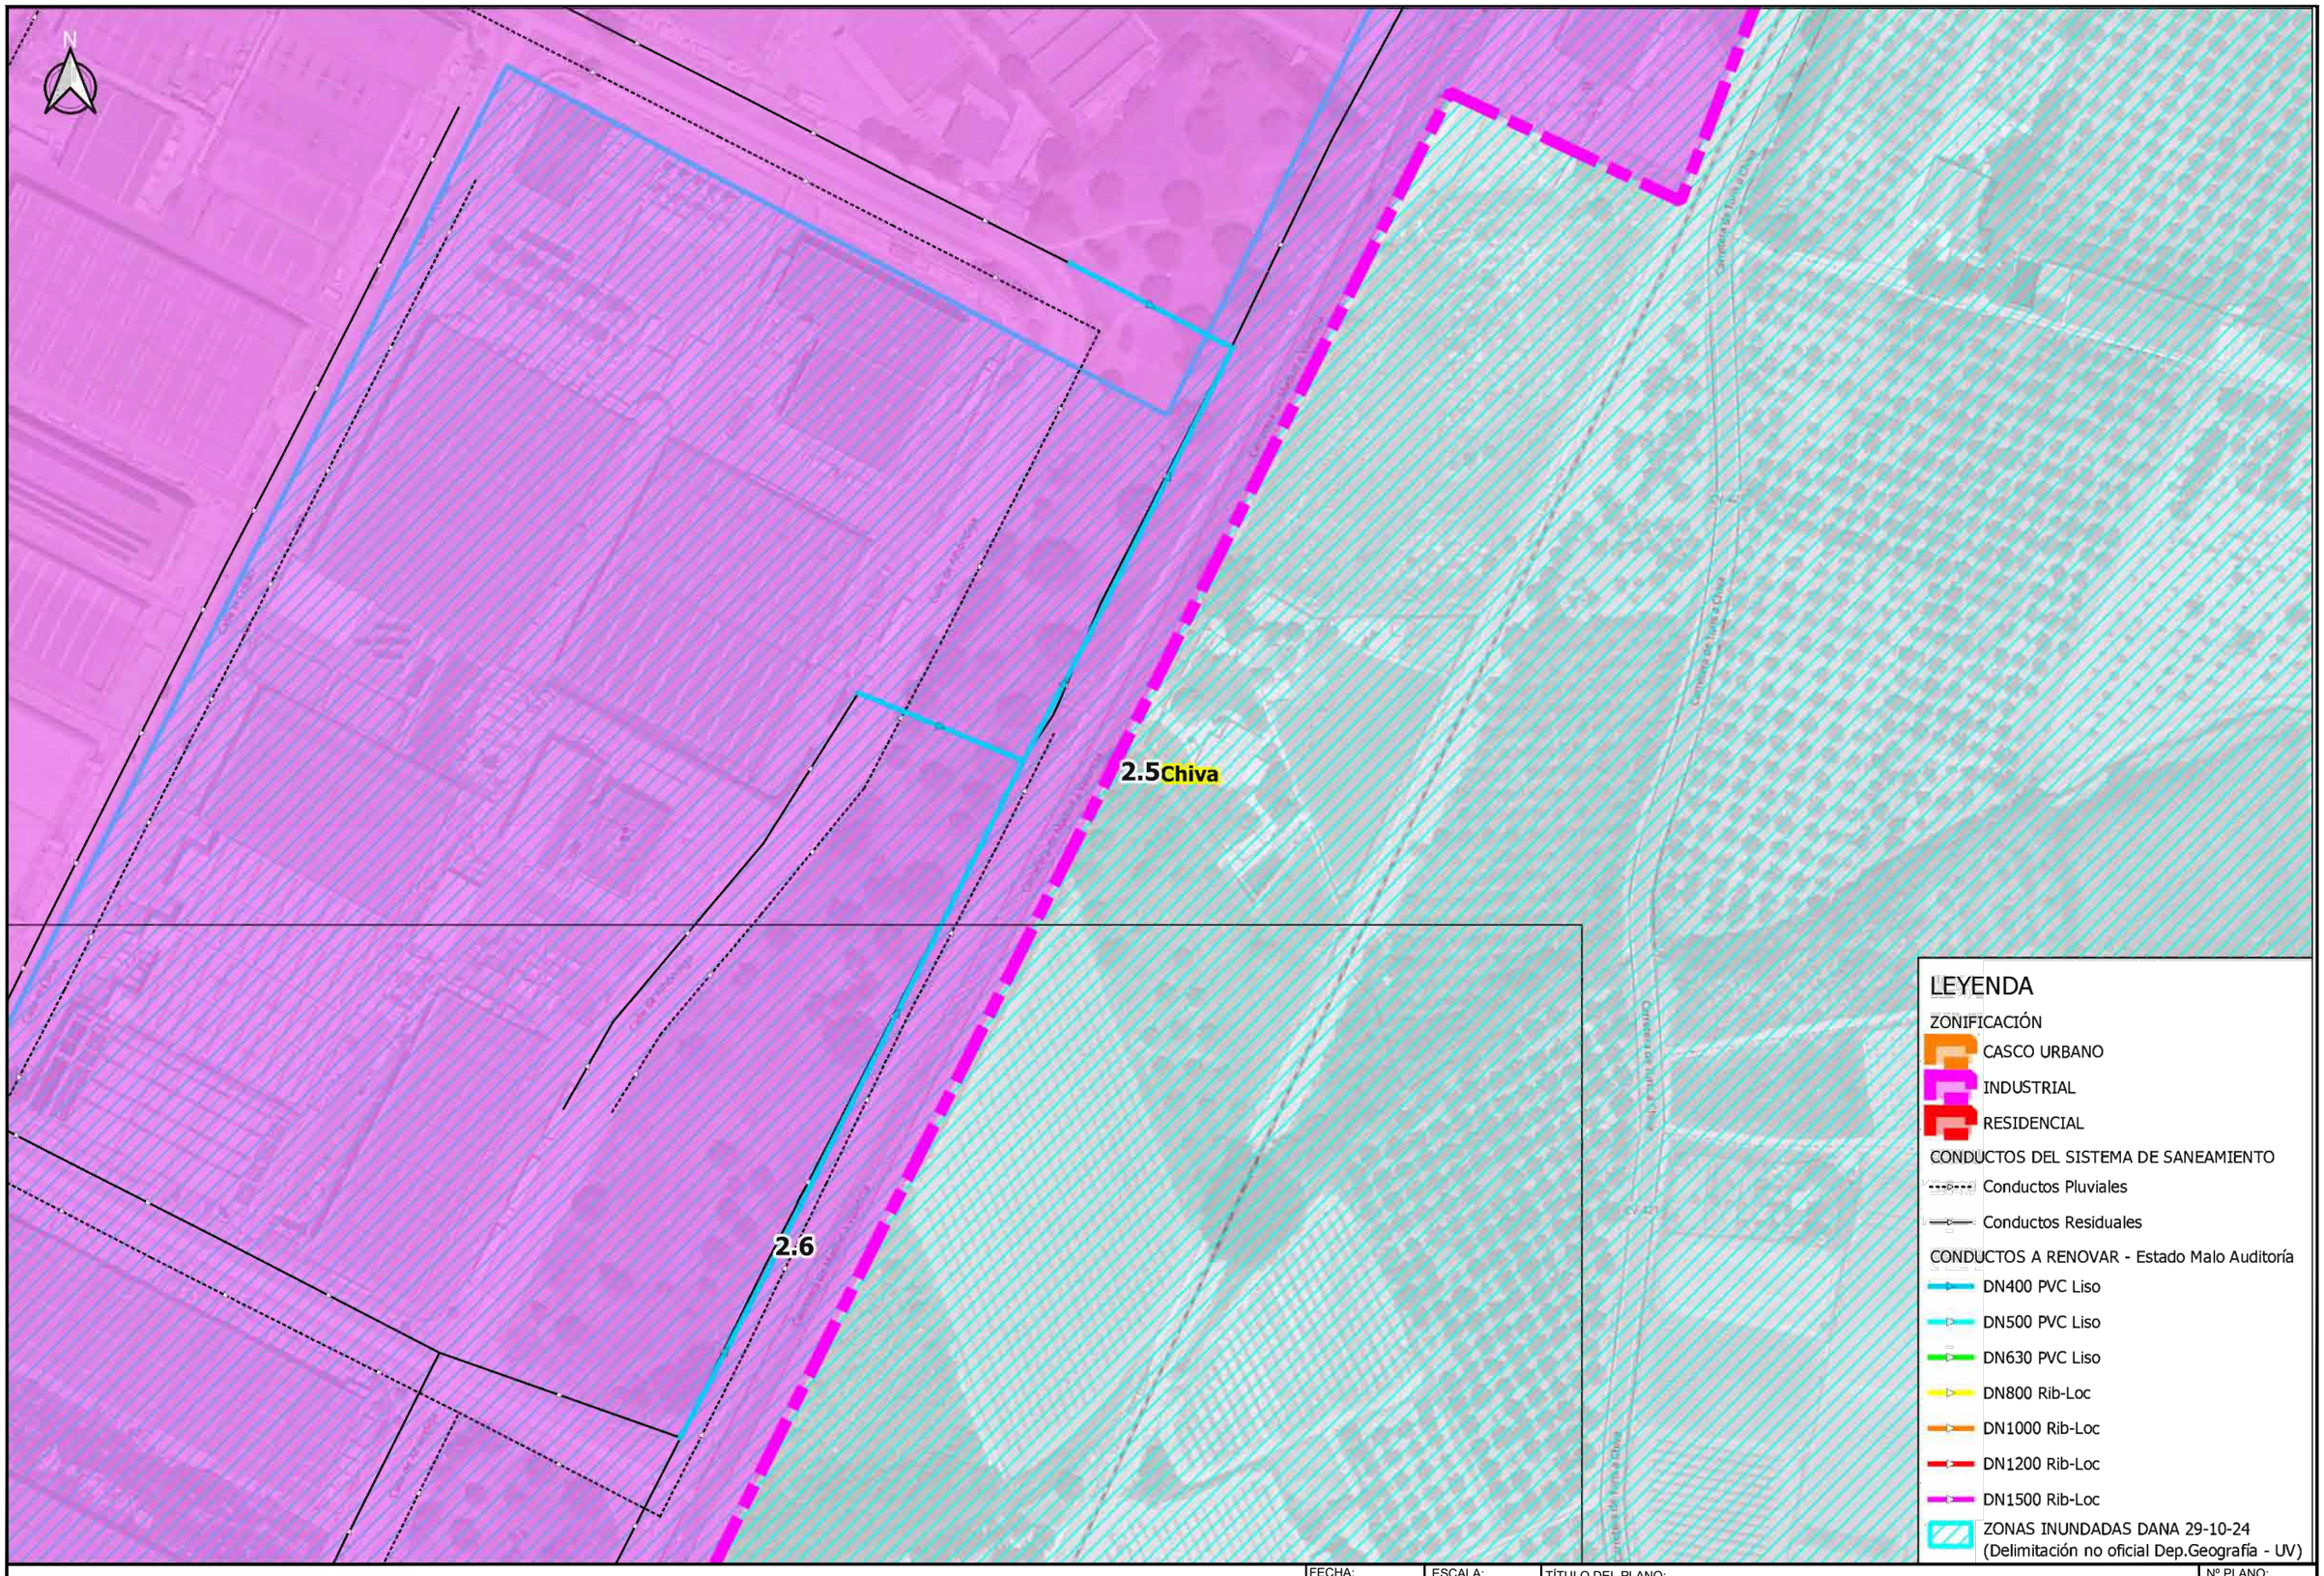

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1.500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	18.5

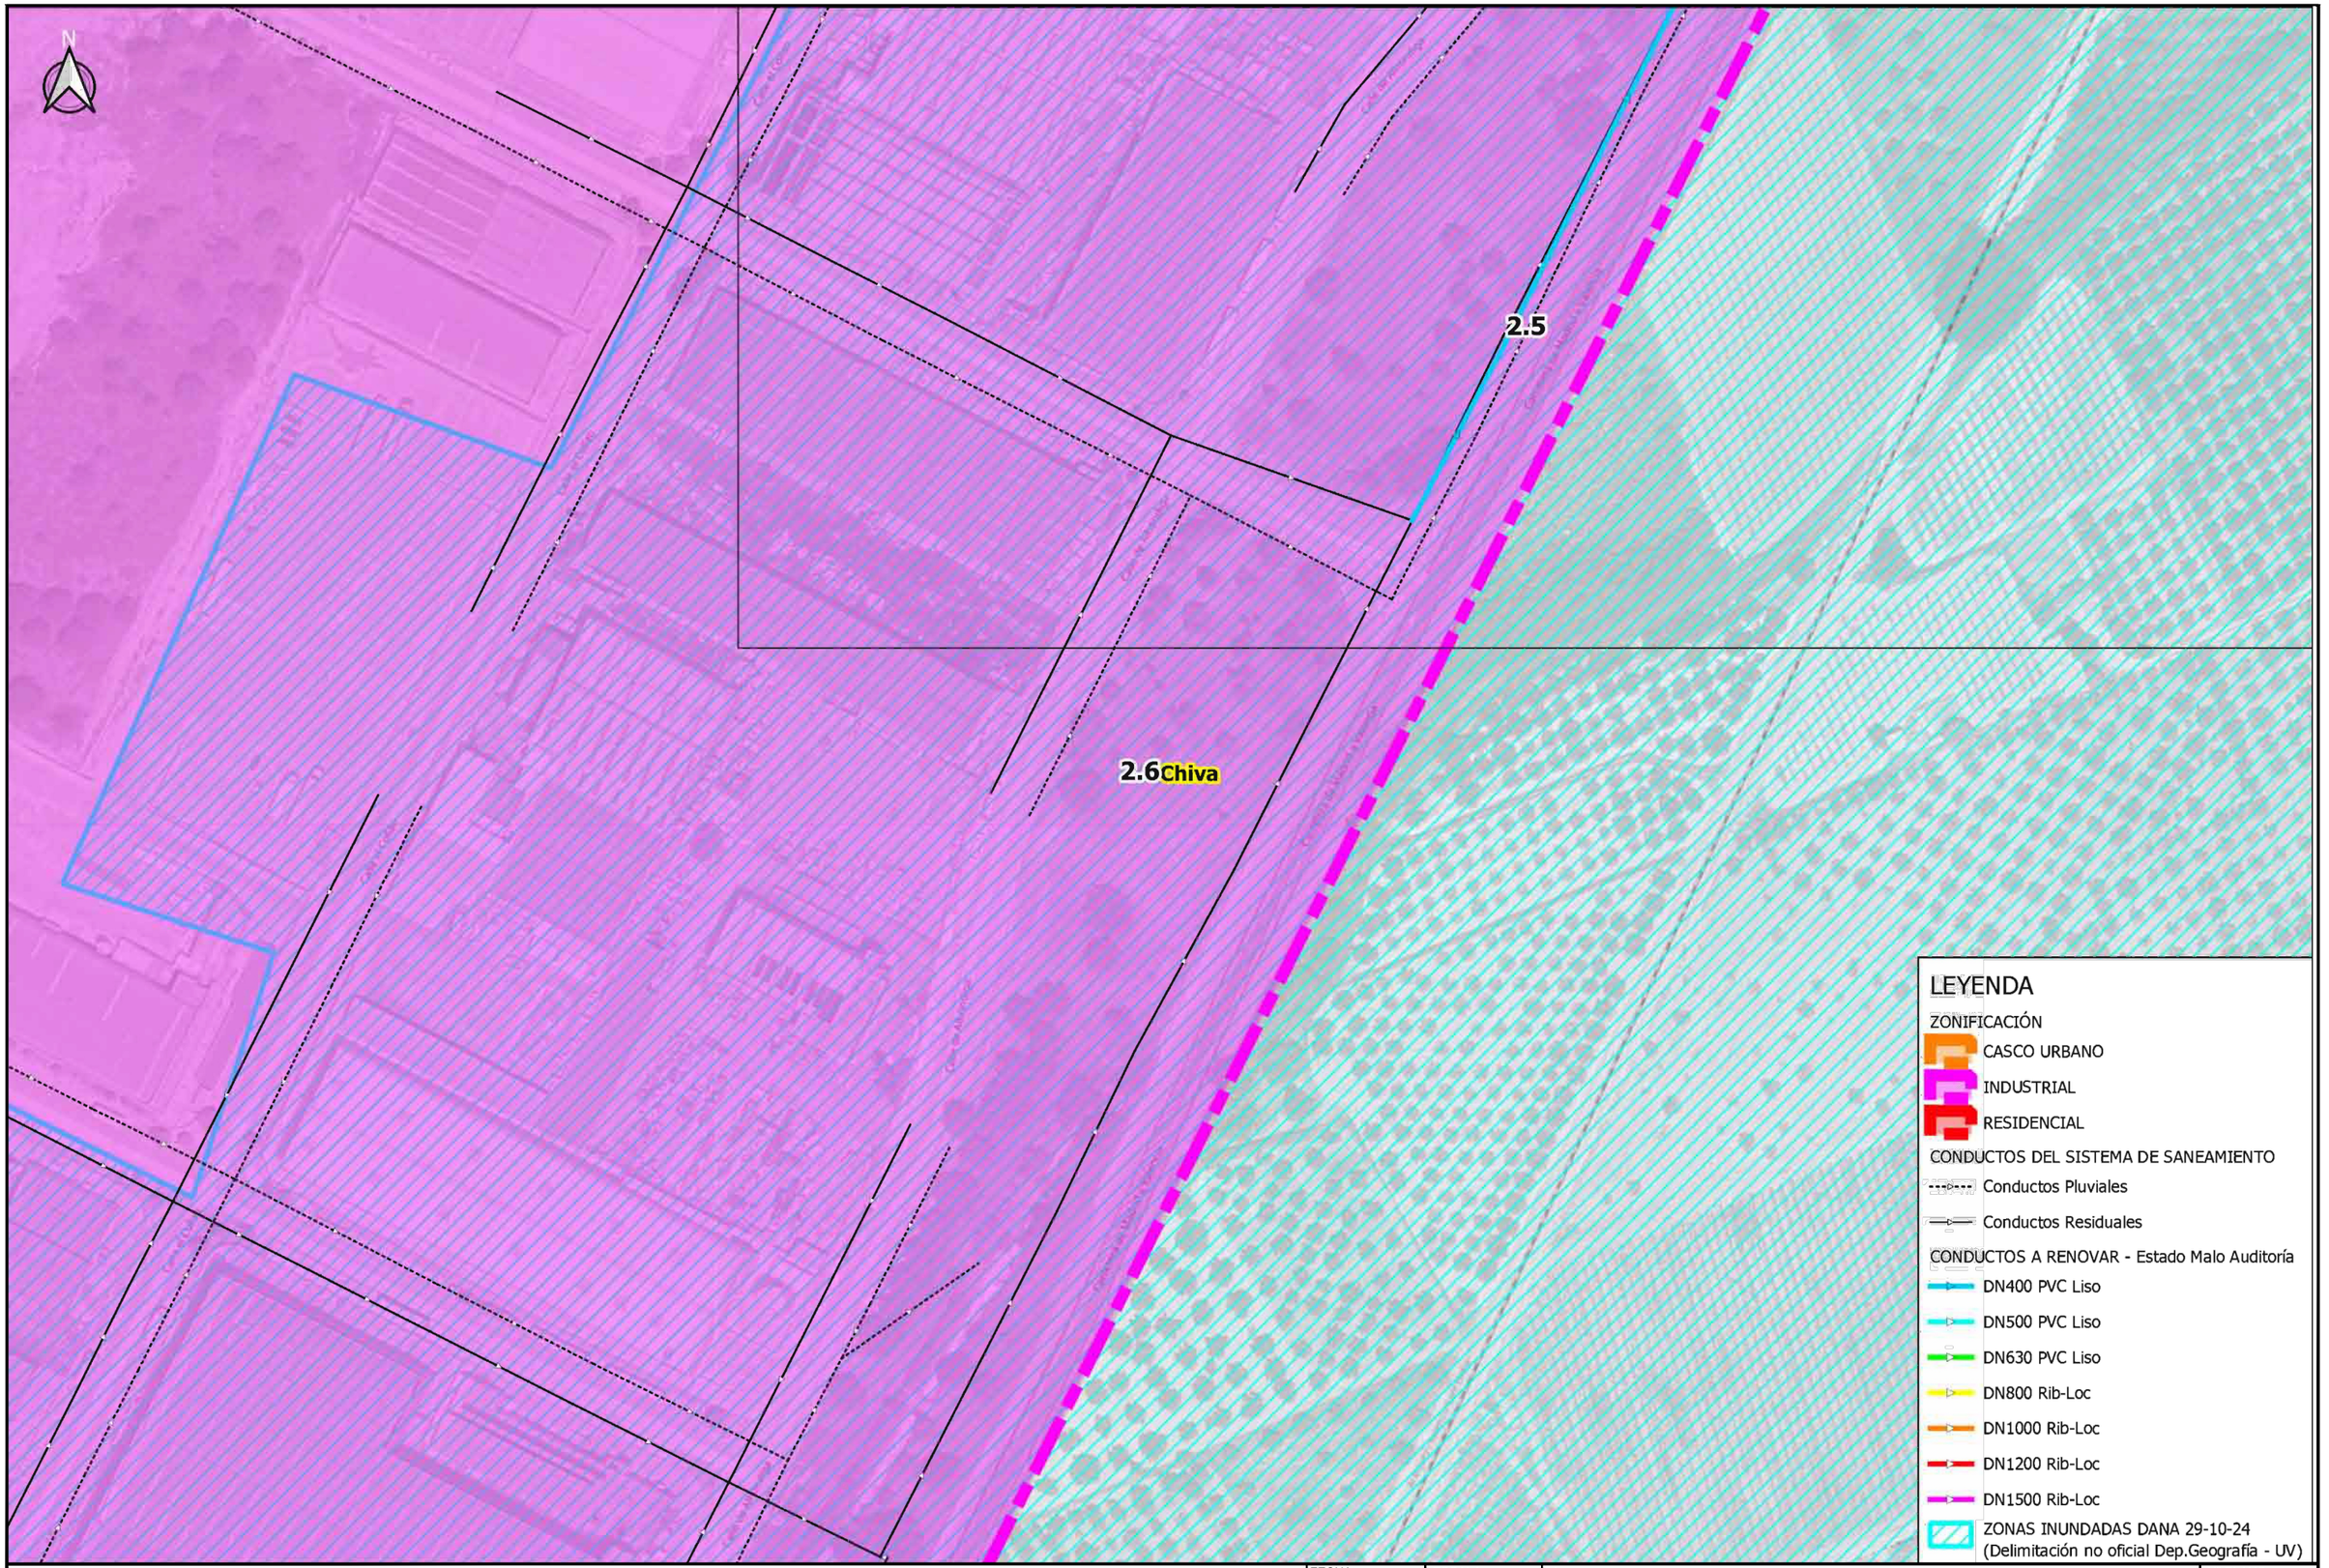

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:1.500 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	18.6

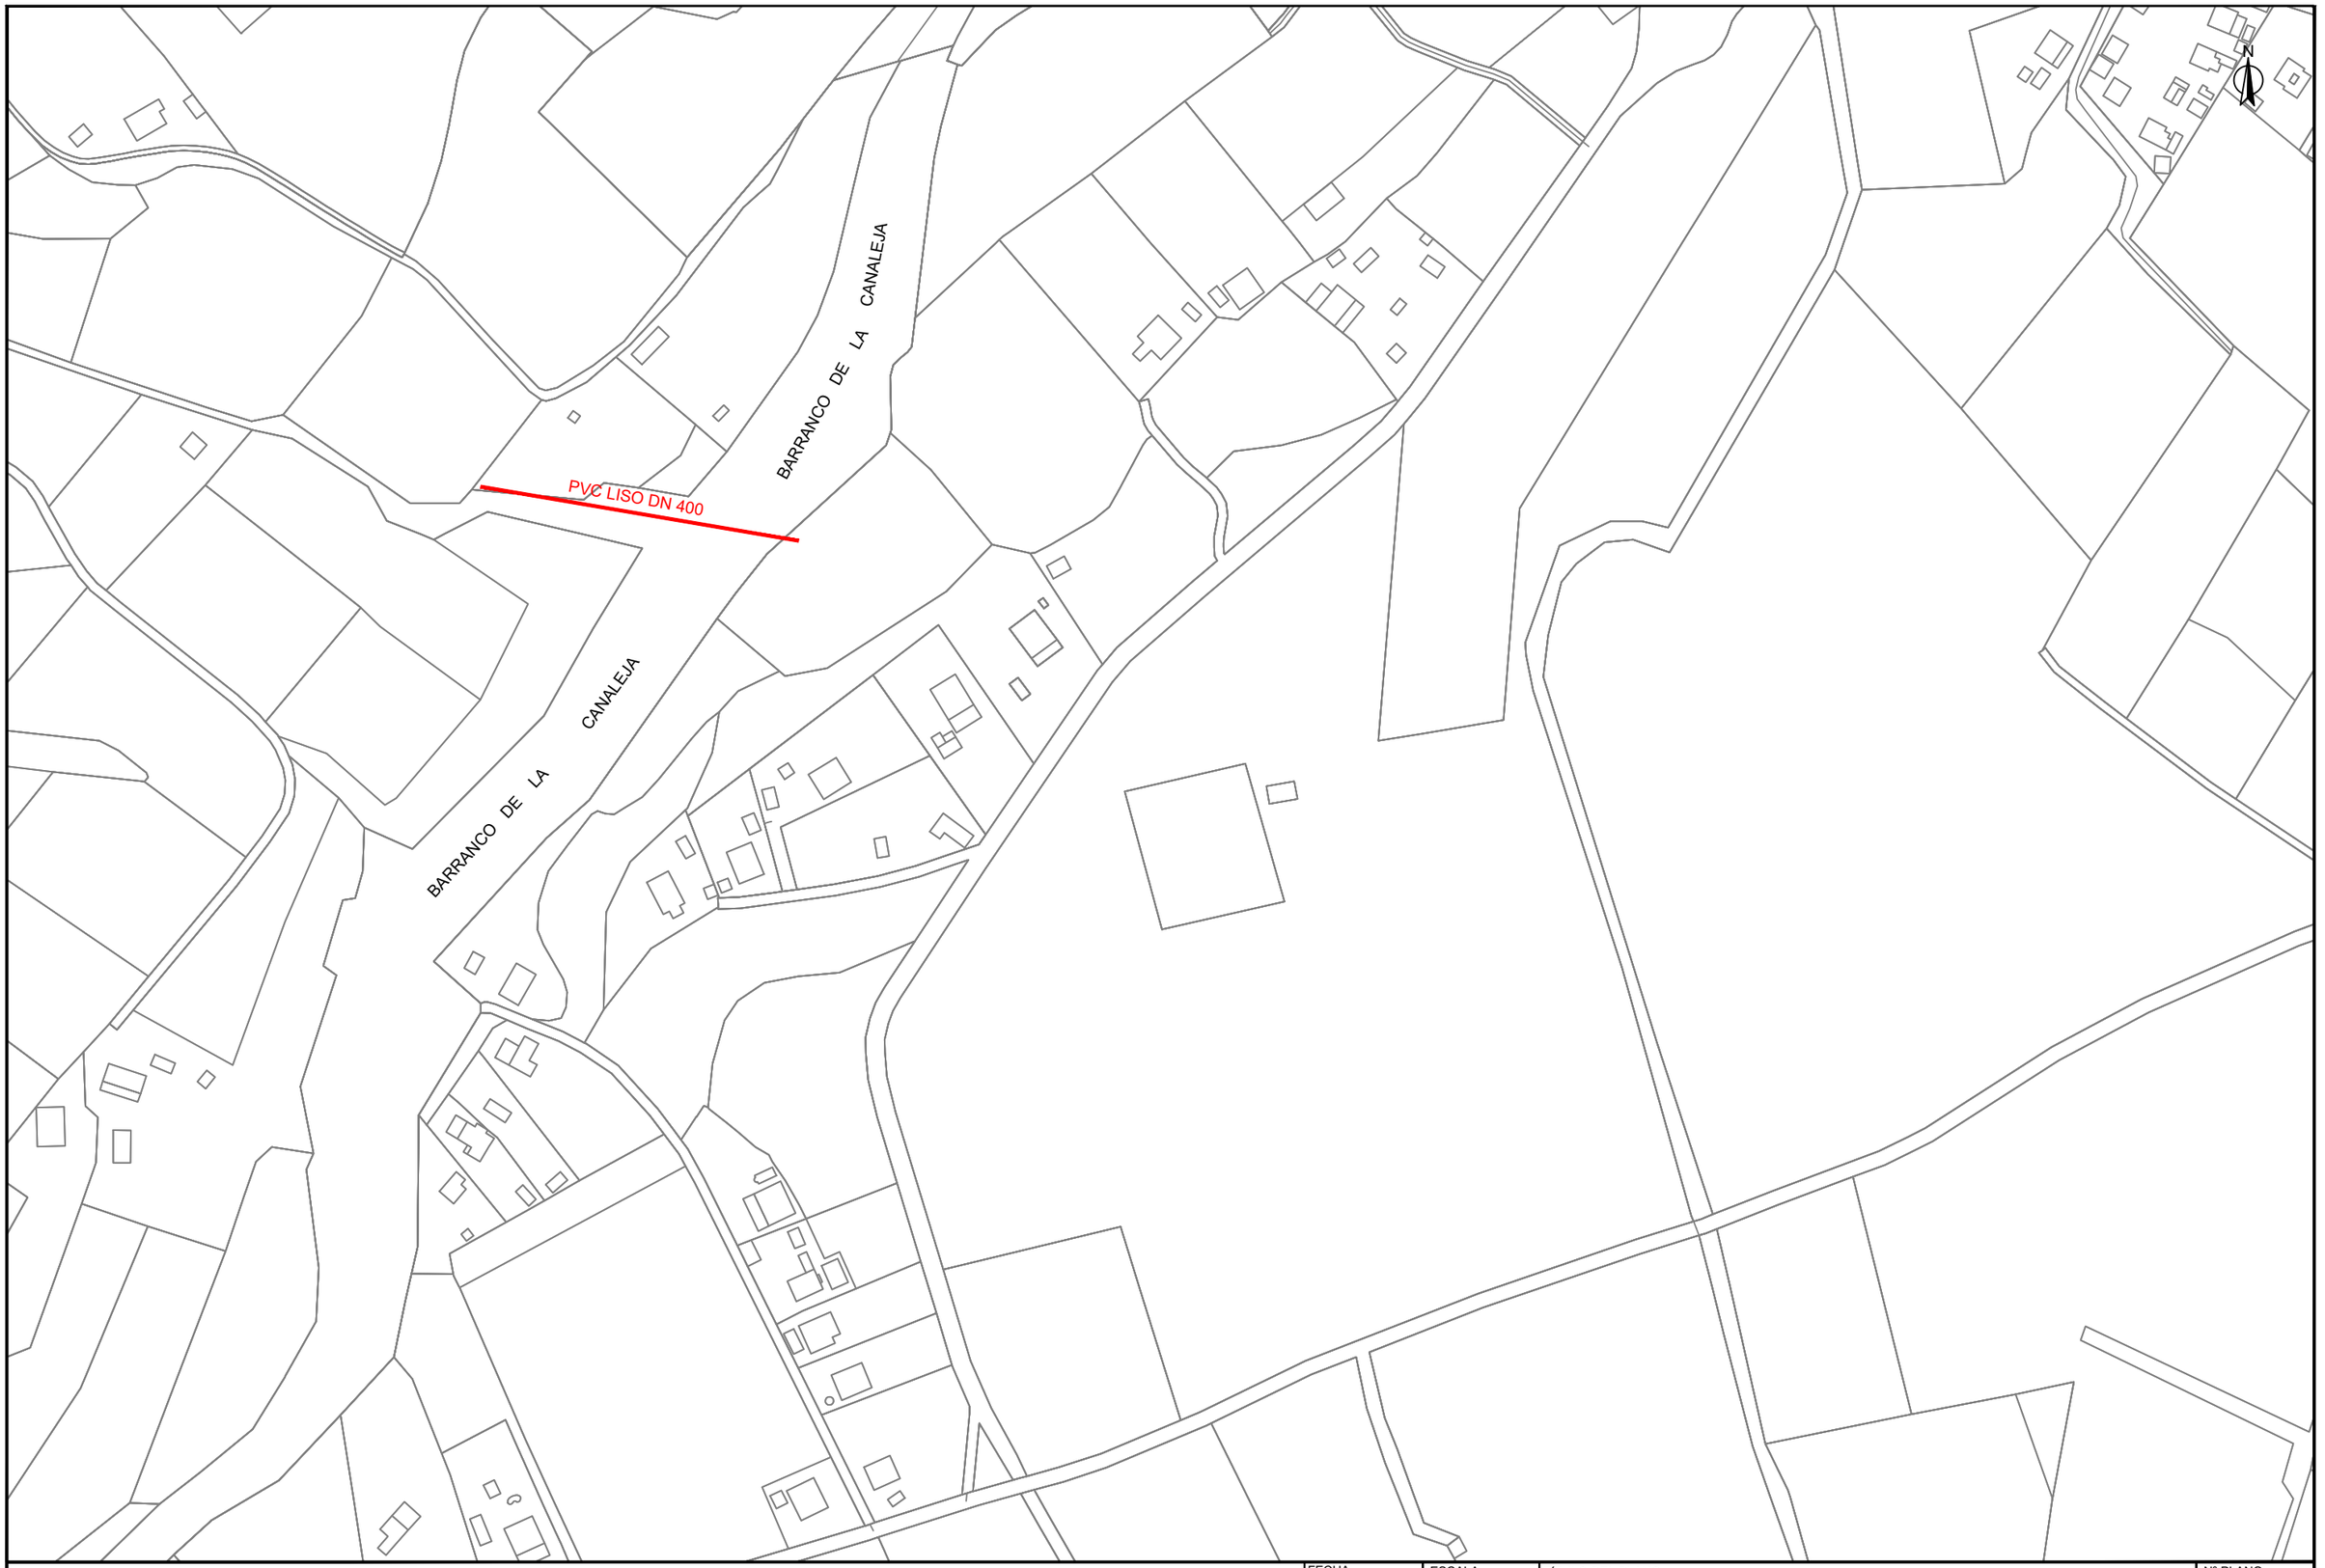

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº PLANO:
JULIO 2025	1:5000 ORIGINAL A-3	PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES	19

TUBERÍA PVC LISO PARED COMPACTA SN 4 CON PROTECCIÓN ESCOLLERA

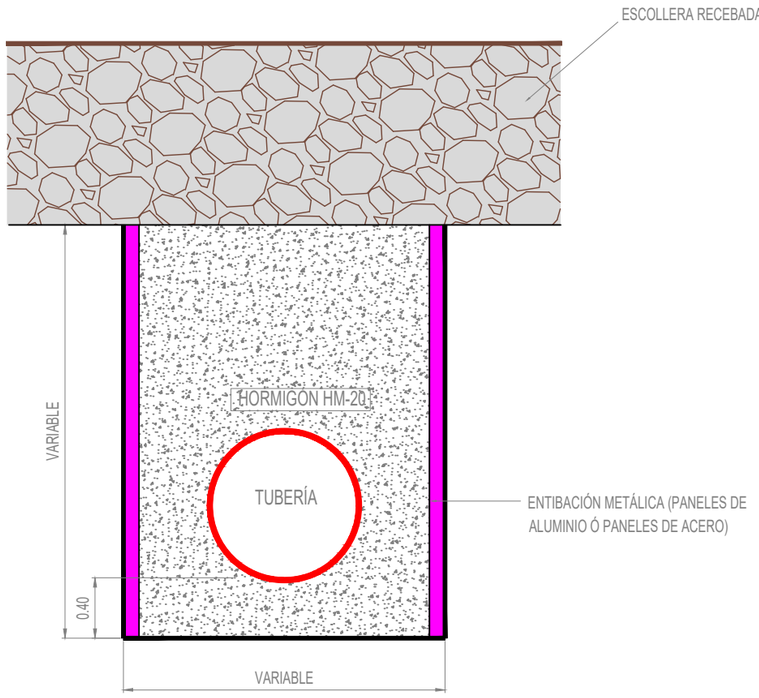

D.exterior (mm)	D.interior (mm)	B (m)		C HM-20 (m)
		H≤3m	H>3m	
110	103	0.60	1.00	0.41
125	118	0.60	1.00	0.43
160	152	0.60	1.00	0.46
200	190	0.60	1.00	0.50
250	237	0.60	1.00	0.55
315	300	0.82	1.02	0.62
400	380	0.90	1.10	0.70
500	475	1.00	1.20	0.80
630	600	1.13	1.33	0.93
710	675	1.21	1.41	1.01

NOTA: DN= D.ext.

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4

FECHA: JULIO 2025

ESCALA: 1:10 ORIGINAL A-3

TÍTULO DEL PLANO: ZANJA TIPO

Nº PLANO: 20

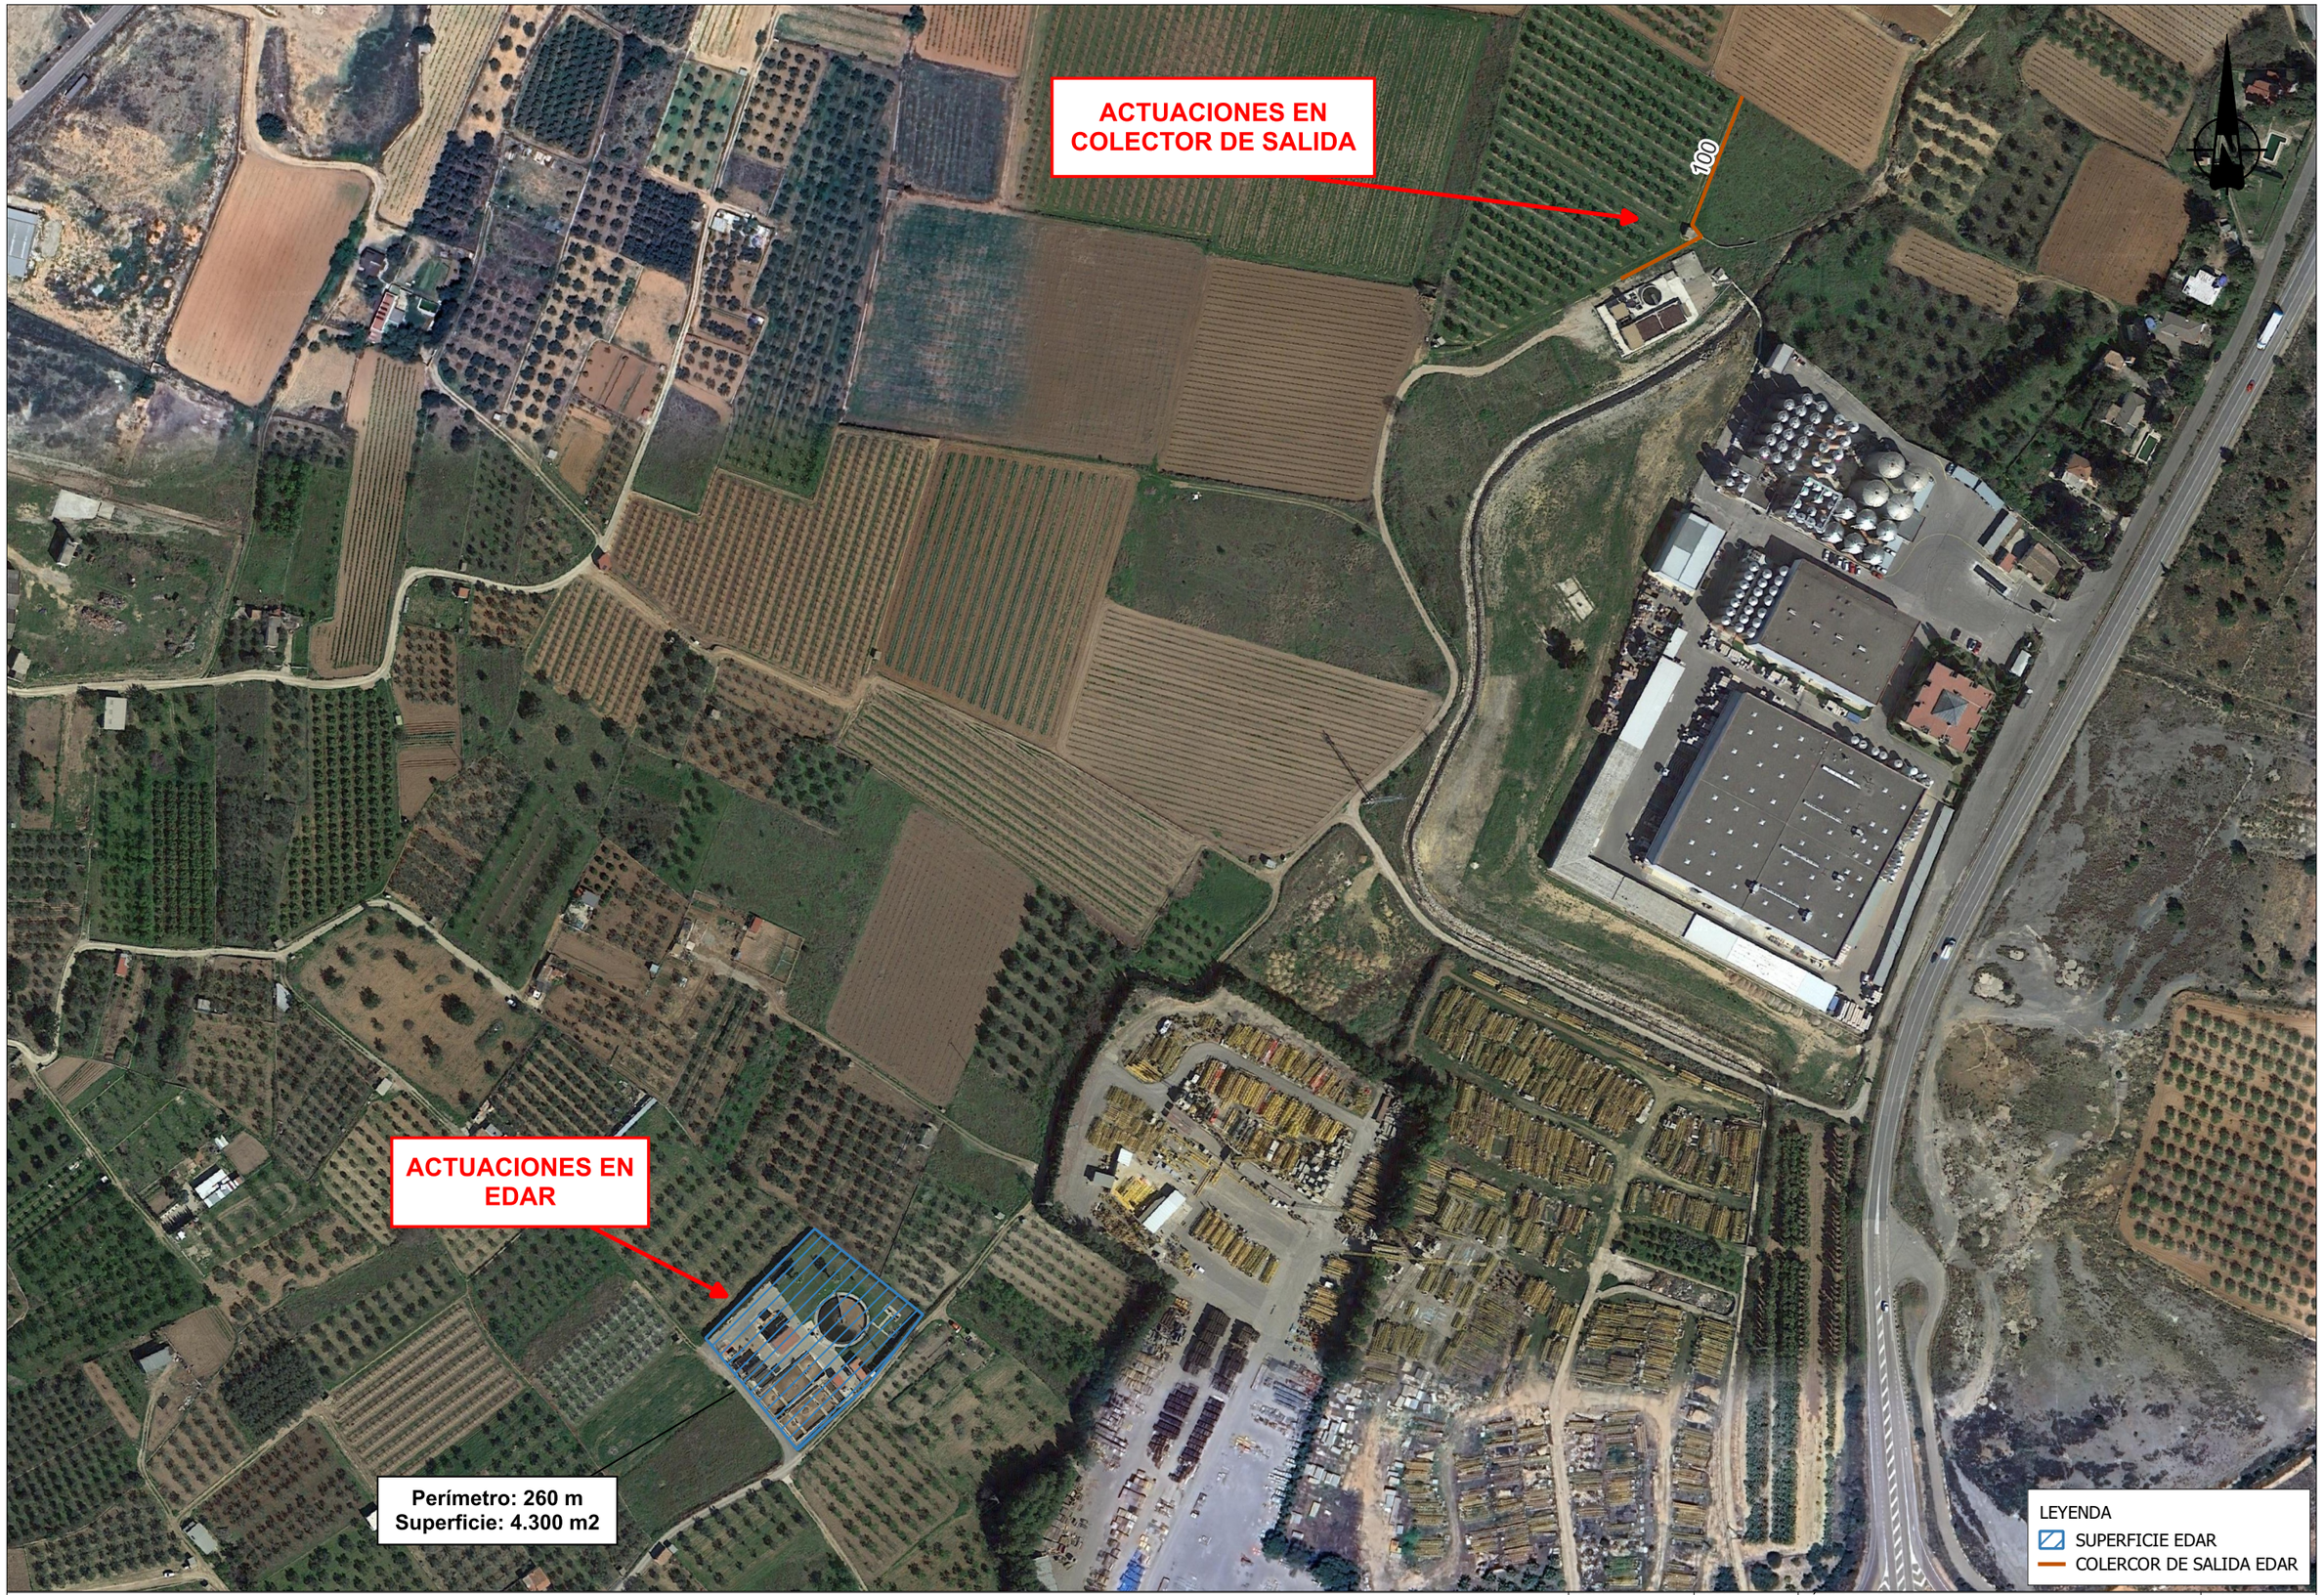

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. LOTE 4	FECHA JULIO 2025	ESCALA 1:1.250 ORIGINAL DIN A3	TÍTULO DEL PLANO CHIVA ACTUACIONES DEPURACIÓN	PLANO Nº 21

ANEXO 4. VALORACIÓN

PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	**CHIVA**			
10.01	**SANEAMIENTO UTE CHIVA(AV/EG)**			
10.01.01	**RENOVACIÓN COLECTORES DAÑADOS EN CASCO URBANO CHIVA FASE 1**			
10.01.01.01	**DEMOLICIONES Y REPOSICIONES**			
A0102010106	**m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 515,00 6,00 3.090,00		
		Subtotal 3.090,00		
		3.090,00	**3,05**	**9.424,50**
A0102010110	**m³ Demolición losa hormigón compresor**			
	Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Canalización	1 515,00 2,00 0,20 206,00		
	Albañales y acometidas	1 1.412,00 1,00 0,20 282,40		
		Subtotal 488,40		
		488,40	**87,82**	**42.891,29**
A0102010108	**m Demolición y levantado de bordillo**			
	Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga a camión.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Acometidas domiciliarias	129 129,00		
		Subtotal 129,00		
		129,00	**2,23**	**287,67**
A0102010121	**m² Levantado de acera existente**			
	Levantado de acera existente, incluso carga a camión.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Acometidas	129 2,00 1,00 258,00		
		Subtotal 258,00		
		258,00	**10,23**	**2.639,34**
A0102010109	**m³ Demolición edificación medios mecánicos**			
	Demolición de todas las edificaciones o macizos de cualquier fábrica existentes en la zona afectada por las obras, mediante la utilización medios mecánicos, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	pozos	29 1,00 1,00 2,50 72,50		
	imbornales	29 0,70 0,40 0,50 4,06		
		Subtotal 76,56		
		76,56	**23,45**	**1.795,33**
A0802010101	**m² Acera de losetas hidráulicas de 20x20 cm**			
	Acera de losetas hidraúlicas de 20x20 cm. de cuatro pastillas, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, incluso mortero de agarre, p.p de juntas de dilatación y bordillo de cierre.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 258,00 258,00		
		Subtotal 258,00		
		258,00	**27,92**	**7.203,36**

PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0803010103	**m Reposición de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo.**			
	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 129,00 129,00		
		Subtotal 129,00		
		129,00	**16,11**	**2.078,19**
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 488,40 488,40		
		Subtotal 488,40		
		488,40	**130,37**	**63.672,71**
A0801010101	**t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura**			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2,6 3.090,00 0,10 803,40		
		Subtotal 803,40		
		803,40	**121,62**	**97.709,51**
D0302010102	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 488,40 488,40		
		1 76,56 76,56		
		Subtotal 564,96		
		564,96	**11,36**	**6.417,95**
D0302010107	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 3.090,00 0,10 309,00		
		Subtotal 309,00		
		309,00	**11,36**	**3.510,24**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 564,96 564,96		
		1 309,00 309,00		
		Subtotal 873,96		
		873,96	**11,19**	**9.779,61**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CYG_SSAA	u Reposición de servicios afectados			
	Reposición de servicios afectados			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Estimado	1 1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	47.700,00	47.700,00
	TOTAL 10.01.01.01			**295.109,70**
10.01.01.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 515,00 2,00 2,50 2.575,00		
		1 1.412,00 1,00 1,00 1.412,00		
	Subtotal	3.987,00		
		3.987,00	8,69	34.647,03
A0105010101	m² Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatas hasta 3 m			
	Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Estimado	2 450,00 2,50 2.250,00		
	Subtotal	2.250,00		
		2.250,00	29,34	66.015,00
A0103040101	Ud Mano de obra de bomba para agot. o rebaj. del N.F.			
	Incluye el transporte, el montaje y el desmontaje en obra de la bomba para agotamiento o rebajamiento del nivel freático.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Estimado 5 meses	5 22,00 110,00		
	Subtotal	110,00		
		110,00	119,21	13.113,10
A0103040103	h Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/h			
	Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 30 m³/h.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Estimado 5 meses	5 22,00 8,00 880,00		
	Subtotal	880,00		
		880,00	8,40	7.392,00
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 515,00 1,00 0,60 309,00		
		1 1.412,00 0,60 0,45 381,24		
	Subtotal	690,24		
		690,24	26,58	18.346,58

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0104010102	m³ Relleno zanja propios seleccionado			

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
excavacion	1	3.987,00			3.987,00
arena	-1	690,24			-690,24
				Subtotal	3.296,76
					3.296,76

9,49	**31.286,25**	

TOTAL 10.01.01.02 ..... 170.799,96

10.01.01.03 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA

A0601010102	Ud Pozo de registro HA DN 1000 mm H < 4,00 m			

Pozo de registro formado por anillos prefabricados de HA DN1000 mm interior con pieza superior troncocónica D1000/D600 mm, incluso junta arpón de goma de estanquidad entre ellos de altura total hasta 4 m, totalmente colocado. La altura del pozo comienza a contar desde su entronque a la pieza prefabricada en la clave del colector que registra.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	21				21,00
				Subtotal	21,00
					21,00

1.042,09	**21.883,89**	

A0603010104	Ud Tapa estanca circular FD Ø min 60 cm D-400			

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil estanca (atornillada) clase D-400.Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	21				21,00
				Subtotal	21,00
					21,00

128,74	**2.703,54**	

A0602020102	Ud Arqueta H.A. 50 x 50 x 50 cm			

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 con cerco y tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Acometidas	129				129,00
				Subtotal	129,00
					129,00

144,37	**18.623,73**	

EISA15da	u Sumidero horm pref 700x460x700 mm C-250			

Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de hormigón de 700x460x700 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase C-250, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

Descomposición					
MOOA.8a	*h*	*Oficial 1ª construcción*	*0,500*	*21,52*	*10,76*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*0,500*	*18,00*	*9,00*
PBRG.1jd	*t*	*Grava caliza 20/40 lvd 30km*	*0,202*	*16,12*	*3,26*
PBPC15bbb	*m3*	*HNE-15 blanda TM 20*	*0,325*	*108,90*	*35,39*
PBPM.1db	*m3*	*Mto cto M-5 mec*	*0,020*	*100,40*	*2,01*
PUCA13aa	*u*	*Sumidero sif hormigón pref 700x460x700 mm*	*1,000*	*55,40*	*55,40*

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PUCA30b	*u*	*Reja+marco fundición 530x235x70 mm*	*1,000*	*47,05*	*47,05*
	%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*1,629*	*2,00*	*3,26*
	%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*1,661*	*20,00*	*33,23*

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
21				21,00
			Subtotal	21,00

21,00	**211,32**	**4.437,72**

TOTAL 10.01.01.03 ..... 47.648,88

10.01.01.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0304020107 **m Tubería PVC liso DN 400 SN4**

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	515,00			515,00
			Subtotal	515,00

515,00	**99,92**	**51.458,80**

A0304020105 **m Tubería PVC liso DN 250 SN4**

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	1.412,00			1.412,00
			Subtotal	1.412,00

1.412,00	**46,24**	**65.290,88**

TOTAL 10.01.01.04 ..... 116.749,68

10.01.01.05 GESTION DE RESIDUOS

TOTAL 10.01.01.05 ..... 37.818,49

10.01.01.06 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL 10.01.01.06 ..... 12.606,16

10.01.01.07 ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)

TOTAL 10.01.01.07 ..... 68.073,29

TOTAL 10.01.01 ..... 748.806,16

10.01.02 RENOVACIÓN COLECTORES DAÑADOS ZONA INDUSTRIAL CHIVA FASE 1

10.01.02.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

A0102010106 **m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**

Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	405,00	6,00		2.430,00
			Subtotal	2.430,00

2.430,00	**3,05**	**7.411,50**

A0102010110 **m³ Demolición losa hormigón compresor**

Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	401,00	2,00	0,20	160,40
			Subtotal	160,40

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		160,40	**87,82**	**14.086,33**
A0102010108	**m Demolición y levantado de bordillo**			
	Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga a camión.			

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Acometidas	41	1,00			41,00
				Subtotal	41,00

	41,00	**2,23**	**91,43**
A0102010121	**m² Levantado de acera existente**		
	Levantado de acera existente, incluso carga a camión.		

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Acometidas	41	1,00	2,00		82,00
				Subtotal	82,00

	82,00	**10,23**	**838,86**
A0102010109	**m³ Demolición edificación medios mecánicos**		
	Demolición de todas las edificaciones o macizos de cualquier fábrica existentes en la zona afectada por las obras, mediante la utilización medios mecánicos, medido sobre perfil.		

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Pozos	21	1,00	1,00	2,50	52,50
acometidas	41	0,50	9,50	0,80	155,80
imbornales	21	0,40	0,80	0,50	3,36
				Subtotal	211,66

	211,66	**23,45**	**4.963,43**
A0802010101	**m² Acera de losetas hidráulicas de 20x20 cm**		
	Acera de losetas hidraúlicas de 20x20 cm. de cuatro pastillas, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, incluso mortero de agarre, p.p de juntas de dilatación y bordillo de cierre.		

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1		82,00		82,00
				Subtotal	82,00

	82,00	**27,92**	**2.289,44**
A0803010103	**m Reposición de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo.**		
	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.		

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	41,00			41,00
				Subtotal	41,00

	41,00	**16,11**	**660,51**
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**		
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.		

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1		160,40		160,40
				Subtotal	160,40

	160,40	**130,37**	**20.911,35**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0801010101	t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		2,6 2.430,00 0,10 631,80		
		Subtotal 631,80		
		631,80	**121,62**	**76.839,52**
D0302010102	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
	hormigon	1 160,40 160,40		
	bordillo	1 129,00 0,06 7,74		
	acera	1 82,00 0,10 8,20		
	pozos y arquetas	1 211,66 211,66		
		Subtotal 388,00		
		388,00	**11,36**	**4.407,68**
D0302010107	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 2.430,00 0,10 243,00		
		Subtotal 243,00		
		243,00	**11,36**	**2.760,48**
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 176,34 176,34		
		1 243,96 243,96		
		1 211,66 211,66		
		Subtotal 631,96		
		631,96	**11,19**	**7.071,63**
CYG_SSAA	u Reposición de servicios afectados			
	Reposición de servicios afectados			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 1,00		
		Subtotal 1,00		
		1,00	**47.700,00**	**47.700,00**
	TOTAL 10.01.02.01			**190.032,16**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

10.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A0103020102 **m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio**

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Colector	1	401,00	2,00	2,50	2.005,00
Acometidas y albañales	1	497,00	1,00	1,00	497,00
				Subtotal	2.502,00

2.502,00	**8,69**	**21.742,38**

A0105010101 **m² Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatas hasta 3 m**

Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Estimado	2	350,00		2,50	1.750,00
				Subtotal	1.750,00

1.750,00	**29,34**	**51.345,00**

A0103040101 **Ud Mano de obra de bomba para agot. o rebaj. del N.F.**

Incluye el transporte, el montaje y el desmontaje en obra de la bomba para agotamiento o rebajamiento del nivel freático.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
estimado 4 meses	4		22,00		88,00
				Subtotal	88,00

88,00	**119,21**	**10.490,48**

A0103040103 **h Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/h**

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 30 m³/h.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
estimado 4 meses	4		22,00	8,00	704,00
				Subtotal	704,00

704,00	**8,40**	**5.913,60**

A0104010101 **m³ Relleno zanja arena silícea**

Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	401,00	1,00	0,60	240,60
	1	498,00	0,60	0,45	134,46
				Subtotal	375,06

375,06	**26,58**	**9.969,09**

A0104010102 **m³ Relleno zanja propios seleccionado**

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
excavacion	1		2.502,00		2.502,00
arena	-1		375,06		-375,06
				Subtotal	2.126,94

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2.126,94	9,49	20.184,66
	TOTAL 10.01.02.02			**119.645,21**

10.01.02.03 HORMIGONES Y OBRAS DE FABRICA

A0601010102 **Ud Pozo de registro HA DN 1000 mm H < 4,00 m**

Pozo de registro formado por anillos prefabricados de HA DN1000 mm interior con pieza superior troncocónica D1000/D600 mm, incluso junta arpón de goma de estanquidad entre ellos de altura total hasta 4 m, totalmente colocado. La altura del pozo comienza a contar desde su entronque a la pieza prefabricada en la clave del colector que registra.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	17				17,00
				Subtotal	17,00
					17,00 **1.042,09** **17.715,53**

A0603010104 **Ud Tapa estanca circular FD Ø min 60 cm D-400**

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil estanca (atornillada) clase D-400.Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	17				17,00
				Subtotal	17,00
					17,00 **128,74** **2.188,58**

A0602020102 **Ud Arqueta H.A. 50 x 50 x 50 cm**

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 con cerco y tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Acometidas	41				41,00
				Subtotal	41,00
					41,00 **144,37** **5.919,17**

EISA15da **u Sumidero horm pref 700x460x700 mm C-250**

Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de hormigón de 700x460x700 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase C-250, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

Descomposición

MOOA.8a	*h*	*Oficial 1ª construcción*	*0,500*	*21,52*	*10,76*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*0,500*	*18,00*	*9,00*
PBRG.1jd	*t*	*Grava caliza 20/40 lvd 30km*	*0,202*	*16,12*	*3,26*
PBPC15bbb	*m3*	*HNE-15 blanda TM 20*	*0,325*	*108,90*	*35,39*
PBPM.1db	*m3*	*Mto cto M-5 mec*	*0,020*	*100,40*	*2,01*
PUCA13aa	*u*	*Sumidero sif hormigón pref 700x460x700 mm*	*1,000*	*55,40*	*55,40*
PUCA30b	*u*	*Reja+marco fundición 530x235x70 mm*	*1,000*	*47,05*	*47,05*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*1,629*	*2,00*	*3,26*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*1,661*	*20,00*	*33,23*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	17				17,00
				Subtotal	17,00
					17,00 **211,32** **3.592,44**

TOTAL 10.01.02.03 ..... **29.415,72**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.01.02.04	**CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED**			
A0304020107	**m Tubería PVC liso DN 400 SN4**			
	Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 401,00	401,00		
	Subtotal	401,00		
		401,00	**99,92**	**40.067,92**
A0304020105	**m Tubería PVC liso DN 250 SN4**			
	Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 498,00	498,00		
	Subtotal	498,00		
		498,00	**46,24**	**23.027,52**
	TOTAL 10.01.02.04			**63.095,44**
10.01.02.05	**GESTION DE RESIDUOS**			
	TOTAL 10.01.02.05			**24.131,31**
10.01.02.06	**SEGURIDAD Y SALUD**			
	TOTAL 10.01.02.06			**8.043,77**
10.01.02.07	**ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)**			
	TOTAL 10.01.02.07			**43.436,36**
	TOTAL 10.01.02			**477.799,97**
	TOTAL 10.01			**1.226.606,13**
10.02	**ABASTECIMIENTO UTE CHIVA(AV/EG)**			
10.02.01	**C/ ENRIQUE PONCE FASE 1**			
10.02.01.01	**DEMOLICIONES Y REPOSICIONES**			
A0102010106	**m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			
	Medición			
	C/ Antonio Machado — UDS 1 LONGITUD 12,00 ANCHURA 2,00	24,00		
	C/ Enrique ponce — UDS 1 LONGITUD 10,00 ANCHURA 6,00	60,00		
	Subtotal	84,00		
		84,00	**3,05**	**256,20**
D0302010107	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 84,00 ANCHURA 0,12	10,08		
	Subtotal	10,08		
		10,08	**11,36**	**114,51**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 10,08 10,08			
	Subtotal 10,08			
		10,08	11,19	112,80
A0801010101	t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2,6 84,00 0,06 13,10			
	Subtotal 13,10			
		13,10	121,62	1.593,22
	TOTAL 10.02.01.01			**2.076,73**
10.02.01.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	C/ Antonio Machado 1 12,00 1,00 1,50 18,00			
	C/ Enrique Ponce 2 10,00 1,00 1,50 30,00			
	Subtotal 48,00			
		48,00	8,69	417,12
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	C/ Antonio Machado 1 12,00 1,00 0,30 3,60			
	C/ Enrique Ponce 2 10,00 1,00 0,40 8,00			
	Subtotal 11,60			
		11,60	26,58	308,33
A0104010117	m³ Zahorra artificial plástica			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	C/ Antonio Machado 1 12,00 1,00 0,30 3,60			
	C/ Enrique Ponce 2 10,00 1,00 0,30 6,00			
	Subtotal 9,60			
		9,60	12,77	122,59
A0104010102	m³ Relleno zanja propios seleccionado			
	Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Excavación	1	48,00			48,00
Arena	-1	11,60			-11,60
zahorra	-1	9,60			-9,60
				Subtotal	26,80
					26,80

9,49 **254,33**

TOTAL 10.02.01.02 ..... 1.102,37

10.02.01.03 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA

A0201030101 **m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	6	0,50	0,50	0,50	0,75
				Subtotal	0,75
					0,75

130,37 **97,78**

A0602010109 **Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro**

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00

255,69 **255,69**

TOTAL 10.02.01.03 353,47

10.02.01.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0305010105 **m Tubería FD abastecimiento Ø250 Clase 50**

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	26,00			26,00
				Subtotal	26,00
					26,00

127,56 **3.316,56**

A0308010111 **m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-6/10 DN 90**

Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características:
Diámetro: 90 mm
PN-6 gravedad, PN-10 bombeo
Material: PEHD-100
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	12,00			12,00
				Subtotal	12,00
					12,00

22,64 **271,68**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0308010110	m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-10 DN 110			
	Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características: Diámetro: 110 mm PN-10 Material: PEHD-100 Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 26,00	26,00		
	Subtotal	26,00		
		26,00	**33,53**	**871,78**
A0314010109	Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 80 PN 10 BB			
	Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características: Tipo: brida-brida DN-80 PN-10 Materiales: - Virola: Ac. Inoxidable AISI-316 - Bridas: Ac. carbono - Junta de estanqueidad: neopreno - Tornillería: zincada			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**156,71**	**156,71**
A0314010120	Ud Carrete de desmontaje DN100 BB			
	Carrete desmontaje DN 100 mm en acero con junta estanqueidad, tipo brida-brida.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**639,19**	**639,19**
A0314010123_CYG	Ud Carrete de desmontaje DN 250 BB			
	Carrete desmontaje DN 250 mm en acero con junta estanqueidad, tipo brida-brida.			
	Descomposición			
	EIFN11ac u Codo 45º DN=300mm	*4,000*	*851,74*	*3.406,96*
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**3.611,38**	**3.611,38**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0403010106	u Válvula de compuerta PN 10/16 DN-80			

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 80
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00 **128,59** **128,59**

A0403010105	Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-100			

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00 **238,36** **238,36**

A0403010102	u Válvula de compuerta PN 10/16 DN-300			

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Valvula 250 mm. (no hay precio)	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00 **965,81** **965,81**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

EIFA.1bhb **u** **Acometida fundición <15m Ø40mm**

Acometida en conducciones generales de fundición de 250mm de diámetro, compuesta por collarín,cabezal, tuerca reductora, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 40mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Descomposición

MOOF.8a	*h*	*Oficial 1ª fontanería*	*3,500*	*23,87*	*83,55*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*3,500*	*18,00*	*63,00*
PIFA.1bhb	*u*	*Acom<15m fund red ø250mm*	*1,000*	*146,24*	*146,24*
PBPO11bb	*m3*	*HNE-15/B/20 obra*	*0,008*	*114,85*	*0,92*
PIFA16a	*u*	*Derechos enganche acometida*	*1,000*	*330,48*	*330,48*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*6,242*	*2,00*	*12,48*
EFFC.1bdfa		*Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm*	*0,800*	*52,09*	*41,67*
AMME.1abaa	*m³*	*Excv trán cielo abt mman*	*3,600*	*47,32*	*170,35*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*8,487*	*20,00*	*169,74*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	3				3,00
				Subtotal	3,00
					3,00

1.079,54	**3.238,62**	

TOTAL 10.02.01.04 ..... 13.438,68

10.02.01.05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

CYG_ANCLTUB **u** **ANCLAJES TUBERÍAS A PUENTE DE PIEDRA**

ANCLAJES TUBERÍAS A PUENTE DE PIEDRA

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Anclaje tubería de 110 mm y de 250 mm	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00

6.254,00	**6.254,00**	

TOTAL 10.02.01.05 ..... 6.254,00

10.02.01.06 PUESTA EN SERVICIO

A1001010105 **m** **Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**

Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
C/ Antonio Machado	1	12,00			12,00
C/ Enrique Ponce	2	26,00			52,00
				Subtotal	64,00
					64,00

1,03	**65,92**	

CYG_Analitica **u** **Analiticas de agua**

Analiticas de agua

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00

668,54	**668,54**	

TOTAL 10.02.01.06 734,46

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

10.02.01.07 GESTION DE RESIDUOS FC

GRAO.2a **m Ret canalización FC Ø<200mm**

Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200mm de diámetro realizada empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.

Descomposición

MOOA.8a	*h*	*Oficial 1ª construcción*	*0,105*	*21,52*	*2,26*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*0,210*	*18,00*	*3,78*
MMME.4baa	*h*	*Retro de neum c/palafrtl 0,34m3*	*0,040*	*65,28*	*2,61*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*0,087*	*2,00*	*0,17*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*0,088*	*20,00*	*1,76*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
C/ Antonio Machado	1	12,00			12,00
C/ Enrique Ponce	2	26,00			52,00
				Subtotal	64,00
					64,00

11,21	**717,44**

GRAD.1a **m3 Depósito materiales con amianto en instalación autorizada**

Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
C/ Antonio Machado	1	12,00	0,01		0,12
C/ Enrique Ponce	2	26,00	0,05		2,60
				Subtotal	2,72
					2,72

190,80	**518,98**

TOTAL 10.02.01.07 ..... 1.236,42

TOTAL 10.02.01 ..... 25.196,13

10.02.02 C/ RAMÓN Y CAJAL FASE 1

10.02.02.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

A0102010106 **m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**

Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	30,00	1,00	0,12	3,60
				Subtotal	3,60
					3,60

3,05	**10,98**

A0102010110 **m³ Demolición losa hormigón compresor**

Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	30,00	1,00	0,30	9,00
				Subtotal	9,00
					9,00

87,82	**790,38**

A0201030101 **m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	30,00	1,00	0,30	9,00
				Subtotal	9,00
					9,00

130,37	**1.173,33**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0801010101	t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2,6 30,00 1,00 0,06 4,68		
		Subtotal 4,68		
		4,68	**121,62**	**569,18**
D0302010102	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 30,00 1,00 0,30 9,00		
		Subtotal 9,00		
		9,00	**11,36**	**102,24**
D0302010107	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 30,00 1,00 0,06 1,80		
		Subtotal 1,80		
		1,80	**11,36**	**20,45**
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Aglomerado	1 9,00 9,00		
	Hormigón	1 1,80 1,80		
		Subtotal 10,80		
		10,80	**11,19**	**120,85**
	TOTAL 10.02.02.01			**2.787,41**
10.02.02.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 30,00 1,00 1,50 45,00		
		Subtotal 45,00		
		45,00	**8,69**	**391,05**
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 30,00 1,00 0,35 10,50		
		Subtotal 10,50		
		10,50	**26,58**	**279,09**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0104010102	m³ Relleno zanja propios seleccionado			

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Excavación	1	45,00			45,00
arena	-1	10,50			-10,50
				Subtotal	34,50
					34,50 **9,49** **327,41**

TOTAL 10.02.02.02 997,55

10.02.02.03 HORMIGONES Y OBRA DE FÁBRICA

A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Dado sujección	1	0,50	0,50	0,50	0,13
				Subtotal	0,13
					0,13 **130,37** **16,95**

A0602010109	Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro			

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00 **255,69** **255,69**

TOTAL 10.02.02.03 272,64

10.02.02.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0308010109	m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-6/10 DN 160			

Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características:
Diámetro: 160 mm
PN-6 gravedad, PN-10 bombeo
Material: PEHD-10
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	30,00			30,00
				Subtotal	30,00
					30,00 **43,52** **1.305,60**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0314010107	**Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 150 PN 10 BB**			

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características:

Tipo: brida-brida
DN-150
PN-10

Materiales:
- Virola: Ac. Inoxidable AISI-316
- Bridas: Ac. carbono
- Junta de estanqueidad: neopreno
- Tornillería: zincada

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00 **221,72** **221,72**

A0403010104	**Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-150**			

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00 **258,43** **258,43**

EIFA.1dfb	**u Acometida PE <15m Ø40mm**			

Acometida en conducciones generales de PE de 160mm de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 40mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Descomposición

MOOF.8a	*h*	*Oficial 1ª fontanería*	*3,500*	*23,87*	*83,55*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*3,500*	*18,00*	*63,00*
PIFA.1dfb	*u*	*Acom<15m PE red ø160mm*	*1,000*	*140,10*	*140,10*
PBPO11bb	*m3*	*HNE-15/B/20 obra*	*0,008*	*114,85*	*0,92*
PIFA16a	*u*	*Derechos enganche acometida*	*1,000*	*330,48*	*330,48*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*6,181*	*2,00*	*12,36*
EFFC.1bdfa		*Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm*	*0,800*	*52,09*	*41,67*
AMME.1abaa	*m³*	*Excv trán cielo abt mman*	*3,600*	*47,32*	*170,35*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*8,424*	*20,00*	*168,49*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00 **1.071,58** **1.071,58**

TOTAL 10.02.02.04 ..... 2.857,33

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.02.05	**PUESTA EN SERVICIO**			
A1001010105	**m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 30,00	30,00		
	Subtotal	30,00		
		30,00	**1,03**	**30,90**
CYG_Analitica	**u Analiticas de agua**			
	Analiticas de agua			
	Medición			
	UDS 1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**668,54**	**668,54**
	TOTAL 10.02.02.05			**699,44**
10.02.02.06	**GESTION DE RESIDUOS FC**			
GRAO.2a	**m Ret canalización FC Ø<200mm**			
	Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200mm de diámetro realizada empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,105*	*21,52*	*2,26*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,210*	*18,00*	*3,78*
	MMME.4baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3	*0,040*	*65,28*	*2,61*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,087*	*2,00*	*0,17*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,088*	*20,00*	*1,76*
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 30,00	30,00		
	Subtotal	30,00		
		30,00	**11,21**	**336,30**
GRAD.1a	**m3 Depósito materiales con amianto en instalación autorizada**			
	Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 30,00 ANCHURA 0,02	0,60		
	Subtotal	0,60		
		0,60	**190,80**	**114,48**
	TOTAL 10.02.02.06			**450,78**
	TOTAL 10.02.02			**8.065,15**
10.02.03	**BARRANCO DEL GALLEGO FASE 1**			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.03.01	**DEMOLICIONES Y REPOSICIONES**			
A0102010106	m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 66,95 5,00 334,75			
	1 44,60 5,00 223,00			
	Subtotal 557,75			
		557,75	**3,05**	**1.701,14**
A0102010110	m³ Demolición losa hormigón compresor			
	Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 66,95 1,00 0,30 20,09			
	1 44,60 1,00 0,30 13,38			
	Subtotal 33,47			
		33,47	**87,82**	**2.939,34**
A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 33,47 33,47			
	Subtotal 33,47			
		33,47	**130,37**	**4.363,48**
A0801010101	t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2,6 557,75 0,05 72,51			
	Subtotal 72,51			
		72,51	**121,62**	**8.818,67**
D0302010102	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 33,47 33,47			
	Subtotal 33,47			
		33,47	**11,36**	**380,22**
D0302010107	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 557,75 0,10 55,78			
	Subtotal 55,78			
		55,78	**11,36**	**633,66**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 33,47 33,47			
	1 55,78 55,78			
	Subtotal	89,25		
		89,25	11,19	998,71
	TOTAL 10.02.03.01			19.835,22
10.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 165,00 1,00 1,50 247,50			
	Subtotal	247,50		
		247,50	8,69	2.150,78
A0105010101	m² Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatas hasta 3 m			
	Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2 54,00 2,00 216,00			
	Subtotal	216,00		
		216,00	29,34	6.337,44
A0103040101	Ud Mano de obra de bomba para agot. o rebaj. del N.F.			
	Incluye el transporte, el montaje y el desmontaje en obra de la bomba para agotamiento o rebajamiento del nivel freático.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 15,00 15,00			
	Subtotal	15,00		
		15,00	119,21	1.788,15
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 66,95 1,00 0,45 30,13			
	1 44,60 1,00 0,45 20,07			
	Subtotal	50,20		
		50,20	26,58	1.334,32
A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Cruce arroyo 1 54,00 1,00 0,50 27,00			
	Subtotal	27,00		
		27,00	130,37	3.519,99

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0104010117	m³ Zahorra artificial plástica			

Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	66,95	1,00	0,30	20,09
	1	44,60	1,00	0,30	13,38
				Subtotal	33,47
					33,47

	33,47	**12,77**	**427,41**

A0104010102 m³ Relleno zanja propios seleccionado

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Excavación	1			247,50	247,50
Arena	-1			50,20	-50,20
Hormigón	-1			26,73	-26,73
Zahorra	-1			33,47	-33,47
				Subtotal	137,10
					137,10

	9,49	**1.301,08**
TOTAL 10.02.03.02		**16.859,17**

10.02.03.03 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA

A0201030101 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Dados hormigon	4	0,50	0,50	0,50	0,50
				Subtotal	0,50
					0,50

	130,37	**65,19**

A0602010109 Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00

	255,69	**511,38**
TOTAL 10.02.03.03		**576,57**

10.02.03.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0305010105 m Tubería FD abastecimiento Ø250 Clase 50

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	165,00			165,00
				Subtotal	165,00
					165,00

A0403010102 **u** **Válvula de compuerta PN 10/16 DN-300** — **165,00** — **127,56** — **21.047,40**

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
no hay precio de 250 mm.	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00

A0314010123_CYG **u** **Carrete de desmontaje DN 250 BB** — **2,00** — **965,81** — **1.931,62**

Carrete desmontaje DN 250 mm en acero con junta estanqueidad, tipo brida-brida.

Descomposición

EIFN11ac	*u*	*Codo 45º DN=300mm*	*4,000*	*851,74*	*3.406,96*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00

2,00 — **3.611,38** — **7.222,76**

TOTAL 10.02.03.04 ..... 30.201,78

10.02.03.05 PUESTA EN SERVICIO

A1001010105 **m** **Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**

Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	165,00			165,00
				Subtotal	165,00
					165,00

CYG_Analitica **u** **Analiticas de agua** — **165,00** — **1,03** — **169,95**

Analiticas de agua

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00

2,00 — **668,54** — **1.337,08**

TOTAL 10.02.03.05 ..... 1.507,03

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

10.02.03.06 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

GLO_CRUCE_CYC **m** **Sobrecoste de ejecución por cruce de barranco**

Sobrecoste de ejecución por cruce de barranco

Descomposición

AMME.2bab	*m³*	*Excv de znj mman*	*0,750*	*52,03*	*39,02*
AMME.2bbb	*m³*	*Excv de znj mmec*	*0,750*	*20,77*	*15,58*
AMME22acabb	*m²*	*Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m*	*5,000*	*23,16*	*115,80*
UPCG.1a	*m3*	*Extendido y compactado zahorra V<2300m3*	*0,300*	*32,64*	*9,79*
AMMR.6dcb	*m³*	*Relleno zanja HM-20/B/12/X0*	*0,600*	*152,53*	*91,52*
AMPC.2b	*m³*	*Carga y transporte de escollera 50 km*	*0,600*	*19,56*	*11,74*
AMPC.3aaa	*m³*	*Escollera piedra calcárea HMB 300/1000*	*0,600*	*52,72*	*31,63*
AMDZ11a	*m*	*Limpieza de cauce*	*1,000*	*15,25*	*15,25*
GLO_ACERR	*u*	*Kit junta acerrojada dn250*	*0,170*	*388,51*	*66,05*
GLO_CAMISA	*kg*	*Kg de acero s275jr encamisado tuberia dn500*	*61,650*	*9,45*	*582,59*
A0103040103	*h*	*Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/h*	*2,800*	*7,92*	*22,18*

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	54,00			54,00
			Subtotal	54,00

54,00	**1.061,22**	**57.305,88**

TOTAL 10.02.03.06 ..... 57.305,88

TOTAL 10.02.03 ..... 126.285,65

10.02.04 C/ SAN ISIDRO FASE 1

10.02.04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

A0102010115 **m²** **Demolición de solado de balsosa hidráulica**

Demolición de solado de balsosa hidráulica, mediante compresor neumático, incluso retirada de material a vertedero, terminado.

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	65,00	3,00		195,00
			Subtotal	195,00

195,00	**8,19**	**1.597,05**

A0102010110 **m³** **Demolición losa hormigón compresor**

Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	65,00	0,60	0,30	11,70
			Subtotal	11,70

11,70	**87,82**	**1.027,49**

A0201030101 **m³** **Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	65,00	0,60	0,30	11,70
			Subtotal	11,70

11,70	**130,37**	**1.525,33**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0801030115	m² Pavimento de adoquín de hormigón			
	Pavimento con adoquín de hormigón, compuesto por base flexible de zahorra artificial, de 30 cm de espesor (medido en partida a parte), con extendido y compactado al 100% del proctor modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la une-en 1338, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; Y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 65,00 3,00 195,00		
		Subtotal 195,00		
		195,00	**50,18**	**9.785,10**
D0302010102	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	adoquin	1 65,00 3,00 0,10 19,50		
	Hormigón	1 65,00 0,60 0,30 11,70		
		Subtotal 31,20		
		31,20	**11,36**	**354,43**
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 31,20 31,20		
		Subtotal 31,20		
		31,20	**11,19**	**349,13**
	TOTAL 10.02.04.01			**14.638,53**
10.02.04.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 65,00 0,60 1,50 58,50		
		Subtotal 58,50		
		58,50	**8,69**	**508,37**
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 65,00 0,60 0,30 11,70		
		Subtotal 11,70		
		11,70	**26,58**	**310,99**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0104010117	m³ Zahorra artificial plástica			

Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Excavación	1		58,50		58,50
Arena	-1		11,70		-11,70
				Subtotal	46,80
					46,80

12,77		**597,64**

TOTAL 10.02.04.02 ..... 1.417,00

10.02.04.03 HORMIGONES Y OBRAS DE FABRICA

A0201030101 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Dado sujección	1	0,50	0,60	0,50	0,15
Acometidas	7	0,50	0,60	0,50	1,05
				Subtotal	1,20
					1,20

130,37		**156,44**

A0602010109 Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
				Subtotal	1,00
					1,00

255,69		**255,69**

TOTAL 10.02.04.03 412,13

10.02.04.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0308010110 m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-10 DN 110

Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características:
Diámetro: 110 mm
PN-10
Material: PEHD-100
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	65,00			65,00
				Subtotal	65,00
					65,00

33,53		**2.179,45**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

A0403010105 **Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-100**

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
Subtotal					1,00
					1,00 **238,36** **238,36**

A0314010108 **Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 100 PN 10 BB**

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características:

Tipo: brida-brida
DN-100
PN-10

Materiales:
- Virola: Ac. Inoxidable AISI-316
- Bridas: Ac. carbono
- Junta de estanqueidad: neopreno
- Tornillería: zincada

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1				1,00
Subtotal					1,00
					1,00 **173,19** **173,19**

EIFA.1dfb **u Acometida PE <15m Ø40mm**

Acometida en conducciones generales de PE de 160mm de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 40mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Descomposición

MOOF.8a	*h*	*Oficial 1ª fontanería*	*3,500*	*23,87*	*83,55*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*3,500*	*18,00*	*63,00*
PIFA.1dfb	*u*	*Acom<15m PE red ø160mm*	*1,000*	*140,10*	*140,10*
PBPO11bb	*m3*	*HNE-15/B/20 obra*	*0,008*	*114,85*	*0,92*
PIFA16a	*u*	*Derechos enganche acometida*	*1,000*	*330,48*	*330,48*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*6,181*	*2,00*	*12,36*
EFFC.1bdfa		*Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm*	*0,800*	*52,09*	*41,67*
AMME.1abaa	*m³*	*Excv trán cielo abt mman*	*3,600*	*47,32*	*170,35*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*8,424*	*20,00*	*168,49*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	7				7,00
Subtotal					7,00
					7,00 **1.071,58** **7.501,06**

TOTAL 10.02.04.04 ..... 10.092,06

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.04.05	**PUESTA EN SERVICIO**			
A1001010105	m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición			
	UDS 65	65,00		
	Subtotal	65,00		
		65,00	**1,03**	**66,95**
CYG_Analitica	u Analiticas de agua			
	Analiticas de agua			
	Medición			
	UDS 1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**668,54**	**668,54**
	TOTAL 10.02.04.05			**735,49**
	TOTAL 10.02.04			**27.295,21**
10.02.05	**C/ OLIVERA FASE 1**			
10.02.05.01	**DEMOLICIONES Y REPOSICIONES**			
A0102010115	m² Demolición de solado de balsosa hidráulica			
	Demolición de solado de balsosa hidráulica, mediante compresor neumático, incluso retirada de material a vertedero, terminado.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 55,00 3,00	165,00		
	Subtotal	165,00		
		165,00	**8,19**	**1.351,35**
A0102010110	m³ Demolición losa hormigón compresor			
	Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 55,00 0,60 0,30	9,90		
	Subtotal	9,90		
		9,90	**87,82**	**869,42**
A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 55,00 0,60 0,30	9,90		
	Subtotal	9,90		
		9,90	**130,37**	**1.290,66**
A0801030115	m² Pavimento de adoquín de hormigón			
	Pavimento con adoquín de hormigón, compuesto por base flexible de zahorra artificial, de 30 cm de espesor (medido en partida a parte), con extendido y compactado al 100% del proctor modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la une-en 1338, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; Y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 55,00 3,00 165,00			
	Subtotal	165,00		
		165,00	**50,18**	**8.279,70**
D0302010102	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	adoquin 1 55,00 3,00 0,10	16,50		
	Hormigón 1 55,00 0,60 0,30	9,90		
	Subtotal	26,40		
		26,40	**11,36**	**299,90**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 26,40 26,40			
	Subtotal	26,40		
		26,40	**11,19**	**295,42**
	TOTAL 10.02.05.01			**12.386,45**
10.02.05.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	**m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio**			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 55,00 0,60 1,50	49,50		
	Subtotal	49,50		
		49,50	**8,69**	**430,16**
A0104010101	**m³ Relleno zanja arena silícea**			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 55,00 0,60 0,30	9,90		
	Subtotal	9,90		
		9,90	**26,58**	**263,14**
A0104010117	**m³ Zahorra artificial plástica**			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Excavación 1 49,50 49,50			
	Arena -1 9,90 -9,90			
	Subtotal	39,60		
		39,60	**12,77**	**505,69**
	TOTAL 10.02.05.02			**1.198,99**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.05.03	**HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA**			
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	Dado sujección	0,15		
	Acometidas	0,30		
	Subtotal	0,45		
		0,45	**130,37**	**58,67**
A0602010109	**Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro**			
	Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.			
	Medición			
		1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**255,69**	**255,69**
	TOTAL 10.02.05.03			**314,36**
10.02.05.04	**CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED**			
A0308010110	**m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-10 DN 110**			
	Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características: Diámetro: 110 mm PN-10 Material: PEHD-100 Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.			
	Medición			
		55,00		
	Subtotal	55,00		
		55,00	**33,53**	**1.844,15**
A0403010105	**Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-100**			
	Válvula de compuerta de las siguientes características: - Marca: BELGICAST o equivalente - DN 100 - PN 10/16 - Conexiones: Bridas DIN 3202 - Accionamiento: manual por volante Materiales - Cuerpo y tapa: FD GGG 50 - Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR - Eje: Acero Inoxidable AISI 420 - Revistimiento: Epoxy 150 micras			
	Medición			
		1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**238,36**	**238,36**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0314010108	**Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 100 PN 10 BB**			
	Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características: Tipo: brida-brida DN-100 PN-10 Materiales: - Virola: Ac. Inoxidable AISI-316 - Bridas: Ac. carbono - Junta de estanqueidad: neopreno - Tornillería: zincada			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 1,00		
		Subtotal 1,00		
		1,00	**173,19**	**173,19**
EIFA.1dfb	**u Acometida PE <15m Ø40mm**			
	Acometida en conducciones generales de PE de 160mm de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 40mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.			
	Descomposición			
	MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería	*3,500*	*23,87*	*83,55*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*3,500*	*18,00*	*63,00*
	PIFA.1dfb u Acom<15m PE red ø160mm	*1,000*	*140,10*	*140,10*
	PBPO11bb m3 HNE-15/B/20 obra	*0,008*	*114,85*	*0,92*
	PIFA16a u Derechos enganche acometida	*1,000*	*330,48*	*330,48*
	%0200 % Medios auxiliares	*6,181*	*2,00*	*12,36*
	EFFC.1bdfa Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm	*0,800*	*52,09*	*41,67*
	AMME.1abaa m³ Excv trán cielo abt mman	*3,600*	*47,32*	*170,35*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*8,424*	*20,00*	*168,49*
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		2 2,00		
		Subtotal 2,00		
		2,00	**1.071,58**	**2.143,16**
	TOTAL 10.02.05.04			**4.398,86**
10.02.05.05	**PUESTA EN SERVICIO**			
A1001010105	**m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 55,00 55,00		
		Subtotal 55,00		
		55,00	**1,03**	**56,65**
CYG_Analitica	**u Analiticas de agua**			
	Analiticas de agua			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 1,00		
		Subtotal 1,00		
		1,00	**668,54**	**668,54**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 10.02.05.05			**725,19**
	TOTAL 10.02.05			**19.023,85**
10.02.06	**LOMA DE MIRALCAMPO FASE 1**			
10.02.06.01	**DEMOLICIONES Y REPOSICIONES**			
A0102010106	**m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 700,00 1,00 700,00		
		Subtotal 700,00		
		700,00	**3,05**	**2.135,00**
A0102010110	**m³ Demolición losa hormigón compresor**			
	Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 700,00 0,20 140,00		
		Subtotal 140,00		
		140,00	**87,82**	**12.294,80**
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 700,00 0,20 140,00		
		Subtotal 140,00		
		140,00	**130,37**	**18.251,80**
A0801010101	**t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura**			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2,6 700,00 1,00 0,06 109,20		
		Subtotal 109,20		
		109,20	**121,62**	**13.280,90**
D0302010102	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 140,00 140,00		
		Subtotal 140,00		
		140,00	**11,36**	**1.590,40**
D0302010107	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 700,00 0,10 70,00		
		Subtotal 70,00		
		70,00	**11,36**	**795,20**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 140,00 140,00		
		1 70,00 70,00		
		Subtotal 210,00		
		210,00	**11,19**	**2.349,90**
	TOTAL 10.02.06.01			**50.698,00**
10.02.06.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 1.435,00 1,00 1,50 2.152,50		
		Subtotal 2.152,50		
		2.152,50	**8,69**	**18.705,23**
A0105010101	m² Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatas hasta 3 m			
	Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Cruce del barranco del Gallego	2 20,00 1,50 60,00		
		Subtotal 60,00		
		60,00	**29,34**	**1.760,40**
A0103040101	Ud Mano de obra de bomba para agot. o rebaj. del N.F.			
	Incluye el transporte, el montaje y el desmontaje en obra de la bomba para agotamiento o rebajamiento del nivel freático.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 10,00 10,00		
		Subtotal 10,00		
		10,00	**119,21**	**1.192,10**
A0103040103	h Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/h			
	Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 30 m³/h.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Se estiman 10 días laborables	10 8,00 80,00		
		Subtotal 80,00		
		80,00	**8,40**	**672,00**
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 1.435,00 0,60 0,30 258,30		
		Subtotal 258,30		
		258,30	**26,58**	**6.865,61**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0104010117	m³ Zahorra artificial plástica			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	1 1.435,00 1,00 0,30 430,50			
	Subtotal 430,50			
		430,50	**12,77**	**5.497,49**
A0104010102	m³ Relleno zanja propios seleccionado			
	Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.			
	Medición			
	Excavación 1 2.152,50 2.152,50			
	Arena -1 258,30 -258,30			
	Zahorra -1 430,50 -430,50			
	hormigon Barranco de Gallego -1 20,00 1,00 0,50 -10,00			
	Subtotal 1.453,70			
		1.453,70	**9,49**	**13.795,61**
	TOTAL 10.02.06.02			**48.488,44**
10.02.06.03	**HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA**			
A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	Hormigonado tubo en barranco de Gallego 1 20,00 1,00 0,50 10,00			
	valvulería 15 0,50 0,60 0,50 2,25			
	Acometidas 9 0,50 0,60 0,50 1,35			
	Subtotal 13,60			
		13,60	**130,37**	**1.773,03**
A0602010109	Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro			
	Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.			
	Medición			
	15 15,00			
	Subtotal 15,00			
		15,00	**255,69**	**3.835,35**
	TOTAL 10.02.06.03			**5.608,38**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.06.04	**CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED**			
A0308010110	**m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-10 DN 110**			
	Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características: Diámetro: 110 mm PN-10 Material: PEHD-100 Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 1.435,00 · ANCHURA · ALTURA → 1.435,00			
	Subtotal	1.435,00		
		1.435,00	**33,53**	**48.115,55**
A0403010105	**Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-100**			
	Válvula de compuerta de las siguientes características: - Marca: BELGICAST o equivalente - DN 100 - PN 10/16 - Conexiones: Bridas DIN 3202 - Accionamiento: manual por volante Materiales - Cuerpo y tapa: FD GGG 50 - Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR - Eje: Acero Inoxidable AISI 420 - Revistimiento: Epoxy 150 micras			
	Medición			
	UDS 15 · LONGITUD · ANCHURA · ALTURA → 15,00			
	Subtotal	15,00		
		15,00	**238,36**	**3.575,40**
A0314010108	**Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 100 PN 10 BB**			
	Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características: Tipo: brida-brida DN-100 PN-10 Materiales: - Virola: Ac. Inoxidable AISI-316 - Bridas: Ac. carbono - Junta de estanqueidad: neopreno - Tornillería: zincada			
	Medición			
	UDS 15 · LONGITUD · ANCHURA · ALTURA → 15,00			
	Subtotal	15,00		
		15,00	**173,19**	**2.597,85**
EIFA.1dfb	**u Acometida PE <15m Ø40mm**			
	Acometida en conducciones generales de PE de 160mm de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 40mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.			
	Descomposición			

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MOOF.8a	*h*	*Oficial 1ª fontanería*	*3,500*	*23,87*	*83,55*
	MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*3,500*	*18,00*	*63,00*
	PIFA.1dfb	*u*	*Acom<15m PE red ø160mm*	*1,000*	*140,10*	*140,10*
	PBPO11bb	*m3*	*HNE-15/B/20 obra*	*0,008*	*114,85*	*0,92*
	PIFA16a	*u*	*Derechos enganche acometida*	*1,000*	*330,48*	*330,48*
	%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*6,181*	*2,00*	*12,36*
	EFFC.1bdfa		*Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm*	*0,800*	*52,09*	*41,67*
	AMME.1abaa	*m³*	*Excv trán cielo abt mman*	*3,600*	*47,32*	*170,35*
	%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*8,424*	*20,00*	*168,49*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	9				9,00
				Subtotal	9,00
					9,00

			9,00	**1.071,58**	**9.644,22**

A0304020101 **m** **Tubería PVC liso DN 110 SN4**

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
provisional	1.435				1.435,00
				Subtotal	1.435,00
					1.435,00

			1.435,00	**16,09**	**23.089,15**

TOTAL 10.02.06.04 ..... 87.022,17

10.02.06.05 PUESTA EN SERVICIO

A1001010105 **m** **Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**

Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	1.435,00			1.435,00
				Subtotal	1.435,00
					1.435,00

			1.435,00	**1,03**	**1.478,05**

CYG_Analitica **u** **Analiticas de agua**

Analiticas de agua

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00

			2,00	**668,54**	**1.337,08**

TOTAL 10.02.06.05 ..... 2.815,13

10.02.06.06 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

GLO_SSAA **m** **Deteccion y reposicion de sevicios afectados**

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
		1.435,00			1.435,00
				Subtotal	1.435,00
					1.435,00

			1.435,00	**10,03**	**14.393,05**

GLO_CRUCE_CYG **m** **Sobrecoste de ejecución por cruce de barranco**

Sobrecoste de ejecución por cruce de barranco

Descomposición

AMME.2bab	*m³*	*Excv de znj mman*	*0,750*	*52,03*	*39,02*
AMME.2bbb	*m³*	*Excv de znj mmec*	*0,750*	*20,77*	*15,58*
AMME22acabb	*m²*	*Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m*	*5,000*	*23,16*	*115,80*
UPCG.1a	*m3*	*Extendido y compactado zahorra V<2300m3*	*0,300*	*32,64*	*9,79*
AMMR.6dcb	*m³*	*Relleno zanja HM-20/B/12/X0*	*0,600*	*152,53*	*91,52*
AMPC.2b	*m³*	*Carga y transporte de escollera 50 km*	*0,600*	*19,56*	*11,74*
AMPC.3aaa	*m³*	*Escollera piedra calcárea HMB 300/1000*	*0,600*	*52,72*	*31,63*
AMDZ11a	*m*	*Limpieza de cauce*	*1,000*	*15,25*	*15,25*
GLO_ACERR	*u*	*Kit junta acerrojada dn250*	*0,170*	*388,51*	*66,05*
GLO_CAMISA	*kg*	*Kg de acero s275jr encamisado tuberia dn500*	*61,650*	*9,45*	*582,59*

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	A0103040103 h Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/h	*2,800*	*7,92*	*22,18*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
		15,00			15,00
				Subtotal	15,00
					15,00 **1.061,22** **15.918,30**

TOTAL 10.02.06.06 ..... 30.311,35

TOTAL 10.02.06 ..... 224.943,47

10.02.07 RED DE DISTRIBUCIÓN DEL CASCO URBANO FASE 1

10.02.07.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

A0102010106 **m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**

Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Avda. Lepanto	1	80,00	1,00		80,00
C/ Antonio Machado	1	115,00	1,00		115,00
C/ Subida Castillo	1	335,00	1,00		335,00
Partida Pizzarro	1	290,00	1,00		290,00
Avda. La estación	1	10,00	1,00		10,00
				Subtotal	830,00
					830,00 **3,05** **2.531,50**

A0102010110 **m³ Demolición losa hormigón compresor**

Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	830,00		0,20	166,00
				Subtotal	166,00
					166,00 **87,82** **14.578,12**

A0102010115 **m² Demolición de solado de balsosa hidráulica**

Demolición de solado de balsosa hidráulica, mediante compresor neumático, incluso retirada de material a vertedero, terminado.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Acometidas	27	1,50			40,50
				Subtotal	40,50
					40,50 **8,19** **331,70**

A0201030101 **m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1		830,00	0,20	166,00
				Subtotal	166,00
					166,00 **130,37** **21.641,42**

A0801010101 **t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura**

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2,6		830,00	0,06	129,48
				Subtotal	129,48
					129,48 **121,62** **15.747,36**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0802010101	m² Acera de losetas hidráulicas de 20x20 cm			
	Acera de losetas hidraúlicas de 20x20 cm. de cuatro pastillas, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, incluso mortero de agarre, p.p de juntas de dilatación y bordillo de cierre.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		27 1,50 40,50		
		Subtotal 40,50		
		40,50	**27,92**	**1.130,76**
D0302010102	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Hormigon	1 166,00 166,00		
	Acerado	1 40,50 0,10 4,05		
		Subtotal 170,05		
		170,05	**11,36**	**1.931,77**
D0302010107	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 830,00 0,10 83,00		
		Subtotal 83,00		
		83,00	**11,36**	**942,88**
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 170,05 170,05		
		1 83,00 83,00		
		Subtotal 253,05		
		253,05	**11,19**	**2.831,63**
	TOTAL 10.02.07.01			**61.667,14**
10.02.07.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Avda. Lepanto	1 80,00 1,00 1,50 120,00		
	C/ Antonio Machado	1 115,00 1,00 1,50 172,50		
	C/ Subida Castillo	1 335,00 1,00 1,50 502,50		
	Partida Pizzarro	1 290,00 1,00 1,50 435,00		
	Avda. La estación	1 10,00 1,00 1,50 15,00		
		Subtotal 1.245,00		
		1.245,00	**8,69**	**10.819,05**
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Avda. Lepanto	1	80,00	0,60	0,30	14,40
C/ Antonio Machado	1	115,00	0,60	0,30	20,70
C/ Subida Castillo	1	335,00	0,60	0,30	60,30
Partida Pizzarro	1	290,00	0,60	0,30	52,20
Avda. La estación	1	10,00	0,60	0,30	1,80
				Subtotal	149,40

	149,40	**26,58**	**3.971,05**

A0104010102 **m³ Relleno zanja propios seleccionado**

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Excavación	1				1.245,00
arena	-1				-149,40
				Subtotal	1.095,60

	1.095,60	**9,49**	**10.397,24**

TOTAL 10.02.07.02 ..... 25.187,34

10.02.07.03 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA

A0201030101 **m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Acometidas	27	0,50	0,60	0,50	4,05
Valvulería	10	0,50	0,60	0,50	1,50
				Subtotal	5,55

	5,55	**130,37**	**723,55**

A0602010109 **Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro**

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Valvulas	10				10,00
				Subtotal	10,00

	10,00	**255,69**	**2.556,90**

TOTAL 10.02.07.03 ..... 3.280,45

10.02.07.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0308010112 **m Tubería de polietileno PE-100, PN16, DN75**

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 75 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
C/ Subida Castillo	1	335,00	1,00		335,00
Partida Pizzarro	1	290,00	1,00		290,00
				Subtotal	625,00

	625,00	**5,24**	**3.275,00**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0308010111	m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-6/10 DN 90			
	Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características: Diámetro: 90 mm PN-6 gravedad, PN-10 bombeo Material: PEHD-100 Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.			
	Medición — UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Avda. Lepanto: 1 · 80,00	80,00		
	C/ Antonio Machado: 1 · 115,00	115,00		
	Subtotal	195,00		
		195,00	**22,64**	**4.414,80**
A0308010107	m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-6/10 DN 250			
	Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características: Diámetro: 250 mm PN-6 gravedad, PN-10 bombeo Material: PEHD-100 Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.			
	Medición — UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Avda. La estación: 1 · 10,00	10,00		
	Subtotal	10,00		
		10,00	**57,80**	**578,00**
A0314010129	Ud Carrete de desmontaje Ø 80 AISI 316L BB			
	Carrete de desmontaje DN 80 de acero con junta de estanqueidad: - Tipo: brida-brida. - Materiales: - Carrete: inox. AISI-316L, bridas: St.37.2. - Junta de estanqueidad: neopreno. - Tornillerias: AISI 304.			
	Medición — UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	**219,87**	**439,74**
A0314010134	u Carrete de desmontaje Ø 250 AISI 316L BB			
	Carrete de desmontaje DN 250 de acero con junta de estanqueidad: - Tipo: brida-brida. - Materiales: - Carrete: inox. AISI-316L, bridas: St.37.2. - Junta de estanqueidad: neopreno. - Tornillerias: AISI 304.			
	Medición — UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**521,85**	**521,85**
A0403010107	Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-50			
	Válvula de compuerta de las siguientes características: - Marca: BELGICAST o equivalente - DN 50 - PN 10/16 - Conexiones: Bridas DIN 3202 - Accionamiento: manual por volante Materiales - Cuerpo y tapa: FD GGG 50 - Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR - Eje: Acero Inoxidable AISI 420 - Revistimiento: Epoxy 150 micras			
	Medición — UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	No hay precio de 65 mm: 7	7,00		
	Subtotal	7,00		

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		7,00	**92,92**	**650,44**

A0403010106 **u** **Válvula de compuerta PN 10/16 DN-80**

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 80
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2				2,00
Subtotal					2,00

	2,00	**128,59**	**257,18**

A0403010102 **u** **Válvula de compuerta PN 10/16 DN-300**

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
No hay precio de 250 mm	1				1,00
Subtotal					1,00

	1,00	**965,81**	**965,81**

EIFA.1dfb **u** **Acometida PE <15m Ø40mm**

Acometida en conducciones generales de PE de 160mm de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 40mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Descomposición

MOOF.8a	*h*	*Oficial 1ª fontanería*	*3,500*	*23,87*	*83,55*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*3,500*	*18,00*	*63,00*
PIFA.1dfb	*u*	*Acom<15m PE red ø160mm*	*1,000*	*140,10*	*140,10*
PBPO11bb	*m3*	*HNE-15/B/20 obra*	*0,008*	*114,85*	*0,92*
PIFA16a	*u*	*Derechos enganche acometida*	*1,000*	*330,48*	*330,48*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*6,181*	*2,00*	*12,36*
EFFC.1bdfa		*Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm*	*0,800*	*52,09*	*41,67*
AMME.1abaa	*m³*	*Excv trán cielo abt mman*	*3,600*	*47,32*	*170,35*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*8,424*	*20,00*	*168,49*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	10				10,00
Subtotal					10,00

	10,00	**1.071,58**	**10.715,80**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 10.02.07.04			**21.818,62**
10.02.07.05	**PUESTA EN SERVICIO**			
A1001010105	**m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 830,00 ANCHURA ALTURA 830,00	830,00		
	Subtotal	830,00		
		830,00	**1,03**	**854,90**
CYG_Analitica	**u Analiticas de agua**			
	Analiticas de agua			
	Medición			
	UDS 8 LONGITUD ANCHURA ALTURA 8,00	8,00		
	Subtotal	8,00		
		8,00	**668,54**	**5.348,32**
	TOTAL 10.02.07.05			**6.203,22**
10.02.07.06	**GESTION DE RESIDUOS FC**			
D0201010103	**m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.**			
	Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 149,40 ANCHURA ALTURA 149,40	149,40		
	UDS 1 LONGITUD 5,55 ANCHURA ALTURA 5,55	5,55		
	Subtotal	154,95		
		154,95	**8,76**	**1.357,36**
GRAO.2a	**m Ret canalización FC Ø<200mm**			
	Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200mm de diámetro realizada empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,105*	*21,52*	*2,26*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,210*	*18,00*	*3,78*
	MMME.4baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3	*0,040*	*65,28*	*2,61*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,087*	*2,00*	*0,17*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,088*	*20,00*	*1,76*
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 830,00 ANCHURA ALTURA 830,00	830,00		
	Subtotal	830,00		
		830,00	**11,21**	**9.304,30**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 154,95 ANCHURA ALTURA 154,95	154,95		
	Subtotal	154,95		
		154,95	**11,19**	**1.733,89**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
GRAD.1a	**m3 Depósito materiales con amianto en instalación autorizada**			
	Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 830,00 · ANCHURA · ALTURA 0,01 → 8,30			
	Subtotal 8,30			
		8,30	**190,80**	**1.583,64**
	TOTAL 10.02.07.06			**13.979,19**
	TOTAL 10.02.07			**132.135,96**
10.02.08	**CONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS A.P. CHIVA Y CHESTE FASE 1**			
10.02.08.01	**DEMOLICIONES Y REPOSICIONES**			
A0102010106	**m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 110,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA → 110,00			
	Subtotal 110,00			
		110,00	**3,05**	**335,50**
A0102010110	**m³ Demolición losa hormigón compresor**			
	Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 110,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 0,20 → 22,00			
	Subtotal 22,00			
		22,00	**87,82**	**1.932,04**
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 22,00 · ANCHURA · ALTURA → 22,00			
	Subtotal 22,00			
		22,00	**130,37**	**2.868,14**
A0801010101	**t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura**			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición			
	UDS 2,6 · LONGITUD 110,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 0,06 → 17,16			
	Subtotal 17,16			
		17,16	**121,62**	**2.087,00**
D0302010102	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 22,00 · ANCHURA · ALTURA → 22,00			
	Subtotal 22,00			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		22,00	**11,36**	**249,92**
D0302010107	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 110,00 0,10 11,00		
		Subtotal 11,00		
		11,00	**11,36**	**124,96**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 22,00 22,00		
		1 11,00 11,00		
		Subtotal 33,00		
		33,00	**11,19**	**369,27**
	TOTAL 10.02.08.01			**7.966,83**
10.02.08.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	**m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio**			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 193,00 1,00 2,00 386,00		
		Subtotal 386,00		
		386,00	**8,69**	**3.354,34**
A0104010101	**m³ Relleno zanja arena silícea**			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 110,00 0,60 0,45 29,70		
		Subtotal 29,70		
		29,70	**26,58**	**789,43**
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Cruce arroyo	1 82,00 0,60 0,50 24,60		
		Subtotal 24,60		
		24,60	**130,37**	**3.207,10**
A0104010102	**m³ Relleno zanja propios seleccionado**			
	Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Excavación arroyo	1 83,00 1,00 2,00 166,00		
	Hormigón arroyo	-1 83,00 0,60 0,50 -24,90		
		Subtotal 141,10		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		141,10	**9,49**	**1.339,04**
A0104010117	**m³ Zahorra artificial plástica**			

Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Excavación	1	110,00	1,00	2,00	220,00
Arena	-1	110,00	0,60	0,45	-29,70
				Subtotal	190,30

190,30	**12,77**	**2.430,13**
A0105010101	**m² Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatas hasta 3 m**		

Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Arroyo	2	83,00		2,00	332,00
				Subtotal	332,00

332,00	**29,34**	**9.740,88**
A0103040101	**Ud Mano de obra de bomba para agot. o rebaj. del N.F.**	

Incluye el transporte, el montaje y el desmontaje en obra de la bomba para agotamiento o rebajamiento del nivel freático.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Considerado 2 semanas	10				10,00
				Subtotal	10,00

10,00	**119,21**	**1.192,10**
A0103040103	**h Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/h**	

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 30 m³/h.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Considerado 2 semanas	10		8,00		80,00
				Subtotal	80,00

80,00	**8,40**	**672,00**
TOTAL 10.02.08.02		**22.725,02**
10.02.08.03	**HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA**	
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**	

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Valvulería	2	0,50	0,60	0,50	0,30
				Subtotal	0,30

0,30	**130,37**	**39,11**
A0602010109	**Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro**	

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00 **255,69** **511,38**

TOTAL 10.02.08.03 550,49

10.02.08.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0305010105 m Tubería FD abastecimiento Ø250 Clase 50

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	193,00			193,00
				Subtotal	193,00
					193,00 **127,56** **24.619,08**

A0403010102 u Válvula de compuerta PN 10/16 DN-300

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
No hay precio de valvula 250 mm	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00 **965,81** **1.931,62**

A0314010134 u Carrete de desmontaje Ø 250 AISI 316L BB

Carrete de desmontaje DN 250 de acero con junta de estanqueidad: - Tipo: brida-brida. - Materiales: - Carrete: inox. AISI-316L, bridas: St.37.2. - Junta de estanqueidad: neopreno. - Tornillerias: AISI 304.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2				2,00
				Subtotal	2,00
					2,00 **521,85** **1.043,70**

TOTAL 10.02.08.04 ..... 27.594,40

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.08.05	**PUESTA EN SERVICIO**			
A1001010105	**m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 193,00 ANCHURA ALTURA	193,00		
	Subtotal	193,00		
		193,00	**1,03**	**198,79**
CYG_Analitica	**u Analiticas de agua**			
	Analiticas de agua			
	Medición			
	UDS 2 LONGITUD ANCHURA ALTURA	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	**668,54**	**1.337,08**
	TOTAL 10.02.08.05			**1.535,87**
10.02.08.06	**GESTION DE RESIDUOS FC**			
D0201010103	**m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.**			
	Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.			
	Medición			
	Excavación: UDS 1 LONGITUD 386,00 ANCHURA ALTURA	386,00		
	arena: UDS -1 LONGITUD 29,70 ANCHURA ALTURA	-29,70		
	Hormigón: UDS -1 LONGITUD 24,60 ANCHURA ALTURA	-24,60		
	Zahorra: UDS -1 LONGITUD 190,30 ANCHURA ALTURA	-190,30		
	Subtotal	141,40		
		141,40	**8,76**	**1.238,66**
GRAO.2a	**m Ret canalización FC Ø<200mm**			
	Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200mm de diámetro realizada empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,105*	*21,52*	*2,26*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,210*	*18,00*	*3,78*
	MMME.4baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3	*0,040*	*65,28*	*2,61*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,087*	*2,00*	*0,17*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,088*	*20,00*	*1,76*
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 193,00 ANCHURA ALTURA	193,00		
	Subtotal	193,00		
		193,00	**11,21**	**2.163,53**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS 1 LONGITUD 141,30 ANCHURA ALTURA	141,30		
	Subtotal	141,30		
		141,30	**11,19**	**1.581,15**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
GRAD.1a	**m3 Depósito materiales con amianto en instalación autorizada**			
	Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 193,00 · ANCHURA · ALTURA 0,05	9,65		
	Subtotal	9,65		
		9,65	**190,80**	**1.841,22**
	TOTAL 10.02.08.06			**6.824,56**
	TOTAL 10.02.08			**67.197,17**
10.02.09	**DISTRIBUCIÓN A URB. LOMA DEL CASTILLO FASE 1**			
10.02.09.01	**DEMOLICIONES Y REPOSICIONES**			
A0102010106	**m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			
	Medición			
	Conexión en C/ Pedro Alcarria · UDS 1 · LONGITUD 10,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA	10,00		
	Subtotal	10,00		
		10,00	**3,05**	**30,50**
A0102010110	**m³ Demolición losa hormigón compresor**			
	Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.			
	Medición			
	Conexión en C/ Pedro Alcarria · UDS 1 · LONGITUD 10,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 0,20	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	**87,82**	**175,64**
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 10,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 0,20	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	**130,37**	**260,74**
A0801010101	**t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D/S, capa de rodadura**			
	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.			
	Medición			
	UDS 2,6 · LONGITUD 10,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 0,06	1,56		
	Subtotal	1,56		
		1,56	**121,62**	**189,73**
D0302010102	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 10,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 0,20	2,00		
	Subtotal	2,00		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2,00	**11,36**	**22,72**
D0302010107	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 10,00 0,10 1,00			
	Subtotal 1,00			
		1,00	**11,36**	**11,36**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 3,00 3,00			
	Subtotal 3,00			
		3,00	**11,19**	**33,57**
	TOTAL 10.02.09.01			**724,26**
10.02.09.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	**m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio**			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Estimado 70% excavable 0,7 567,00 1,00 1,50 595,35			
	Subtotal 595,35			
		595,35	**8,69**	**5.173,59**
A0103020103	**m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno transición duro y roca**			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (incluida), medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Se estima un 30% de roca 0,3 567,00 1,00 1,50 255,15			
	Subtotal 255,15			
		255,15	**16,88**	**4.306,93**
A0104010101	**m³ Relleno zanja arena silícea**			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 567,00 0,60 0,30 102,06			
	Subtotal 102,06			
		102,06	**26,58**	**2.712,75**
A0104010117	**m³ Zahorra artificial plástica**			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Sustitución de la roca excavada 1 255,15 255,15			
	Subtotal 255,15			
		255,15	**12,77**	**3.258,27**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

A0104010102 **m³ Relleno zanja propios seleccionado**

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Excavación	1	850,50			850,50
Arena	-1	102,06			-102,06
Zahorra	-1	255,15			-255,15
				Subtotal	493,29
					493,29

493,29	**9,49**	**4.681,32**

TOTAL 10.02.09.02 ..... 20.132,86

10.02.09.03 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA

A0201030101 **m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Dados valvulería	6	0,50	0,60	0,50	0,90
Acometidas	11	0,50	0,60		3,30
				Subtotal	4,20
					4,20

4,20	**130,37**	**547,55**

A0602010109 **Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro**

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	6				6,00
				Subtotal	6,00
					6,00

6,00	**255,69**	**1.534,14**

TOTAL 10.02.09.03 ..... 2.081,69

10.02.09.04 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED

A0308010110 **m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-10 DN 110**

Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características:
Diámetro: 110 mm
PN-10
Material: PEHD-100
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	567,00			567,00
				Subtotal	567,00
					567,00

567,00	**33,53**	**19.011,51**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

A0403010105 **Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-100**

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	6				6,00
Subtotal					6,00
					6,00

238,36 **1.430,16**

A0314010108 **Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 100 PN 10 BB**

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características:

Tipo: brida-brida
DN-100
PN-10

Materiales:
- Virola: Ac. Inoxidable AISI-316
- Bridas: Ac. carbono
- Junta de estanqueidad: neopreno
- Tornillería: zincada

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	6				6,00
Subtotal					6,00
					6,00

173,19 **1.039,14**

EIFA.1dfb **u Acometida PE <15m Ø40mm**

Acometida en conducciones generales de PE de 160mm de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 40mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Descomposición

MOOF.8a	*h*	*Oficial 1ª fontanería*	*3,500*	*23,87*	*83,55*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*3,500*	*18,00*	*63,00*
PIFA.1dfb	*u*	*Acom<15m PE red ø160mm*	*1,000*	*140,10*	*140,10*
PBPO11bb	*m3*	*HNE-15/B/20 obra*	*0,008*	*114,85*	*0,92*
PIFA16a	*u*	*Derechos enganche acometida*	*1,000*	*330,48*	*330,48*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*6,181*	*2,00*	*12,36*
EFFC.1bdfa		*Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm*	*0,800*	*52,09*	*41,67*
AMME.1abaa	*m³*	*Excv trán cielo abt mman*	*3,600*	*47,32*	*170,35*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*8,424*	*20,00*	*168,49*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	11				11,00
Subtotal					11,00
					11,00

1.071,58 **11.787,38**

TOTAL 10.02.09.04 ..... 33.268,19

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.09.05	**PUESTA EN SERVICIO**			
A1001010105	m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 567,00 567,00			
	Subtotal 567,00			
		567,00	1,03	584,01
CYG_Analitica	u Analiticas de agua			
	Analiticas de agua			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	6 6,00			
	Subtotal 6,00			
		6,00	668,54	4.011,24
	TOTAL 10.02.09.05			**4.595,25**
	TOTAL 10.02.09			**60.802,25**
10.02.10	**URBANIZACIÓN SAN ALVARO FASE 1**			
10.02.10.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 30,00 2,00 1,50 90,00			
	Subtotal 90,00			
		90,00	8,69	782,10
A0104010101	m³ Relleno zanja arena silícea			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 30,00 1,00 0,60 18,00			
	Subtotal 18,00			
		18,00	26,58	478,44
A0104010117	m³ Zahorra artificial plástica			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Excavación 1 90,00 90,00			
	Arena -1 18,00 -18,00			
	Dados hormigón sujección -5 1,00 1,00 1,00 -5,00			
	Subtotal 67,00			
		67,00	12,77	855,59
	TOTAL 10.02.10.01			**2.116,13**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.10.02	**HORMIGONES Y OBRAS DE FABRICA**			
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición (UDS / LONGITUD / ANCHURA / ALTURA)			
	Dados sujección: 5 / 1,00 / 1,00 / 1,00	5,00		
	Subtotal	5,00		
		5,00	**130,37**	**651,85**
A0602010109	**Ud Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierro**			
	Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.			
	Medición (UDS / LONGITUD / ANCHURA / ALTURA)			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**255,69**	**255,69**
A0602010110	**Ud Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierro**			
	Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido			
	Medición (UDS / LONGITUD / ANCHURA / ALTURA)			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**324,89**	**324,89**
	TOTAL 10.02.10.02			**1.232,43**
10.02.10.03	**CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED**			
A0305010107	**m Tubería FD abastecimiento Ø400 Clase 40**			
	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.			
	Medición (UDS / LONGITUD / ANCHURA / ALTURA)			
	1 / 30,00	30,00		
	Subtotal	30,00		
		30,00	**247,64**	**7.429,20**
A0308010109	**m Tubería de polietileno PEDH-100 PN-6/10 DN 160**			
	Tubería de polietileno de alta densidad de las siguientes características: Diámetro: 160 mm PN-6 gravedad, PN-10 bombeo Material: PEHD-10 Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.			

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición			

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1	30,00			30,00
			Subtotal	30,00

	30,00	**43,52**	**1.305,60**

A0403010101 **Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-400**

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 400
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1				1,00
			Subtotal	1,00

	1,00	**2.771,20**	**2.771,20**

A0403010104 **Ud Válvula de compuerta PN 10/16 DN-150**

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Conexiones: Bridas DIN 3202
- Accionamiento: manual por volante

Materiales
- Cuerpo y tapa: FD GGG 50
- Cierre: FD GGG 50 + EPDM/NBR
- Eje: Acero Inoxidable AISI 420
- Revistimiento: Epoxy 150 micras

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1				1,00
			Subtotal	1,00

	1,00	**258,43**	**258,43**

A0314010104 **Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 400 PN 10 BB**

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características:

Tipo: brida-brida
DN-400
PN-10

Materiales:
- Virola: Ac. Inoxidable AISI-316
- Bridas: Ac. carbono
- Junta de estanqueidad: neopreno
- Tornillería: zincada

Medición

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
1				1,00
			Subtotal	1,00

	1,00	**824,75**	**824,75**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0314010107	**Ud Carrete de desmontaje AISI 316 DN 150 PN 10 BB**			
	Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad de las siguientes características: Tipo: brida-brida DN-150 PN-10 Materiales: - Virola: Ac. Inoxidable AISI-316 - Bridas: Ac. carbono - Junta de estanqueidad: neopreno - Tornillería: zincada			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 1,00		
		Subtotal 1,00		
		1,00	**221,72**	**221,72**
	TOTAL 10.02.10.03			**12.810,90**
10.02.10.04	**PUESTA EN SERVICIO**			
A1001010105	**m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		1 60,00 60,00		
		Subtotal 60,00		
		60,00	**1,03**	**61,80**
CYG_Analitica	**u Analiticas de agua**			
	Analiticas de agua			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
		2 2,00		
		Subtotal 2,00		
		2,00	**668,54**	**1.337,08**
	TOTAL 10.02.10.04			**1.398,88**
10.02.10.05	**GESTION DE RESIDUOS FC**			
D0201010103	**m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.**			
	Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.			
	Medición	**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
	Excavación	1 90,00 90,00		
		Subtotal 90,00		
		90,00	**8,76**	**788,40**
GRAO.2a	**m Ret canalización FC Ø<200mm**			
	Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200mm de diámetro realizada empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,105*	*21,52*	*2,26*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,210*	*18,00*	*3,78*
	MMME.4baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3	*0,040*	*65,28*	*2,61*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,087*	*2,00*	*0,17*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,088*	*20,00*	*1,76*

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Tubo 160 mm 1 30,00	30,00		
	Subtotal	30,00		
		30,00	**11,21**	**336,30**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 90,00	90,00		
	Subtotal	90,00		
		90,00	**11,19**	**1.007,10**
GRAD.1a	**m3 Depósito materiales con amianto en instalación autorizada**			
	Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.			
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 30,00 0,02	0,60		
	Subtotal	0,60		
		0,60	**190,80**	**114,48**
	TOTAL 10.02.10.05			**2.246,28**
	TOTAL 10.02.10			**19.804,62**
10.02.11	**INSTALACIONES ELECTROMECANICAS BOMBEOS CHIVA FASE 1**			
10.02.11.01	**SOLANA 3**			
GLO_VARIA	**u VARIADOR DE 250 KW - 460A A 400 V CON IP54 A CARGA PESADA (50ºC)**			
	VARIADOR DE 250 KW - 460A A 400 V CON IP54 A CARGA PESADA (50ºC)			
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**34.713,29**	**34.713,29**
GLO_MONTA	**u MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VARIADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES**			
	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VARIADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES			
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**1.372,62**	**1.372,62**
GLO_FILTR	**u FILTRO SENOIDAL**			
	FILTRO SENOIDAL			
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**15.166,99**	**15.166,99**
GLO_CUADR	**u CUADRO DE POTENCIA**			
	CUADRO DE POTENCIA			
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1,00	18.393,00	18.393,00
	TOTAL 10.02.11.01			**69.645,90**
10.02.11.02	**SOLANA 2**			
GLO_VARIA	u VARIADOR DE 250 KW - 460A A 400 V CON IP54 A CARGA PESADA (50ºC)			
	VARIADOR DE 250 KW - 460A A 400 V CON IP54 A CARGA PESADA (50ºC)			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	34.713,29	34.713,29
GLO_MONTA	u MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VARIADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES			
	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VARIADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	1.372,62	1.372,62
GLO_TRANS	u TRANSFORMADOR			
	TRANSFORMADOR			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	36.746,85	36.746,85
GLO_LÍNEA	m LÍNEA Cu RZ1-K (AS) TRIFÁSICA c/N 0.6/1kV 5x185mm2			
	LÍNEA Cu RZ1-K (AS) TRIFÁSICA c/N 0.6/1kV 5x185mm2			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 20,00	20,00	
		Subtotal	20,00	
		20,00	417,42	8.348,40
	TOTAL 10.02.11.02			**81.181,16**
10.02.11.03	**PAHILLA**			
GLO_CAUDA	u CAUDALÍMETRO ULTRASONIDOS			
	CAUDALÍMETRO ULTRASONIDOS			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	4.130,08	4.130,08
DH01160	u CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO DE CAUDALÍMETRO ULTRASONIDOS			
	CABLEADO Y CONEXIONADO ELÉCTRICO DE CAUDALÍMETRO ULTRASONIDOS			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	1.217,05	1.217,05
	TOTAL 10.02.11.03			**5.347,13**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.11.04	**SAN ALVARO**			
GLO_MOTOR22	u MOTOR ELDIN RA180 22KW			
	MOTOR ELDIN RA180 22KW			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	**8.127,96**	**16.255,92**
GLO_BOMBA	u BOMBA IDEAL RNF52-160			
	BOMBA IDEAL RNF52-160			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**3.309,54**	**3.309,54**
GLO_MOTOR25	u MOTOR ETECH CWM201 25KW			
	MOTOR ETECH CWM201 25KW			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	**12.258,04**	**24.516,08**
GLO_VARIA37	u VARIADOR DE 37 KW - 75A A 400 V CON IP54 A CARGA PESADA (50ºC)			
	VARIADOR DE 37 KW - 75A A 400 V CON IP54 A CARGA PESADA (50ºC)			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**10.040,21**	**10.040,21**
GLO_MONTA	u MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VARIADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES			
	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VARIADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**1.372,62**	**1.372,62**
	TOTAL 10.02.11.04			**55.494,37**
10.02.11.05	**PERENCHIZA**			
GLO_REPAR	u REPARACIÓN CENTRO TRANSFORMACIÓN			
	REPARACIÓN CENTRO TRANSFORMACIÓN			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**3.784,20**	**3.784,20**
	TOTAL 10.02.11.05			**3.784,20**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.11.06	**CALICANTO**			
GLO_MOTOR17	u MOTOR SAER IR40 17KW			
	MOTOR SAER IR40 17KW			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**3.309,54**	**3.309,54**
	TOTAL 10.02.11.06			**3.309,54**
	TOTAL 10.02.11			**218.762,30**
10.02.12	**REPARACIÓN CAMINO ACCESO A POZOS LA SOLANA FASE 1**			
10.02.12.01	**DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
A0103050101	m³ Excavación en terreno flojo para cajeado en calles			
	Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 305,00 3,50 0,40 427,00		
		Subtotal 427,00		
		427,00	**6,05**	**2.583,35**
A0103060103	m Apertura de cunetas			
	Apertura de cuneta mediante retroexcavadora, incluso perfilado y refino, completamente terminada. Sin incluir gestión de tierras.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	estimado 50%	0,5 305,00 152,50		
		Subtotal 152,50		
		152,50	**82,68**	**12.608,70**
A0101010102	m² Despeje y desbroce del terreno			
	Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		305,00 3,50 1.067,50		
		Subtotal 1.067,50		
		1.067,50	**0,56**	**597,80**
DDDV.1bb	m³ Demolición mecánica firme hormigón			
	Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,050*	*21,52*	*1,08*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,100*	*18,00*	*1,80*
	MMME.5gf h Retro de orugas 247cv 1,9m3	*0,200*	*165,31*	*33,06*
	MMME.7a h Suplemento por martillo picador	*0,200*	*29,80*	*5,96*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,419*	*2,00*	*0,84*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,427*	*20,00*	*8,55*
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		305,00 3,50 0,20 213,50		
		Subtotal 213,50		
		213,50	**54,37**	**11.608,00**
	TOTAL 10.02.12.01			**27.397,85**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.12.02	**PAVIMENTO**			
A0104010117	**m³ Zahorra artificial plástica**			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 305,00 · ANCHURA 3,50 · ALTURA 0,20	213,50		
	Subtotal	213,50		
		213,50	**12,77**	**2.726,40**
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	UDS 1 · LONGITUD 305,00 · ANCHURA 3,50 · ALTURA 0,20	213,50		
	Subtotal	213,50		
		213,50	**130,37**	**27.834,00**
UPCH.6b	**m2 Colocación ME 500 T 20x20 ø5**			
	Colocación de mallazo ME 500 T 20x20 ø5 para armado de base o subbase de hormigón.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,050*	*21,52*	*1,08*
	MOOA11a h Peón especializado construcción	*0,050*	*18,59*	*0,93*
	PEAM.3aca m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 4-4	*1,200*	*1,31*	*1,57*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,036*	*2,00*	*0,07*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,037*	*20,00*	*0,73*
	Medición			
	UDS · LONGITUD 305,00 · ANCHURA 3,50 · ALTURA	1.067,50		
	Subtotal	1.067,50		
		1.067,50	**4,64**	**4.953,20**
	TOTAL 10.02.12.02			**35.513,60**
	TOTAL 10.02.12			**62.911,45**
10.02.13	**GESTION DE RESIDUOS**			
	TOTAL 10.02.13			**8.611,10**
10.02.14	**SEGURIDAD Y SALUD**			
	TOTAL 10.02.14			**7.245,61**
10.02.15	**ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)**			
	TOTAL 10.02.15			**37.813,73**
	TOTAL 10.02			**1.046.093,65**
10.03	**ABASTECIMIENTO HIDRACUA**			
10.03.01	**REPARACIONES TUBERÍAS AFECTADAS**			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.03.01.01	**CRUCE BARRANCO SIERRA PERENTXISA**			
A0102010106	**m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			
	Medición			
		UDS 1 · LONGITUD 40,00 · ANCHURA 6,00	240,00	
		Subtotal	240,00	
		240,00	**3,05**	**732,00**
A0103050102	**m³ Excavación en terreno compacto para cajeado en calles**			
	Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
	Medición			
	Preparación del terreno a ambos lados del barranco	UDS 1 · LONGITUD 110,00 · ANCHURA 6,00 · ALTURA 0,20	132,00	
		Subtotal	132,00	
		132,00	**9,11**	**1.202,52**
A0103020102	**m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio**			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición			
	A ambos lados del barranco	UDS 1 · LONGITUD 110,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 2,00	220,00	
		Subtotal	220,00	
		220,00	**8,69**	**1.911,80**
A0104010101	**m³ Relleno zanja arena silícea**			
	Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS 1 · LONGITUD 110,00 · ANCHURA 0,60 · ALTURA 0,40	26,40	
		Subtotal	26,40	
		26,40	**26,58**	**701,71**
A0104010108	**m³ Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas**			
	Relleno tolerable y compactación al 95% del P.M. de zanjas y trasdós de pozos con material procedente de la excavación.			
	Medición			
		UDS 1 · LONGITUD 110,00 · ANCHURA 1,00 · ALTURA 1,50	165,00	
		Subtotal	165,00	
		165,00	**5,75**	**948,75**
A0104010117	**m³ Zahorra artificial plástica**			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	Excavación cajeado	UDS 1 · LONGITUD 132,00	132,00	
	Excavación zanja	UDS 1 · LONGITUD 220,00	220,00	
	Arena	UDS -1 · LONGITUD 26,40	-26,40	
	Seleccionado	UDS -1 · LONGITUD 165,00	-165,00	
		Subtotal	160,60	
		160,60	**12,77**	**2.050,86**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0305010103	m Tubería FD abastecimiento Ø150 Clase 64			
	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Puente cruce barranco a ejecutar	1 50,00	50,00	
	Extremos a conectar	1 110,00	110,00	
	Subtotal		160,00	
		160,00	**74,86**	**11.977,60**
A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Anclajes de hormigón	2 1,00 1,00 1,00	2,00	
	Subtotal		2,00	
		2,00	**130,37**	**260,74**
A0803010108	m² Reposición pavimento viales			
	Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor, con material similar al existente.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 240,00	240,00	
	Subtotal		240,00	
		240,00	**36,23**	**8.695,20**
D0201010103	m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.			
	Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	zahorra	1 160,60	160,60	
	Arena	1 26,40	26,40	
	Subtotal		187,00	
		187,00	**8,76**	**1.638,12**
D0302010107	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 240,00 0,12	28,80	
	Subtotal		28,80	
		28,80	**11,36**	**327,17**
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 187,00	187,00	

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	28,80			28,80		
					Subtotal	215,80		
						215,80	**11,19**	**2.414,80**
A1001010105	**m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**							
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.							
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**			
		1	160,00			160,00		
					Subtotal	160,00		
						160,00	**1,03**	**164,80**
CYG_Analitica	**u Analiticas de agua**							
	Analiticas de agua							
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**			
		2				2,00		
					Subtotal	2,00		
						2,00	**668,54**	**1.337,08**
HID_ANCTUB	**u Anclaje para sujeccion tuberia tablero**							
	Anclaje para sujeccion tuberia tablero							
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**			
		25				25,00		
					Subtotal	25,00		
						25,00	**79,50**	**1.987,50**
						TOTAL 10.03.01.01		**36.350,65**
10.03.01.02	**CRUCE BARRANCO HACIA CALLE 21**							
A0201030101	**m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0**							
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.							
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**			
	Dados conexiones	2	1,00	1,00	1,00	2,00		
					Subtotal	2,00		
						2,00	**130,37**	**260,74**
A0305010103	**m Tubería FD abastecimiento Ø150 Clase 64**							
	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.							
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**			
		1	42,00			42,00		
					Subtotal	42,00		
						42,00	**74,86**	**3.144,12**
HID_CONTADOR	**u Contador general para tubería dn 150**							
	Contador general para tubería dn 150, incluidos accesorios necesarios para su instalacion sobre la tuberia, arqueta e incluso unidad de telelectura.							
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**			
		1				1,00		
					Subtotal	1,00		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1,00	**3.975,00**	**3.975,00**
GRAO.2a	**m Ret canalización FC Ø<200mm**			
	Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200mm de diámetro realizada empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,105*	*21,52*	*2,26*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,210*	*18,00*	*3,78*
	MMME.4baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3	*0,040*	*65,28*	*2,61*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,087*	*2,00*	*0,17*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,088*	*20,00*	*1,76*
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 40,00	40,00		
	Subtotal	40,00		
		40,00	**11,21**	**448,40**
GRAD.1a	**m3 Depósito materiales con amianto en instalación autorizada**			
	Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 40,00 0,02	0,80		
	Subtotal	0,80		
		0,80	**190,80**	**152,64**
A1001010105	**m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm**			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 42,00	42,00		
	Subtotal	42,00		
		42,00	**1,03**	**43,26**
CYG_Analitica	**u Analiticas de agua**			
	Analiticas de agua			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**668,54**	**668,54**
	TOTAL 10.03.01.02			**8.692,70**
10.03.01.03	**TUBERIA EN CORTAFUEGOS ENTRE CALLES 8 Y 16**			
A0103050102	**m³ Excavación en terreno compacto para cajeado en calles**			
	Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Zona sin urbanizar preparación terreno 1 74,00 6,00 0,20	88,80		
	Subtotal	88,80		
		88,80	**9,11**	**808,97**
A0102010106	**m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm**			
	Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa e=10/20 cm, por medios mecánicos, incluso carga a camión.			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Cruce calle	1	10,00	6,00		60,00
				Subtotal	60,00
					60,00

60,00 **3,05** **183,00**

A0102010105 **m³ Demolición de muros, losas o soleras de hormigón armado**

Demolición de muros, losas, o soleras de hormigón armado, con martillo compresor, incluso carga a camion.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Cruce calle	1	10,00	1,00	0,20	2,00
				Subtotal	2,00
					2,00

2,00 **60,74** **121,48**

A0103020102 **m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio**

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	84,00	1,00	2,00	168,00
				Subtotal	168,00
					168,00

168,00 **8,69** **1.459,92**

A0104010101 **m³ Relleno zanja arena silícea**

Arena silícea para asiento de tuberías, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	84,00	0,60	0,40	20,16
				Subtotal	20,16
					20,16

20,16 **26,58** **535,85**

A0104010108 **m³ Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas**

Relleno tolerable y compactación al 95% del P.M. de zanjas y trasdós de pozos con material procedente de la excavación.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	74,00	1,00	2,00	148,00
arena	-1		20,16		-20,16
cajeado	1		88,80		88,80
				Subtotal	216,64
					216,64

216,64 **5,75** **1.245,68**

A0104010117 **m³ Zahorra artificial plástica**

Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
cruce	1	10,00	1,00	2,00	20,00
arena	-1	10,00	0,60	0,40	-2,40
				Subtotal	17,60
					17,60

17,60 **12,77** **224,75**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0305010103	m Tubería FD abastecimiento Ø150 Clase 64			

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	84,00			84,00
				Subtotal	84,00
					84,00 **74,86** **6.288,24**

A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			

Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Anclajes	2	1,00	1,00	1,00	2,00
cruce	1	10,00	1,00	0,20	2,00
				Subtotal	4,00
					4,00 **130,37** **521,48**

A0803010108	m² Reposición pavimento viales			

Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor, con material similar al existente.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	10,00	6,00		60,00
				Subtotal	60,00
					60,00 **36,23** **2.173,80**

D0201010103	m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.			

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
hormigon	1	4,00			4,00
arena	1	20,16			20,16
zahorra	1	17,60			17,60
				Subtotal	41,76
					41,76 **8,76** **365,82**

D0302010107	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).			

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1		60,00	0,12	7,20
				Subtotal	7,20
					7,20 **11,36** **81,79**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
GRAD.1a	m3 Depósito materiales con amianto en instalación autorizada			
	Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 84,00 0,02 1,68		
		Subtotal 1,68		
		1,68	**190,80**	**320,54**
GRAO.2a	m Ret canalización FC Ø<200mm			
	Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200mm de diámetro realizada empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.			
	Descomposición			
	MOOA.8a h Oficial 1ª construcción	*0,105*	*21,52*	*2,26*
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,210*	*18,00*	*3,78*
	MMME.4baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3	*0,040*	*65,28*	*2,61*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,087*	*2,00*	*0,17*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,088*	*20,00*	*1,76*
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 84,00 84,00		
		Subtotal 84,00		
		84,00	**11,21**	**941,64**
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 41,76 41,76		
		1 7,20 7,20		
		Subtotal 48,96		
		48,96	**11,19**	**547,86**
A1001010105	m Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm			
	Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de DN < 300 mm.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 84,00 84,00		
		Subtotal 84,00		
		84,00	**1,03**	**86,52**
CYG_Analitica	u Analiticas de agua			
	Analiticas de agua			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2 2,00		
		Subtotal 2,00		
		2,00	**668,54**	**1.337,08**
CYG_RETRO	h Medios auxiliares para montaje de tuberia			
	Medios auxiliares para montaje de tuberia			
	Descomposición			
	MMME.4abb h Retro de neum s/palafrtl 0,4m3	*1,000*	*53,06*	*53,06*
	Medición			
	estimación de dos semanas de trabajo	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2 5,00 8,00 80,00		
		Subtotal 80,00		
		80,00	**56,24**	**4.499,20**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 10.03.01.03			**21.743,62**
	TOTAL 10.03.01			**66.786,97**
10.03.02	**REPARACIÓN DEPÓSITO AGUA POTABLE**			
10.03.02.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES**			
D0302010102	**m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)**			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 601,34 601,34		
		1 81,72 81,72		
		Subtotal 683,06		
		683,06	**11,36**	**7.759,56**
D0201010103	**m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.**			
	Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	desbroce	1 560,00 0,20 112,00		
	Excavación	1 300,00 300,00		
		Subtotal 412,00		
		412,00	**8,76**	**3.609,12**
D0303000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de demolición**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 683,06 683,06		
		1 412,00 412,00		
		Subtotal 1.095,06		
		1.095,06	**11,19**	**12.253,72**
A0102010110	**m³ Demolición losa hormigón compresor**			
	Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Forjado depósito	1 34,50 58,10 0,30 601,34		
		Subtotal 601,34		
		601,34	**87,82**	**52.809,68**
A0102010107	**m³ Demolición elemento de hormigón**			
	Demolición de elemento de hormigón en masa con medios manuales y martillo neumático, previo levantado elemento y carga manual sobre camión o contenedor.			
	Medición			
		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	pilares a reconstruir	15 0,40 0,40 5,00 12,00		
	Muro hundido	1 58,10 0,40 2,50 58,10		
	vigas	1 58,10 0,40 0,50 11,62		
		Subtotal 81,72		
		81,72	**122,20**	**9.986,18**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
AMME.5c	**m² Refino y acabado**			
	Refino y acabado de la excavación en tránsito medio o talud inclinado.			
	Descomposición			
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,010*	*18,00*	*0,18*
	MMME.5fd h Retro de orugas 150cv 1,4m3	*0,013*	*136,60*	*1,78*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,020*	*20,00*	*0,39*
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	440,00	440,00		
	Subtotal	440,00		
		440,00	**2,49**	**1.095,60**
AMMD.1a	**m2 Despeje y desbroce terreno**			
	Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.			
	Descomposición			
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,016*	*18,00*	*0,29*
	MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3	*0,004*	*138,43*	*0,55*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,008*	*2,00*	*0,02*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,009*	*20,00*	*0,17*
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	440,00	440,00		
	Subtotal	440,00		
		440,00	**1,09**	**479,60**
AMMD.2b	**u Desmonte árbol c/tocón**			
	Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.			
	Descomposición			
	MOOJ.8a h Oficial jardinero	*1,000*	*18,58*	*18,58*
	MOOJ11a h Peón jardinero	*2,000*	*16,30*	*32,60*
	MMMO.9a h Motosierra	*1,000*	*2,44*	*2,44*
	MMME.4cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3	*0,750*	*62,61*	*46,96*
	MMMT14bbb h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes	*1,000*	*69,35*	*69,35*
	%0200 % Medios auxiliares	*1,699*	*2,00*	*3,40*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*1,733*	*20,00*	*34,67*
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	8	8,00		
	Subtotal	8,00		
		8,00	**220,48**	**1.763,84**
AMME.1bbbb	**m³ Excv trán cielo abt mmec**			
	Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a gestor de residuos autorizado a un distancia menor de 10km.			
	Descomposición			
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,001*	*18,00*	*0,02*
	MMME.5fd h Retro de orugas 150cv 1,4m3	*0,028*	*136,60*	*3,82*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,038*	*2,00*	*0,08*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,039*	*20,00*	*0,78*
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	58,00 1,50 1,50	130,50		
	Subtotal	130,50		
		130,50	**4,98**	**649,89**
	TOTAL 10.03.02.01			**90.407,19**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

10.03.02.02 ESTRUCTURAS

A0201050103 **m³ Hórmigón HA-30/F/20/XD2+XA2+XS2, en vigas y pilares**

Hormigón en vigas y pilares de HA-30/F/20/XD2+XA2+XS2, , fabricado en central, incluso colocación y vibrado.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
pilares a reconstruir	15	0,40	0,40	5,00	12,00
vigas	1	58,10	0,40	0,50	11,62
muro	1	58,10	0,40	2,50	58,10
				Subtotal	81,72

81,72	**151,41**	**12.373,23**

EEFH.1abababadibcm2 Forj hrz doble vig pret 25+5 cm

Forjado unidireccional horizontal de 25+5 cm de canto ejecutado con doble vigueta pretensada dispuesta con intereje de 80 cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante bomba con hormigón HA-40/B/20/XS1 sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 11.45 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según Código Estructural.

Descomposición

MOOA.8a	*h*	*Oficial 1ª construcción*	*0,273*	*21,52*	*5,87*
MOOA10a	*h*	*Ayudante construcción*	*0,273*	*18,59*	*5,08*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*0,137*	*18,00*	*2,47*
MOOB.7a	*h*	*Oficial montador ferralla*	*0,133*	*23,90*	*3,18*
MOOB12a	*h*	*Peón ordinario ferralla*	*0,133*	*18,91*	*2,52*
MMMH.3a	*h*	*Bom H sob cmn 1065l*	*0,012*	*185,16*	*2,22*
MMMH15a	*h*	*Vibrador gasolina aguja ø30-50mm*	*0,100*	*2,12*	*0,21*
PEAA.3ck		*Acero corru B 500 S ø6-16*	*1,950*	*1,12*	*2,18*
PEAA.2c	*kg*	*Acero B 500 S elaborado*	*9,500*	*1,12*	*10,64*
PEPG.4a	*m*	*Vigueta pretensada H=18*	*2,745*	*7,06*	*19,38*
PBPC34cbcaaa	*m³*	*HA-40/F/20/XS1*	*0,098*	*149,92*	*14,69*
PBAA.1a	*m3*	*Agua*	*0,100*	*1,08*	*0,11*
PEHB.1bh	*u*	*Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm*	*6,210*	*1,10*	*6,83*
PEAM.3abb	*m2*	*Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5*	*1,050*	*2,03*	*2,13*
%0350	*%*	*Costes directos complementarios*	*0,775*	*3,50*	*2,71*
EEHF.1aa	*m2*	*Encf continuo fjdo vig pla*	*1,050*	*13,66*	*14,34*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*0,946*	*20,00*	*18,91*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Forjado depósito	1	34,50	58,10		2.004,45
				Subtotal	2.004,45

2.004,45	**120,28**	**241.095,25**

A0203010102 **kg Acero para armaduras en barras B500S**

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
por cuantias	1		81,72	100,00	8.172,00
				Subtotal	8.172,00

8.172,00	**2,17**	**17.733,24**

A0202010106 **m² Encofrado plano en pilares**

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y limpieza.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	60	0,40		5,00	120,00
				Subtotal	120,00

120,00	**30,76**	**3.691,20**

A0202010107 **m² Encofrado plano en vigas**

Encofrado plano en vigas, incluso desencofrado y limpieza.

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	58,10	0,40		23,24
	2	58,10	0,50		58,10
				Subtotal	81,34
					81,34

		81,34	**29,79**	**2.423,12**

A0202010101 **m² Encofrado recto en paramentos verticales**

Encofrado recto en paramentos verticales, incluso suministro, colocación y desencofrado.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	2	58,10		2,50	290,50
				Subtotal	290,50
					290,50

	290,50	**35,04**	**10.179,12**

TOTAL 10.03.02.02 ..... 287.495,16

10.03.02.03 PROTECCION DE LADERAS

AMPC10bbb **m² HA-30/F/12/X0 gunitado vía1 húmeda 10 cm**

Capa de 10 cm de espesor de hormigón gunitado por vía húmeda, para protección de taludes, de 30N/mm2 de resistencia a compresión, añadiendo el aditivo 4 ó 5 m antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador, incluido suministro, maquinaria de proyección y curado.

Descomposición

MOOA.8a	*h*	*Oficial 1ª construcción*	*0,150*	*21,52*	*3,23*
MOOA11a	*h*	*Peón especializado construcción*	*0,300*	*18,59*	*5,58*
PBPC26cccaaa	*m³*	*HA-30/F/12/X0*	*0,230*	*130,84*	*30,09*
PBAA.1a	*m3*	*Agua*	*0,060*	*1,08*	*0,06*
PBAI13b	*kg*	*Aditivo p/H-gunitado*	*3,000*	*2,06*	*6,18*
MMMH10a	*h*	*Gunitadora*	*0,150*	*14,15*	*2,12*
MMMI.3da	*h*	*Compr diésel 8m3*	*0,150*	*6,30*	*0,95*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*0,482*	*2,00*	*0,96*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*0,492*	*20,00*	*9,83*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Protección talud	1		440,00		440,00
				Subtotal	440,00
					440,00

440,00	**62,54**	**27.517,60**

AMPC.1cbb **m² Protección talud malla 8x10-16 reforzada**

Protección para taludes realizada con malla galvanizada de triple torsión de 80x100mm de paso de malla (tipo reforzada) y de 2.7mm de diámetro, anclada en cabeza de talud con viga de hormigón de 1x1.25m, reforzada con un bulón de acero cada 16m2, de 25mm de diámetro y 1.5m de profundidad, inyectados con lechada de cemento, con cabeza completa constituida por placa y tuerca y cable de refuerzo de 12mm de diámetro en disposición perimetral y diagonal.

Descomposición

MOOA.8a	*h*	*Oficial 1ª construcción*	*0,290*	*21,52*	*6,24*
MOOA12a	*h*	*Peón ordinario construcción*	*0,605*	*18,00*	*10,89*
MMME.1a	*h*	*Martillo rompedor con excavadora*	*0,016*	*132,61*	*2,12*
MMMG.6b	*h*	*Grúa autopropulsada 20T*	*0,016*	*87,38*	*1,40*
MMMK.6a	*h*	*Equipo inyección lechada*	*0,010*	*17,32*	*0,17*
PBPL.1k	*m3*	*Lechada para inyecciones CEM I 42.5 R*	*0,001*	*305,80*	*0,31*
PEAA.3bk		*Acero corru B 400 SD ø6-16*	*0,700*	*1,08*	*0,76*
PBPC26abbaaa	*m3*	*HM-20/B/20/X0*	*0,060*	*111,32*	*6,68*
PEAG.3b	*m2*	*Enrejado 8x10-15*	*1,150*	*2,98*	*3,43*
PBUW.1e	*kg*	*Alambre galv n.10ø1.5mm mazos5kg*	*0,200*	*5,99*	*1,20*
PEAA13a	*m*	*Cable acero galvanizado (6x19+1) 12 mm*	*1,350*	*6,27*	*8,46*
%0200	*%*	*Medios auxiliares*	*0,417*	*2,00*	*0,83*
%2000	*%*	*Incremento por coyuntura DANA*	*0,425*	*20,00*	*8,50*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
		440,00			440,00
				Subtotal	440,00
					440,00

440,00	**54,05**	**23.782,00**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 10.03.02.03			**51.299,60**
10.03.02.04	**LIMPIEZA Y DESINFECCION**			
HID_DESINF	u Limpieza y desinfección de depósito por empresa acreditada			
	Limpieza y desinfección de depósito por empresa acreditada			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 1,00		
		Subtotal 1,00		
		1,00	**3.807,52**	**3.807,52**
	TOTAL 10.03.02.04			**3.807,52**
	TOTAL 10.03.02			**433.009,47**
10.03.03	**GESTION DE RESIDUOS**			
	TOTAL 10.03.03			**29.987,79**
10.03.04	**SEGURIDAD Y SALUD**			
	TOTAL 10.03.04			**9.995,93**
10.03.05	**ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)**			
	TOTAL 10.03.05			**53.978,02**
	TOTAL 10.03			**593.758,18**
10.04	**DEPURACIÓN EGEVASA**			
10.04.01	**DEPURADORA CHIVA**			
10.04.01.01	**COLECTOR DE SALIDA**			
10.04.01.01.01	**ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO**			
A0102010107	m³ Demolición elemento de hormigón			
	Demolición de elemento de hormigón en masa con medios manuales y martillo neumático, previo levantado elemento y carga manual sobre camión o contenedor.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Colector	1 100,00 0,50 50,00		
	Muro contención	1 100,00 0,30 1,00 30,00		
		Subtotal 80,00		
		80,00	**122,20**	**9.776,00**
A0103010101	m³ Excavación a cielo abierto en todo tipo de terrenos			
	Excavación a cielo abierto con medios mecánicos en todo tipo de terrenos incluso agotamiento.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Preparación del terreno	1 100,00 2,00 1,00 200,00		
		Subtotal 200,00		
		200,00	**9,72**	**1.944,00**
D0201010103	m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.			
	Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 200,00 200,00		
	Excavación desvío	1 120,00 120,00		
	Ataguias	-1 20,00 -20,00		
		Subtotal 300,00		
		300,00	**8,76**	**2.628,00**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D0302010102	m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)			
	Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 80,00 80,00		
		Subtotal 80,00		
		80,00	**11,36**	**908,80**
D0303000001	m³ Canon vertido productos resultantes de demolición			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de demoliciones, medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 380,00 380,00		
		Subtotal 380,00		
		380,00	**11,19**	**4.252,20**
A0104010118	m³ Terraplén suelos seleccionados propios			
	Terraplén formado con suelos propios seleccionados, incluso nivelación y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Ataguias	2 5,00 2,00 1,00 20,00		
		Subtotal 20,00		
		20,00	**9,53**	**190,60**
A0103020102	m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio			
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	zanja para desvio de cauce	1 120,00 1,00 1,00 120,00		
		Subtotal 120,00		
		120,00	**8,69**	**1.042,80**
A0103040101	Ud Mano de obra de bomba para agot. o rebaj. del N.F.			
	Incluye el transporte, el montaje y el desmontaje en obra de la bomba para agotamiento o rebajamiento del nivel freático.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Estimado 3 meses	3 22,00 66,00		
		Subtotal 66,00		
		66,00	**119,21**	**7.867,86**
A0103040104	h Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 60 m³/h			
	Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 60 m³/h.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Estimado 3 meses	3 22,00 8,00 528,00		
		Subtotal 528,00		
		528,00	**8,95**	**4.725,60**
	TOTAL 10.04.01.01.01			**33.335,86**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

10.04.01.01.02 COLECTOR

A0201040103 **m³ HA-25/B/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 en eltos horizontales vertido bomba**

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20, con clase general de exposición X0, XC2, XC3 ó XC4, elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Cimentación muro contención	1	100,00	0,50	0,50	25,00
				Subtotal	25,00
					25,00 **135,00** **3.375,00**

A0201040106 **m³ HA-25/B/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 en eltos verticales vertido bomba**

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20, con clase general de exposición X0, XC2, XC3 ó XC4, elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	100,00	0,25	1,00	25,00
				Subtotal	25,00
					25,00 **140,93** **3.523,25**

A0202010101 **m² Encofrado recto en paramentos verticales**

Encofrado recto en paramentos verticales, incluso suministro, colocación y desencofrado.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Cimentación	2	100,00	0,50	1,00	100,00
Muro	2	100,00	1,00	1,00	200,00
				Subtotal	300,00
					300,00 **35,04** **10.512,00**

A0203010103 **kg Acero corrugado B (500 SD)**

Acero en barras corrugadas (B 500 SD), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico, , incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados y separadores.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Cimentaciones	1		25,00	75,00	1.875,00
Muros	1		25,00	125,00	3.125,00
				Subtotal	5.000,00
					5.000,00 **1,54** **7.700,00**

A0103020102 **m³ Excavación zanja, medios mecánicos, terreno medio**

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes), medido sobre perfil.

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	100,00	2,00	1,50	300,00
				Subtotal	300,00
					300,00 **8,69** **2.607,00**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0301030105	m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 S/R			
	Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1 100,00 100,00			
	Subtotal 100,00			
		100,00	126,30	12.630,00
A0201030101	m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0			
	Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, vibrado y colocación, según Código Estructural.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Asiento y riñones tubo 1 100,00 1,50 1,10 165,00			
	Tubo -1 100,00 0,50 -50,00			
	Subtotal 115,00			
		115,00	130,37	14.992,55
A0104010117	m³ Zahorra artificial plástica			
	Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Excavación 1 300,00 300,00			
	Hormigón (sin descontar tubo) -1 115,00 -115,00			
	Subtotal 185,00			
		185,00	12,77	2.362,45
A0601030101	u Pozo de registro HM-H in situ D=100 cm H=2,00 m			
	Pozo de registro de hormigón in-situ hasta 2 m de profundidad y diámetros Ø =1000 mm , incluso encofrados, tapa de fundición, parte proporcional de entramados metálicos y barandillas, pates y juntas de impermeabilización, según planos de detalles del proyecto.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	3 3,00			
	Subtotal 3,00			
		3,00	1.292,46	3.877,38
A0603010101	m Pate polipropileno con alma de acero recubierto de polipropileno			
	Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	8 8,00			
	Subtotal 8,00			
		8,00	12,64	101,12
A0603010104	Ud Tapa estanca circular FD Ø min 60 cm D-400			
	Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil estanca (atornillada) clase D-400.Totalmente colocada y enrasada con la superficie.			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	3				3,00
				Subtotal	3,00
					3,00

3,00 **128,74** **386,22**

E050100003 **m Limpieza de colector de hasta 1000 mm de diámetro con camión aspirador**

Limpieza de colector de hasta 1000 mm de diámetro con camión aspirador colmatado de lodo

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Limpieza del colector de salida	1	500,00			500,00
				Subtotal	500,00
					500,00

500,00 **26,71** **13.355,00**

TOTAL 10.04.01.01.02 ..... 75.421,97

TOTAL 10.04.01.01 ..... 108.757,83

10.04.01.02 ADECUACIÓN DE CAMINO

A0101010109 **m² Escarificado del firme actual**

Escarificado del firme existente, en una profundidad mínima de 20 cm., con acopio, carga y transporte del firme escarificado, incluso rasanteo y compactación de la superficie escarificada.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Reparación camino dañado	1	500,00	3,50		1.750,00
				Subtotal	1.750,00
					1.750,00

1.750,00 **0,58** **1.015,00**

A0104010117 **m³ Zahorra artificial plástica**

Zahorra artificial plástica para firme granular, según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Camino dañado	1	500,00	3,50	0,20	350,00
				Subtotal	350,00
					350,00

350,00 **12,77** **4.469,50**

A0104010114 **m³ Escolleras piedras 50-200 kg**

Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportación, colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre perfil.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	500,00	0,50	1,50	375,00
				Subtotal	375,00
					375,00

375,00 **18,50** **6.937,50**

TOTAL 10.04.01.02 ..... 12.422,00

10.04.01.03 EDAR O.C.

A0102010120 **m³ Demolición mecánica de hormigón armado con retro**

Demolición de muros y losas de hormigón armado con retroexcavadora, incluso retirada de material a vertedero, terminado.

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	1	240,00	0,20	0,60	28,80
				Subtotal	28,80
					28,80

28,80 **89,41** **2.575,01**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A0801040103	m Cerramiento muro de bloque y malla simple torsión			
	Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigón HM-20, muro de fábrica de bloques prefabricados blancos de 90 cm de altura con albardilla de coronación en color blanco y cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de simple torsión de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1 240,00 240,00		
		Subtotal 240,00		
		240,00	**78,29**	**18.789,60**
UJPP.1aabb	u Plantación conífera 80-150cm alt			
	Replanteo, presentación y plantación de conífera de entre 80-150cm de altura en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando mediante medios manuales, relleno con tierras propias y un 30% de tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol.			
	Descomposición			
	MOOJ.8a h Oficial jardinero	*0,067*	*18,58*	*1,24*
	MOOJ11a h Peón jardinero	*0,364*	*16,30*	*5,93*
	PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada	*0,065*	*25,80*	*1,68*
	PBAA.1a m3 Agua	*0,050*	*1,08*	*0,05*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,089*	*2,00*	*0,18*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,091*	*20,00*	*1,82*
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		4 240,00 960,00		
		Subtotal 960,00		
		960,00	**11,55**	**11.088,00**
	TOTAL 10.04.01.03			**32.452,61**
10.04.01.04	**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EDAR**			
CYG_ULTRASO	u Sensor de ultrasonidos para caudalimetro Parshall			
	Sensor de ultrasonidos para caudalimetro Parshall			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	1 1,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
		Subtotal 1,20		
		1,20	**2.803,70**	**3.364,44**
CYG_BOMBAREC	u Bomba de recirculación de la planta			
	Bomba de recirculación de la planta			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	3 3,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
		Subtotal 3,20		
		3,20	**2.165,24**	**6.928,77**
CYG_BOMBAPRET	u Bomba pretratamiento de la planta			
	Bomba pretratamiento de la planta			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	2 2,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
		Subtotal 2,20		
		2,20	**6.398,06**	**14.075,73**

DANA_LOTE_4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CYG_ROT	u Equipo ROT-TTS35			
	Equipo ROT-TTS35			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	1 1,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
	Subtotal	1,20		
		1,20	**8.427,00**	**10.112,40**
CYG_SONDAO2	u Sonda de medición de O2			
	Sonda de medición de O2			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	2 2,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
	Subtotal	2,20		
		2,20	**3.074,00**	**6.762,80**
CYG_SONDAP	u Sonda medidión de fosforo			
	Sonda medidión de fosforo			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	1 1,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
	Subtotal	1,20		
		1,20	**16.165,00**	**19.398,00**
CYG_TOMAM	u Tomamuestras para analisis de aguas residuales			
	Tomamuestras para analisis de aguas residuales			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	2 2,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
	Subtotal	2,20		
		2,20	**4.300,42**	**9.460,92**
CYG_CCM	u CCM a reparar o sustituir			
	CCM a reparar o sustituir			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	1 1,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
	Subtotal	1,20		
		1,20	**37.100,00**	**44.520,00**
CYG_VARIAD	u Variadores a sustituir			
	Variadores a sustituir			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	1 1,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
	Subtotal	1,20		
		1,20	**24.380,00**	**29.256,00**
CYG_AUTO	u Automatismos a sustituir			
	Automatismos a sustituir			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	equipo	1 1,00		
	suplemento montaje/desmontaje	0,2 0,20		
	Subtotal	1,20		
		1,20	**20.140,00**	**24.168,00**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 10.04.01.04			**168.047,06**
10.04.01.05	**GESTION DE RESIDUOS**			
	TOTAL 10.04.01.05			**4.608,97**
10.04.01.06	**SEGURIDAD Y SALUD**			
	TOTAL 10.04.01.06			**6.433,59**
10.04.01.07	**ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)**			
	TOTAL 10.04.01.07			**33.272,21**
	TOTAL 10.04.01			**365.994,27**
10.04.02	**DEPURACIÓN URB. LA LOMA EGEVASA**			
10.04.02.01	**DEPURACIÓN URB. LA LOMA EGEVASA**			
DDDS.1ac	**m² Desescombro manual m² plano horizontal e20**			
	Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición con un espesor medio en 20cm ubicados en un plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.			
	Descomposición			
	MOOA12a h Peón ordinario construcción	*0,300*	*18,00*	*5,40*
	PBAA.1a m3 Agua	*0,003*	*1,08*	*0,00*
	%0200 % Medios auxiliares	*0,054*	*2,00*	*0,11*
	%2000 % Incremento por coyuntura DANA	*0,055*	*20,00*	*1,10*
	Medición — **UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**			
	limpieza de depuradora: 1 · 15,00 · 15,00	225,00		
	Subtotal	225,00		
		225,00	**7,01**	**1.577,25**
EGEV_DECANT	**u Decantador estatico de 5 m. de diámetro y 4,45 m de altura, incluido vertedro de salida. Instalado**			
	Decantador estatico de 5 m. de diámetro y 4,45 m de altura, incluido vertedro de salida. Instalado			
	Medición — **UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**			
	Sustitución completa de decantador por rotura: 1	1,00		
	Subtotal	1,00		
		1,00	**73.670,00**	**73.670,00**
D0201010103	**m³ Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.**			
	Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.			
	Medición — **UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**			
	1 · 225,00 · 0,20	45,00		
	Subtotal	45,00		
		45,00	**8,76**	**394,20**
D0202000001	**m³ Canon vertido productos resultantes de excavaciones**			
	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones, medido sobre perfil.			
	Medición — **UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**			
	1 · 45,00	45,00		
	Subtotal	45,00		
		45,00	**4,46**	**200,70**
	TOTAL 10.04.02.01			**75.842,15**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.04.02.02	GESTION DE RESIDUOS			
	TOTAL 10.04.02.02			2.275,26
10.04.02.03	SEGURIDAD Y SALUD			
	TOTAL 10.04.02.03			1.516,84
10.04.02.04	ADICIONAL LIQUIDACIÓN (10%)			
	TOTAL 10.04.02.04			7.963,43
	TOTAL 10.04.02			87.597,68
	TOTAL 10.04			453.591,95
	TOTAL 10			3.320.049,91
	TOTAL			3.320.049,91

ANEXO 5. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA OBRA YA EJECUTADA

FACTURAS UTE CHIVA

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	Ayuntamiento
Servicio Agua Potable y Alcantarillado	1319	La Hoya de Buñol (Valencia)

CYGSA (CONTROL Y GEOLOGÍA SA)

	Agua Potable	Saneamiento	Total
01 Coste Operación	49.937,47 €	365.592,96 €	415.530,43 €
02 Actuación Singular (ejecutadas)	343.480,58 €	336.965,16 €	680.445,74 €
Total PEM	393.418,05 €	702.558,12 €	**1.095.976,17 €**

Resumen	Agua Potable	Saneamiento	Total
FASE 0	393.418,05 €	487.518,80 €	880.936,84 €
FASE 1		215.039,33 €	215.039,33 €
FASE 2			
Total PEM	393.418,05 €	702.558,12 €	**1.095.976,17 €**
Total PEC			
Total (IVA)			

Detalle

Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
Fase 0 - AP: Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transportes, dietas y alojamientos para personal desplazado, incluida horas extras.	Agua Potable	DO1_CPer003: Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantia del servicio durante la DANA y días posteriores - Agua Potable - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	15.140,08 €
Fase 0 - ALC: Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transportes, dietas y alojamientos para personal desplazado, incluida horas extras.	Saneamiento	DO1_CPer004: Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantia del servicio durante la DANA y días posteriores - Saneamiento - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.316,79 €
Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable	Agua Potable	DO1_CAn031: Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	10.032,07 €
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DO1_CElect002: Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	20.701,34 €
Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable	Agua Potable	DO1_Ccl001: Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	2.760,25 €
Fase 0 - AP: Gastos extraordinarios por el apoyo a voluntarios (alojamiento, manutención). Reparaciones de instalaciones interiores (grupos de presión, nuevas acometidas domiciliarias, inventario estado instalaciones)	Agua Potable	DO1_CInt002: Trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios del servicio durante los dias posteriores a la DANA - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.303,73 €
Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido.	Saneamiento	DO1_LAi007: Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	148.096,84 €
Fase 0 - ALC: Realización de análisis extraordinarios de vertidos. SAT control microbiológico	Saneamiento	DO1_CAVert050: Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.140,00 €
		- I	: -	
Fase 0 - AP: Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados	Agua Potable	DO1_CCubasAP007: Suministro Cubas Agua Potable al municipio - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	21.140,00 €
Fase 0 - ALC: Habilitación de puntos provisionales de vertido de lodos para agilizar trabajos de limpieza saneamiento.	Saneamiento	DO1_Ccamp007: Habilitación de Campas Intermerdias, para agilizar los trabajos de campo de retirada de lodos procedentes de la red de alcantarillado. - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	36.841,14 €

Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
Fase 0 - AP: Obras de instalalación de conducciones provisionales para abastecimiento (bypass de conducciones de agua, etc)	Agua Potable	DO1_AS002: Canalización provisional para la reposición del servicio en diversas áreas del núcleo urbano de Chiva - Tendido de tuberías provisionales para la reposición del servicio en varias calles del casco urbano afectas por el crecimiento del barranco del Poyo, especialmente en C/ Ramón y Cajal y C/ Enrique Ponce. I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Provisional - Ejecutado	34.488,79 €
Fase 0 - AP: Obras de instalalación de conducciones provisionales para abastecimiento (bypass de conducciones de agua, etc)	Agua Potable	DO1_AS003: Canalización provisional para la reposición del servicio a urbanizaciones por el bco. del Gallego - Tendido de tubería provisional en el cruce del barranco de Gállego con Camino Sierra Perenchiza para abastecimiento a urbanizaciones I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Provisional - Ejecutado	29.512,16 €
Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable	Agua Potable	DO1_AS103: Reparación de emergencia de fuga en tubería a urbanizaciones cercano a CV-50 - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	15.770,82 €
Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable	Agua Potable	DO1_AS014: Renovación de la tubería de suministro a la urbanización San Álvaro y red de distribución afectada - I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - No Iniciado	15.749,16 €
Fase 0 - AP: Ejecución de obras singulares para la reposición del suministro de agua potable (cruces de ríos, barrancos, infraestructuras viales o ferroviarias) por caída de puentes.	Agua Potable	DO1_AS104: Reparación de emergencia tapado de tubería a urbanizaciones - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	47.983,78 €
Fase 0 - AP: Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de abastecimiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.	Agua Potable	DO1_AS101: Suministro eléctrico de emergencia mediante Grupo Electrógeno a pozos Solana - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Provisional - Ejecutado	39.680,99 €
Fase 0 - AP: Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de abastecimiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.	Agua Potable	DO1_AS102: Suministro eléctrico de emergencia mediante grupo electrógeno a pozo San Álvaro y bombeos a urbanizaciones - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Provisional - Ejecutado	4.506,86 €
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DO1_AS015: Renovación de instalaciones electromecánicas dañadas en pozos y bombeos del sistema de abastecimiento - I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	125.721,56 €
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DO1_AS106: Sustitución de equipos de sensorización dañados por DANA - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Provisional - Ejecutado	8.926,46 €
Fase 0 - ALC: Obras provisionales de contsrucción de red de sanelamiento y/o pluviales	Saneamiento	DO1_AS049: Conexión provisional de puntos de vertido en el TM de Chiva al DPH al colector general (actuación de vertido 0) - Ejecutada por la Delegación I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Provisional - En Curso	271.870,34 €
Fase 0 - ALC: Reparación y/ o reposición de las infraestructuras de acceso y registro a la red de saneamiento	Saneamiento	DO1_AS105: Reposición de trapas de saneamiento - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	28.253,68 €
		- I	: -	
Fase 1 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido en fase de recosntrucción.	Saneamiento	DO1_LAp032: Trabajos de limpieza especializada prevista de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva - I Explotación	01 Coste Operación: Provisional - No Iniciado	215.039,33 €

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	TITULO	Movilización de personal para hacer frente a la emergencia
Dg Valencia Oest	1319		

VALORACIÓN	€ (PEM)	16.456,87 €

DO1_CPer003	Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantia del servicio durante la DANA y días posteriores - Agua Potable

Fase 0 - AP: Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transportes, dietas y alojamientos para personal desplazado, incluida horas extras.

01 Coste Operación | 01 Personal | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Se recogen los trabajos fuera de Jornada por Fuerza Mayor incurridas para la garantía de la continuidad del servicio de Saneamiento en el municipio

Se contempla el coste por Operario de las Horas fuera de Jornada por Fuerza Mayor en el periodo de restablemcimiento y garantia del servicio. Para evitar duplicidades de costes no se contempla las horas incurridas en jornada Laboral

Valoración	€ (PEM)	15.140,08 €

DO1_CPer004	Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantia del servicio durante la DANA y días posteriores - Saneamiento

Fase 0 - ALC: Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transportes, dietas y alojamientos para personal desplazado, incluida horas extras.

01 Coste Operación | 01 Personal | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Saneamiento**

Se recogen los trabajos fuera de Jornada por Fuerza Mayor incurridas para la garantía de la continuidad del servicio de Saneamiento en el municipio

Se contempla el coste por Operario de las Horas fuera de Jornada por Fuerza Mayor en el periodo de restablemcimiento y garantia del servicio. Para evitar duplicidades de costes no se contempla las horas incurridas en jornada Laboral

Valoración	€ (PEM)	1.316,79 €

.	

Valoración	€ (PEM)	- €

.	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Cod_Act	Comentario Trabajos Realizados	Cod Empleado	Hn	He	C Tot
DO1_CPer003	CIERRE/APERTURA DE SERVICIO ACOMETIDA	131906410	3,00		
		140008544	1,00		
		100102664	0,50		
		131905210	1,00		
	MANTENIMIENTO RED DISTRIBUCIÓN	131906410		3,00	83,61
		140008544	72,25	1,50	49,22
		131905210	4,75		
	REVISIÓN, INSPECCIÓN O ESCUCHA	131904446		44,00	1.170,84
		131906410	13,50	9,50	264,77
		140008544	69,23	121,77	3.995,18
		100102664	2,50		
		131905211	62,00	114,00	4.574,82
		131905206	70,25	106,25	3.548,75
		131905210	36,75	43,50	1.452,90
		100401867	0,25		
Total DO1_CPer003			**336,98**	**443,52**	**15.140,08**
DO1_CPer004	REVISIÓN, INSPECCIÓN SANEAMIENTO	131906410	1,50	13,75	383,21
		100103201	8,25		
		140008544	0,75	7,50	246,08
		100102664	44,75	2,50	96,28
		131905211		1,00	40,13
		131905206	9,50	15,50	517,70
		131905210	13,25	1,00	33,40
Total DO1_CPer004			**78,00**	**41,25**	**1.316,79**
Total general			**414,98**	**484,77**	**16.456,87**

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	**TITULO**	**Analíticas Extraordinarias - Agua Potable**
Dg Valencia Oest	1319		

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**10.032,07 €**

DO1_CAn031	Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida			
Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable				
01 Coste Operación	02 Analítica AP	Ejecutado	Gestor (RD7/24)	**Agua Potable**

Plan analítico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración.

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Chiva 1

Valoración	€ (PEM)	10.032,07 €

-	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

DenCeBe Chiva - UTE Aguas de Chiva

Cod_Act	Texto breve de material	Denominación de la ubicación técnica	Fecha de toma	Importe (PEM)
DO1_CAn031	CLORATOS_IC_MG-L	CHIVA 8. Red Loma de Miralcampo. (Hornacina P.	21-nov	11,71 €
			22-nov	11,71 €
	DANA_ANALISIS_INICIAL_CONSUMO	CHIVA 1. Red Oficina (Alcalde Urbino Blay).	22-nov	542,57 €
		CHIVA 5. Red Olimar (Fte junto caseta del guarda)	19-dic	535,51 €
		CHIVA 6. Red Sierra Perenchiza (parcela junto ca	19-dic	535,51 €
	DANA_SEMANAL_HIDRÁULICO_CLIE	CHIVA 1. Red Oficina (Alcalde Urbino Blay).	22-nov	137,38 €
			25-nov	137,38 €
			02-dic	137,38 €
			09-dic	137,38 €
		CHIVA 8. Red Loma de Miralcampo. (Hornacina P.	05-dic	137,38 €
			09-dic	137,38 €
			16-dic	137,38 €
			23-dic	137,38 €
		CHIVA 5. Red Olimar (Fte junto caseta del guarda)	05-dic	137,38 €
			09-dic	137,38 €
			16-dic	137,38 €
			23-dic	137,38 €
		CHIVA 6. Red Sierra Perenchiza (parcela junto ca	10-dic	137,38 €
			16-dic	137,38 €
			23-dic	137,38 €
			30-dic	137,38 €
	P_COMPL_02_RD3.2023_COT	CHIVA 11. Red Fuente Av. Rio Turia.	05-dic	1.103,95 €
		CHIVA 5. Red Olimar (Fte junto caseta del guarda)	28-nov	1.103,95 €
		CHIVA 6. Red Sierra Perenchiza (parcela junto ca	05-dic	1.103,95 €
		CHIVA 3. Red Calicanto(Angel Guimera junto cont	05-dic	1.103,95 €
	P_CTROL_15_RD3.2023	CHIVA 1. Red Urb Pedrizas (Fuente).	03-nov	157,38 €
		CHIVA 1. Red Oficina (Alcalde Urbino Blay).	02-nov	157,38 €
		CHIVA 8. Red Loma de Miralcampo. (Hornacina P.	03-nov	157,38 €
		CHIVA 5. Red Olimar (Fte junto caseta del guarda)	03-nov	157,38 €
		CHIVA 6. Red Sierra Perenchiza (parcela junto ca	03-nov	157,38 €
		CHIVA 3. Red Calicanto(Angel Guimera junto cont	03-nov	157,38 €
		CHIVA 1. Red Pl Pahilla (Calle Tendero).	07-nov	157,38 €
		CHIVA 3. Red Calicanto (Grupo Presion Picos Tei	03-nov	157,38 €
		CHIVA 3. Red Calicanto (Calle Rio Gallego).	03-nov	157,38 €
		CHIVA 5. Red Atalaya (Fuente calle 2).r	03-nov	157,38 €
		CHIVA 5. RED CARAMBOLO. (Frente parque ent	02-nov	157,38 €
	Pedido eventual GRATUITO	CHIVA 5. Red Olimar (Fte junto caseta del guarda)	11-nov	50,00 €
Total DO1_CAn031				**10.032,07 €**
Total general				**10.032,07 €**

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	TITULO	Trabajos urgentes en Instalaciones Electromecánicas

VALORACIÓN	€ (PEM)	20.701,34 €

DO1_CElect002	Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas.

Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

01 Coste Operación | 03 Mnto Electromecánico | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Se recogen los trabajos realizados en las instalaciones por equipo especializado compuesto por oficial mantenimiento electromecánico coordinado por técnico especialista, en los días posteriores a la DANA

206 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de 494,75 horas de trabajo.

Valoración	€ (PEM)	20.701,34 €

-	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Cod_Act	Actividad	Ubicación técnica	Detalle del trabajo	C_Total
DO1_CElect002	Cloración	CHIVA DEP INF PERENCHIZA EQ.CLORACIO	Mantenimiento equipo cloración	90,21 €
			Vaciado de depósito de cloro por "clor si	162,38 €
		CHIVA DEP LOMA MIRALCAMPO EQ.CLOR	Mantenimiento equipo cloración	108,26 €
		CHIVA DEP SUP PERENCHIZA EQ.CLORACIC	Mantenimiento equipo cloración	54,13 €
		CHIVA DEP SUPERIOR CARAMBOLO CLORA	Mantenimiento equipo cloración	27,06 €
		CHIVA DEP.CASA PARRA ANALIZADOR CLO	Mantenimiento analizador cloro	72,17 €
		CHIVA DEP.CASA PARRA EQ.CLORACION	Mantenimiento equipo cloración	36,09 €
		CHIVA DEP.LUIS BALBASTRE EQ.CLORACIO	Mantenimiento equipo cloración	18,04 €
		CHIVA DEP.LUIS BALBASTRE EQ.CLORACIO	Mantenimiento equipo cloración	36,09 €
		CHIVA DEP.SERRATILLA EQUIPO CLORACIC	Mantenimiento equipo cloración	
		CHIVA DP INFERIOR CARAMBOLO ANALIZA	Calibrar analizador de Carambolo, no fur	54,13 €
			Mantenimiento analizador cloro	72,17 €
			Revisar cloración, por valor 0, gestionar '	
		CHIVA OFICINA ANALIZADOR CLORO	Calibrar analizador, el valor real tomado	36,09 €
			Calibrar analizador, marca 0.42 y el cloro	36,09 €
			Mantenimiento analizador cloro	36,09 €
			Nivel de cloro bajo (0,25 mg/l) en la Ofic	54,13 €
			No se reciben datos del analizador de clo	126,30 €
		CHIVA POZO SAN ALVARO EQ.CLORACION	Mantenimiento equipo cloración	
		CHIVA POZO SOLANA 3 EQ.CLORACION	Mantenimiento equipo cloración	36,09 €
			No funciona la bomba de cloración de Sc	
	Mantenimiento Electromecár	-	preparar cuadro potencia achique residu	90,21 €
		CHIVA	Cambiar selectores y poner candado por	45,11 €
			Cambiar selectores y poner candado por	54,13 €
			El nivel de cloro del nuevo akwametric d	36,09 €
			Instalación cuadro eléctrico y puesta en	698,50 €
			Montaje cuadro Ebar 4 de Chiva en talle	108,26 €
			Montaje cuadro Ebar 5 de Chiva en talle	135,32 €
			Montaje de nuevo cuadro en el taller pa	117,28 €
			Nivel de cloro bajo (0,08 mg/l) en el sect	
			Pao de grupo electrógeno a esquema 10	162,38 €
			Pasar alimentación de grupo electrógeno	72,17 €
		CHIVA BBO CAMPANA CASA PARRA BOMB	Revisar instalación y funcionamiento bo	261,62 €
		CHIVA CONDUC.CAUDALIM PAHILLA SALIC	Revisar caudalímetro ultrasonidos. Jorge	144,34 €
		CHIVA DEP ELEVADO URB ATALAYA BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP ELEVADO URB ATALAYA REMO	Fallo de comunicación de la remota de A	9,02 €
		CHIVA DEP INF CARAMBOLO BOYAS	Mantenimiento boyas	90,21 €
		CHIVA DEP INF PERENCHIZA BOYAS	Mantenimiento boyas	27,06 €
		CHIVA DEP INF PERENCHIZA EQ.CLORACIO	aviso explotación cloro valor 0 ,revisar in	216,51 €
		CHIVA DEP INFERIOR OLIMAR BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP LOMA MIRALCAMPO ALARMA	Mantenimiento alarma	54,13 €
		CHIVA DEP LOMA MIRALCAMPO BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP LOMA MIRALCAMPO REMOTA	Mantenimiento remota	72,17 €
		CHIVA DEP SUP CARAMBOLO BOYAS	Mantenimiento boyas	27,06 €
		CHIVA DEP SUP PERENCHIZA BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP URB ALTAMAR ALARMA	Mantenimiento alarma	54,13 €
		CHIVA DEP URB ALTAMAR BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP URB ALTAMAR REMOTA	Fallo de comunicación de la remota en e	92,79 €
			Mantenimiento remota	72,17 €
		CHIVA DEP URB ATALAYA	fallo tension	92,79 €
		CHIVA DEP URB ATALAYA BOYAS	Mantenimiento boyas	27,06 €
		CHIVA DEP URB ATALAYA HERMES	Mantenimiento alarma	54,13 €
		CHIVA DEP URB ATALAYA REMOTA	Fallo de comunicación de la remota de A	9,02 €
			Mantenimiento remota	72,17 €
		CHIVA DEP. SUPERIOR OLIMAR BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP.CASA PARRA	forzar urbanizaciones, cerrando y abrien	92,79 €
		CHIVA DEP.CASA PARRA BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP.CONTIENDA BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
			Revisar las boyas de la radio Farell y Sier	46,40 €
		CHIVA DEP.CONTIENDA I.FOTOVOLTAICA	Mantenimiento instalación fotovoltaica	
		CHIVA DEP.CONTIENDA REMOTA	Mantenimiento remota	469,66 €
		CHIVA DEP.INCOLLA I.FOTOVOLTAICA	Mantenimiento instalación fotovoltaica	
		CHIVA DEP.PEDRIZAS BOYAS	Mantenimiento boyas	45,11 €
		CHIVA DEP.PEDRIZAS I.FOTOVOLTAICA	Mantenimiento instalación fotovoltaica	
		CHIVA DEP.PEDRIZAS REMOTA	Mantenimiento remota	72,17 €

DO1_CElect002	Mantenimiento Electromecár	CHIVA DEP.POL.PAHILLA BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09 €
		CHIVA DEP.POL.PAHILLA REMOTA	El caudalimetro ha dejado de leer	36,09 €
		CHIVA DEP.SERRATILLA BOYAS	Mantenimiento boyas	9,02 €
		CHIVA DEPOSITO INCOLLA BOYAS	Mantenimiento boyas	45,11 €
		CHIVA DEPOSITO INCOLLA REMOTA	Fallo comunicacion	27,06 €
			Mantenimiento remota	72,17 €
		CHIVA DEPOSITO INFERIOR CARAMBOLO	revisar cloro valor 0	63,15 €
		CHIVA DEPOSITO POL.PAHILLA	El nivel de cloro del nuevo akwametric d	36,09 €
			No funciona caudalimetro lana sarrate	72,17 €
			Tomar medidas para carrete	36,09 €
		CHIVA DP INFERIOR CARAMBOLO ALARMA	NO SAP, Mantenimiento alarmas	54,13 €
		CHIVA DP INFERIOR CARAMBOLO REMOTA	Mantenimiento remota	72,17 €
			Urbanizaciones, programar mejoras en e	90,21 €
		CHIVA EBAR DR.BERNAT	Ha saltado la alarma de "Fallo Bomba" e	
			Instalación y puesta en marcha de bomb	572,21 €
			Mantenimiento bombeo	36,09 €
			Revisión general para comprobar estado	54,13 €
		CHIVA EBAR DR.BERNAT BOMBA 1	instalar bomba nueva	270,64 €
			Mantenimiento bomba	36,09 €
			Megado de la bomba alquilada para dete	36,09 €
			Revisar EBAR. Ha saltado el guardamoto	144,34 €
		CHIVA EBAR DR.BERNAT CUADRO	Mantenimiento cuadro eléctrico	45,11 €
		CHIVA ERC LOMA MIRALCAMPO AKWAME	Mantenimiento Akwametric	
			No se reciben datos del cloro desde el di	36,09 €
			No se reciben datos del registrador de EI	
		CHIVA ERC SIERRA PERENCHIZA AKWAMET	Calibrar analizador, marca 3.04 y el valo	
			Mantenimiento Akwametric	
			Nivel de cloro muy alto (3,24 mg/l) en el	54,13 €
		CHIVA GP CARAMBOLO BOMBA 1	Alternancia de bombas	36,09 €
		CHIVA GP CARAMBOLO BOMBA 2	Alternancia de bombas	27,06 €
		CHIVA GP LOMA DE MIRALCAMPO VARIAD	Revisar alarma fallo variador. Sin suminis	69,59 €
		CHIVA GP OLIMAR BOMBA 1	Alternancia de bombas	36,09 €
		CHIVA GP OLIMAR BOMBA 2	Alternancia de bombas	27,06 €
		CHIVA GP OLIMAR BOMBA 3	Alternancia de bombas	36,09 €
		CHIVA GP OLIMAR REMOTA	Revisar señales (los 2 niveles) del Dep. O	72,17 €
		CHIVA GP SIERRA PERENCHIZA	El contador de la salida del GP Sierra Per	54,13 €
		CHIVA GP SIERRA PERENCHIZA BOMBA 1	Alternancia de bombas	
		CHIVA GP SIERRA PERENCHIZA BOMBA 2	Alternancia de bombas	
		CHIVA GP SIERRA PERENCHIZA HERMES	Mantenimiento alarma	54,13 €
		CHIVA GP SIERRA PERENCHIZA REMOTA	Mantenimiento remota	72,17 €
		CHIVA OFICINA	Calibrar analizador. marca 0.506 y el valo	36,09 €
		CHIVA POZO LA SOLANA 2	cambiar baterías mando aire acondicion	54,13 €
			Recoger cable potencia 240 para alimen	126,30 €
		CHIVA POZO LA SOLANA 2 ALARMA HERM	Mantenimiento alarma	54,13 €
		CHIVA POZO LA SOLANA 2 CAUDALIMETRO	cambio caudalimetro y pruebas	72,17 €
		CHIVA POZO LA SOLANA 2 CTRANSFORMA	Desmontar conexionado del grupo electr	301,57 €
			eliminar cableado grupo electrogeno y p	216,51 €
			fusibles media tensión fundidos , averigu	435,60 €
			Montar conexionado del grupo electróge	997,49 €
			reformar instalación eléctrica potencia e	306,72 €
		CHIVA POZO LA SOLANA 2 NIVEL	Mantenimiento nivel de pozo	18,04 €
		CHIVA POZO LA SOLANA 2 REMOTA	cambiar baterias	54,13 €
			cambiar baterías	18,04 €
			Mantenimiento remota	72,17 €
		CHIVA POZO LA SOLANA 2 VARIADOR 1	llevar variador a power	206,09 €
			tapar ventanas con chapas para evitar q	54,13 €
		CHIVA POZO LOMA MIRALCAMPO	Depósito Loma vacío. El pozo no arranca	278,37 €
			Ha saltado el aviso por fallo bomba del p	81,19 €
		CHIVA POZO LOMA MIRALCAMPO CPOTEN	montar sistema de fallo de fases en cuad	144,34 €
		CHIVA POZO LOMA MIRALCAMPO VARIAD	Fallo variador	118,57 €
			fallo variador sobreintensidad	81,19 €
		CHIVA POZO PERENCHIZA ALARMA	Mantenimiento alarma	54,13 €
		CHIVA POZO PERENCHIZA NIVEL	Mantenimiento nivel de pozo	18,04 €
		CHIVA POZO PERENCHIZA REMOTA	Mantenimiento remota	72,17 €
			Revisar funcionamiento valvula	27,06 €
		CHIVA POZO SAN ALVARO	Electro válvula motorizada	36,09 €
			Gestión en Urbanizaciones y Carambolo	131,45 €
		CHIVA POZO SAN ALVARO CTRANSFORMA	Recoger, y montar grupo electrógeno pa	226,82 €
		CHIVA POZO SAN ALVARO FILTROS REMOT	Mantenimiento remota	72,17 €
		CHIVA POZO SAN ALVARO REMOTA	a petición explotacion pasar valv chiva a	18,04 €
		CHIVA POZO SIERRA PERENCHIZA	instalar toma de corriente	64,44 €
		CHIVA POZO SOLANA 3	Cambiar tubing cloradores solana 2 y 3	54,13 €
			Revisar con la UME a petición de explota	255,17 €
		CHIVA POZO SOLANA 3 CTRANSFORMADO	cambio solana 3 de grupo elctrogeno a R	234,55 €
			Montar y conectar grupo electrógeno co	1.902,20 €
			Recoger los 2 autiotransformadores alqu	54,13 €
			retirar grupo electrogeno y devolver con	108,26 €
		CHIVA POZO SOLANA 3 EQ.CLORACION	cambiar tubos impulsion cloradores	69,59 €
			cloracion rota	64,44 €
			fuga de cloro	36,09 €
			regular cloracion	18,04 €
			valores alto cloro en chiva ,revisar fallo	45,11 €
		CHIVA POZO SOLANA 3 VARIADOR	descargar con euler variador reparado	54,13 €
			montar arrancador de emergencia en ca	378,89 €
			montar variador reparado tras dana y pu	396,94 €
			Reponer ventilador roto	54,13 €
			Retirar variador de caseta y transportar	731,72 €
		CHIVA RBO CARAMBOLO BOMBA DEP.SUP	Alternancia de bombas	
			Megar, desmontar, secar y puesta en ma	278,37 €
		CHIVA RBO CARAMBOLO BOMBA URBANI	Alternancia de bombas	
			Megar, desmontar, secar y puesta en ma	278,37 €
		CHIVA RBO LAS PEDRIZAS BOMBA 1	Alternancia de bombas	
			instalación de bomba reparada con eule	63,15 €
		CHIVA RBO LAS PEDRIZAS BOMBA 2	Alternancia de bombas	
		CHIVA RBO OLIMAR INFERIOR BOMBA 1	Alternancia de bombas	
			Comprobar estado de la bomba por inun	231,98 €

DO1_CElect002	Mantenimiento Electromecár	CHIVA RBO OLIMAR INFERIOR BOMBA 2	Alternancia de bombas	18,04 €
			Comprobar estado de la bomba por inun	208,78 €
		CHIVA RBO OLIMAR INFERIOR VARIADOR	Comprobar variador tras energizar con e	487,15 €
		CHIVA REBOMBEO CARAMBOLO	Fallo sonda presion impulsion	36,09 €
			fotos Dana	45,11 €
			revisar sonda de presion	72,17 €
		CHIVA REBOMBEO OLIMAR INFERIOR	Aviso de nexus por depósito rebosando	92,79 €
			fallo válvula motorizada, boya mínimo,	92,79 €
		CHIVA. N0. P001 ESTACIÓN GENERAL	trabajos montar bomba residual en calle	1.354,48 €
		SONDA RESIDUALES Arte Lactico C/Tender	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES Casco Urbano Parque	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES Cherubino CHIVA	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES Ctra Antigua N301 CH	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES EDAR CHIVA	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES Efluente 2 CHIVA	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES Lavadero Camiones Cl	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES PET C/Peñas Albas CH	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES POLIGONO 1 C/COLLA	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES Poligono2 C/Alhondig	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES PUMA C/PEÑAS ALBA	Mantenimiento Sondas residuales	
		SONDA RESIDUALES Secna Ptda La Murta	Mantenimiento Sondas residuales	
	Mantenimiento saneamiento	CHIVA	Instalación y puesta en marcha de la EB/	1.152,14 €
	Trabajos genéricos	-	MANTENIMIENTO FIJO MENSUAL	
Total DO1_CElect002				**20.701,34 €**
Total general				**20.701,34 €**

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	TITULO	Búsqueda de Fugas
Dg Valencia Oest	1319		

VALORACIÓN	€ (PEM)	2.760,25 €

DO1_Ccl001	Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro

Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable

01 Coste Operación | 04 Búsqueda Fugas AP | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Horas de trabajo diurno de búsqueda de fugas, formada por 1 Oficial Detector de fugas coordinado por Técnico especialista, dotado con medios acústicos para localización de fugas y equipos de trabajo.

41 Horas Jornada, 7 Horas Fuera Jornada, Total Horas:48

Valoración	€ (PEM)	2.760,25 €

.	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Municipio: Chiva - UTE Aguas de Chiva

Cod_Act	Descripción	nº Horas Trabajo	Importe (PEM)
DO1_Ccl001	Hora de trabajo diurno de búsqueda d	41,00	2.252,54
	Hora de trabajo extraordinaria de búsc	7,00	507,71
Total DO1_Ccl001		48,00	2.760,25
Total general		**48,00**	**2.760,25**

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	TITULO	Trabajos en Instalaciones Interiores para garantizar servicio
Dg Valencia Oest	1319		

VALORACIÓN	€ (PEM)	1.303,73 €

DO1_CInt002	Trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios del servicio durante los dias posteriores a la DANA

Fase 0 - AP: Gastos extraordinarios por el apoyo a voluntarios (alojamiento, manutención). Reparaciones de instalaciones interiores (grupos de presión, nuevas acometidas domiciliarias, inventario estado instalaciones)

01 Coste Operación | 05 Inst Interiores | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Se recogen los trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios, durante los 15 días posteriores a la DANA, para el restablecimiento de los servicios básicos y solución de probelemas generales de sus instalaciones. Se realiza con personal propio y voluntarios

Se valora solo el coste del personal propio y los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención del personal voluntario.

Valoración	€ (PEM)	1.303,73 €

-	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Cod_Act	Tipo Aviso	Fecha Para Gráfico	Dirección	Importe (PEM)
DO1_CInt002	Acompañamiento co	07/11/2024	Acompañamiento correlador Chiva	117,13
	Fontaneria	08/11/2024	Calle Reino de Valencia, Chiva, España	284,17
			Plaza Constitucion, Chiva, España,	142,09
	Fuga exterior	07/11/2024	Calle Lonja de la Seda Atalaya Levante	179,53
		08/11/2024	RAMON Y CAJAL, AL LADO DE LA PIZZE	117,13
	Poca presión	08/11/2024	Calle Los Nogales (C8)-Urb. Olimar, Ch	142,09
	Sin suministro	07/11/2024	Calle Reino de Valencia, 9, Chiva, Espa	179,53
	(en blanco)	08/11/2024	(en blanco)	142,09
Total DO1_CInt002				**1.303,73**
Total general				**1.303,73**

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	TITULO	Limpieza e Inspección de las Redes de Alcantarillado

VALORACIÓN	€ (PEM)	148.096,84 €

DO1_LAi007	Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva

Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido.

01 Coste Operación	07 Limpiezas Alc	Ejecutado	Gestor (RD7/24)	Saneamiento

Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva

Valoración	€ (PEM)	148.096,84 €

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Codigo	Trabajo	Medio	Horas Jornada	Horas Fuera Jornada	Importe
DO1_LAi007	Limpieza	Externos	752,00		107.200,00
		GO (Externos)	5,00		1.182,86
		GO (ISG)	273,75	113,25	29.689,94
		Voluntarios&GG			4.236,16
	Total Limpieza		**1.030,75**	**113,25**	**142.308,96**
	Auditoria & Coordinación	GO (ISG)			5.787,88
	Total Auditoria & Coordinación				**5.787,88**
Total DO1_LAi007			**1.030,75**	**113,25**	**148.096,84**

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	TITULO	Análisis Agua Residual y Lodos

VALORACIÓN	€ (PEM)	1.140,00 €

DO1_CAVert050	Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio

Fase 0 - ALC: Realización de análisis extraordinarios de vertidos. SAT control microbiológico

01 Coste Operación	08 Analíticas Alc	Ejecutado	Gestor (RD7/24)	Saneamiento

Realización de anallíticas: a) muestra simple de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae b)muestra. Parámetros analizados: Escherichia coli Colífagos somáticos, Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT), Norovirus GI (PCR-RT), Norovirus GII (PCR-RT) y Vibrio cholerae

5 muestras y analiticas de agua Residual.

Valoración	€ (PEM)	1.140,00 €

-	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Cod_Act	Tip2	Fecha	Instalación	Descripción	nº	Precio sin IVA
DO1_CAVert050	Agua residual	26/11/2024	V0DANA-Chiva_17	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Cinc total, Cobre total, Cromo (III + VI) total, Níquel total, Solidos en Suspensión, Aceites y Grasas, Nitrógeno total, Fósforo total, Hidrocarburos, Cadmio total, Plomo total, Sólidos Sedimentables en 60 min., D.Q.O decantada	1	228,00 €
		29/11/2024	V0DANA-Chiva_17	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Cinc total, Cobre total, Cromo (III + VI) total, Níquel total, Solidos en Suspensión, Aceites y Grasas, Nitrógeno total, Fósforo total, Hidrocarburos, Cadmio total, Plomo total, Sólidos Sedimentables en 60 min., D.Q.O decantada	1	228,00 €
		04/12/2024	V0DANA-Chiva_17	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Cinc total, Cobre total, Cromo (III + VI) total, Níquel total, Solidos en Suspensión, Aceites y Grasas, Nitrógeno total, Fósforo total, Hidrocarburos, Cadmio total, Plomo total, Sólidos Sedimentables en 60 min., D.Q.O decantada	1	228,00 €
			V0DANA-Chiva_EBAR DOCTOR BERNAT	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Cinc total, Cobre total, Cromo (III + VI) total, Níquel total, Solidos en Suspensión, Aceites y Grasas, Nitrógeno total, Fósforo total, Hidrocarburos, Cadmio total, Plomo total, Sólidos Sedimentables en 60 min., D.Q.O decantada	1	228,00 €
		11/12/2024	V0DANA-Chiva_EBAR DOCTOR BERNAT	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Cinc total, Cobre total, Cromo (III + VI) total, Níquel total, Solidos en Suspensión, Aceites y Grasas, Nitrógeno total, Fósforo total, Hidrocarburos, Cadmio total, Plomo total, Sólidos Sedimentables en 60 min., D.Q.O decantada	1	228,00 €
Total DO1_CAVert050					5	1.140,00 €
Total general					**5**	**1.140,00 €**

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Suministro Cubas Agua Potable al municipio**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**21.140,00 €**

DO1_CCubasAP007

Fase 0 - AP: Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados

02 Actuación Singular (ejecutadas) | 06 Sum Cubas AP | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Antecedentes

Jornadas completas camión cuba para suministro de Agua Potable al Municipio

Detalle

7 jornadas (Prezero)

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
					21.140,00 €

Anexo II - Información adicional

PreZero España, S.A.U.
Avda. Alfahuir, 45
46019(Valencia)

FACTURA - PROFORMA

Número de factura: XXXXXXXXXXXX

Fecha de factura: XXXXXXXXX
N/Referencia: -
Fecha Declaración Impuesto: XXXXXXXXX
Página: 1/1

CLIENTE
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
NIF: XXXXXXXXXXXXXX
S/Referencia:
Domicilio fiscal: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Factura por:

Servicios de cuba de agua potable realizados al municipio de Chiva del 31 de Octubre de 2024 a 14 de Noviembre de 2024

Concepto	Cant.	Precio Un.	Importe
sábado, 2 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	2,00	1.595,00	3.190,00
domingo, 3 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	2,00	1.595,00	3.190,00
lunes, 4 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
martes, 5 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
sábado, 9 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	2,00	1.595,00	3.190,00
domingo, 10 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	2,00	1.595,00	3.190,00
lunes, 11 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	2,00	1.595,00	3.190,00
Desplazamiento, puesta en marcha o desmobilización de cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	2.000,00	2.000,00

Base Imponible	Impuesto	Importe Impuesto	Total Presupuesto
21.140,00	IVA-21,00%	4.439,40	**25.579,40**

Original Cliente

Forma de pago: Transferencia
Banco: CAIXABANK
BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES3721002874870210059290
Vencimiento: XXXXXXXXX

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, TOMO 36.718, FOLIO 20, SECCIÓN 8, HOJA M-263628, INSCRIPCIÓN 42. NIF A82741867. DOMICILIO FISCAL C/ ALBARRACIN, 44, 28037 MADRID

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Habilitación de Campas Intermerdias, para agilizar los trabajos de campo de retirada de lodos procedentes de la red de alcantarillado.**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**36.841,14 €**

DO1_Ccamp007

Fase 0 - ALC: Habilitación de puntos provisionales de vertido de lodos para agilizar trabajos de limpieza saneamiento.

02 Actuación Singular (ejecutadas) 09 Campas Intermedias Ejecutado Gestor (RD7/24) **Saneamiento**

Antecedentes

La función y objetivo de las campas Intermedias de acopio de lodos de alcantarillado es agilizar los trabajos de limpieza de las redes de saneamiento, al habilitar un punto intermedio de descarga de lodos junto al de residuos impropios mezclados con él (enseres y escombros) para posteriormente transportarlos desde estas hasta vertedero final autorizado (Manises / Picassent) con otros medios. Para maximizar la tarea de limpieza, se procede a retirar una capa de 5-10 cm de terreno natural bajo la rasante original de cada campa que pudiera haber sido afectada por el acopio, así como al nivelado final del terreno dejándolo en una situación idéntica a la original. El dispositivo utilizado para tal tarea está formado por maquinaria pesada, siendo necesarios por cada campa cinco camiones bañera (capacidad neta 12 m3) y dos palas cargadoras grandes. El rendimiento estimado por campa es de 6 viajes a vertedero final por camión y día. Con una dedicación diaria de 11h/día para cada camión y 12h/día para cada pala cargadora, la estimación diaria de volumen de lodo extraído en campas intermedias y transportado a vertedero es de 360 m3/día. Además, en las tareas de vaciado de lodo se utiliza el espesante facilitado por CEMEX/CSIC, con el objetivo de aumentar el grado de consistencia del lodo reduciendo su liquidez y facilitando su retirada y manejo por parte de la maquinaria.

Detalle

Nº de campas: 1 / Medios: cinco camiones (capacidad neta 12 m3) y dos palas cargadoras grandes / Rendimiento: el rendimiento estimado por campa es de 6 viajes a vertedero final por camión y día / Producción: con una dedicación diaria de 11h/día para cada camión y 12h/día para cada pala cargadora, la estimación diaria de volumen de lodo extraído en campas intermedias y transportado a vertedero es de 360 m3/día.

Comentario Adicional

Campa Chiva-1: se revisa al alza la estimación del coste del vaciado porque la descarga únicamente debe ser realizada en vertedero final oficial de Picassent lo que baja el rendimiento y alarga los tiempos y costes de transporte.

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
Trabajos de retirada de lodos	Subcontrata	Previsión		1,00	31.104,00 €
Personal propio grupo empresarial Global Omnium especializado en trabajos de coordina	Personal propio frupo empresarial Globa	Previsión		1,00	800,00 €
Trabajos de restauración y reposición de tierras	Subcontrata	Previsión		1,00	4.937,14 €
					36.841,14 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	TITULO	Canalización provisional para la reposición del servicio en diversas áreas del núcleo urbano de Chiva
Dg Valencia Oest	1319		

VALORACIÓN	€ (PEM)	34.488,79 €

DO002 DO1_AS002

Fase 0 - AP: Obras de instalalación de conducciones provisionales para abastecimiento (bypass de conducciones de agua, etc)

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Ejecución de canalizaciones provisionales de agua potable en las calles Ramón y Cajal (PE DN 150) y Enrique Ponce (puente de piedra) (PE DN 110). Definitiva en Ramón y Cajal (FD DN 150).
Canalizaciones provisionales en Sierra Perenchiza (PE DN 75) y definitivas en urbanización Incolla y partida Blanquisar (PE DN 63).
Tapado de tubería descubierta por DANA en canalización impulsión a depósito Incolla.

Detalle

Comentario Adicional

Mano de obra gente de la delegación
Enrique ponce DN 200 (no ejecutado)
Enrique ponce DN 110 - definitivo
Ramón y Cajal DN 150 PE - provisional
Ramón y Cajal DN 150 FD - definitivo

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
Canalización provisional para la reposición del servicio en calles Ramón y Cajal y Enrique Ponce. Incluido definitivo en Ramón y Cajal.					
CHIVA. MATERIAL REPARACIONES		6000194755			2.140,75 €
CHIVA. MATERIAL REPOSICIÓN RED		6000194754			11.430,52 €
CHIVA. TUBERIA FUNDICIÓN PARA REPONER RED EN C. RAMON Y CAJAL		6000195193			1.791,00 €
desmontar tubería y poner tapones		2024/456203-2			946,04 €
Reparación de tubería en C. Ramón y Cajal PE 150		2024/452685-1			4.888,21 €
Reparación tubería C. Enrique Ponce PE 110		2024/452680-1			210,80 €
Reparación provisional red de dsitribución de urb. Sierra Perenchiza en c/ Canario y c/ Valencia					
CHIVA. SIERRA PERENCHIZA. MATERIALES REPARACIÓN RED C. CANARIO		6000194774			187,00 €
CHIVA. SIERRA PERENCHIZA. MATERIALES REPARACIÓN RED C. CANARIO Y C. VALENCIA ESQ CON C. CASTELLON		6000194772			2.243,52 €
Reparación de fuga tubería en Calle Canario esq. con C. Aguilas		2024/452688-1			1.255,29 €
Reparación de tubería en C. Valencia esq. con C. Castellón		2024/452690-1			432,68 €
Relleno y tapado Canalización					4.500,00 €
Reparación de emergencia tapado de tubería a Incolla					
Maquinaria Morgan					1.800,00 €
Reposición de tubería dañada en partida Blanquisar					
CHIVA. TUBERIA PARA REPARACIÓN POR DANA EN CAMINO BARRANCO INCOLLA Y BLANQUISAR		6000196160			467,98 €
Morgan					405,00 €
Reposición de tubería dañada en Incolla camino Barranco					
material contado en pedido de incolla y blanquisar					
Morgan					1.790,00 €
					34.488,79 €

Anexo II - Información adicional

Provisionales calles Ramón y Cajal y Enrique Ponce. Incluido definitivo en Ramón y Cajal.

Provisonales calle Canario y calle Valencia de urbanizaición Sierra Perenchiza

Tubería impulsión a Incolla DN 300

Canalización partida Blanquisar

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Canalización provisional para la reposición del servicio a urbanizaciones por el bco. del Gallego**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**29.512,16 €**

DO003	DO1_AS003

Fase 0 - AP: Obras de instalalación de conducciones provisionales para abastecimiento (bypass de conducciones de agua, etc)

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Canalización provisional de polietileno DN 250 para el suministro de agua potable de las urbanizaciones de El Bosque, Sierra Perenchiza y Calicanto.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
CHIVA. SIERRA PERENCHIZA. MATERIALES PARA CONEXIÓN TUBERÍA PROVISIONAL EN BARRANCO GALLEGO		6000195691			451,40 €
CHIVA. TUBERÍA PARA MONTAR PROVISIONAL EN BARRANCO GALLEGO		4500427303			2.013,00 €
CHIVA. SIERRA PERENCHIZA. MATERIALES PARA CONEXIÓN TUBERÍA PROVISIONAL EN BARRANCO GALLEGO		6000195668			38,20 €
CHIVA. SIERRA PERENCHIZA. MATERIALES PARA CONEXIÓN TUBERÍA PROVISIONAL EN BARRANCO GALLEGO		6000195629			228,48 €
CHIVA. PORTES RASPADOR + MALETIN PEDIDO 4500425939		4200610394			15,00 €
CHIVA. SIERRA PERENCHIZA. MATERIALES PARA CONEXIÓN TUBERÍA PROVISIONAL EN BARRANCO GALLEGO		6000195322			6.258,82 €
CHIVA. RASPADOR + MALETIN		4500425939			748,44 €
CHIVA. TUBERÍA PARA MONTAR PROVISIONAL EN BARRANCO GALLEGO		4500426130			6.642,90 €
abrir zanja con máquina ayudas a instalacion y montaje		2024/452686-1			8.156,20 €
MARTES 19 MONTAR TUBERIA DE 250 EN EL BARRANCO GALLEGO LLEVAR GRUPO ELECTROGENO PARA LA MAQUINA DE SOLI		2024/456203-14			799,72 €
Aquiler máquina de soldar		10233131			540,00 €
Subcontrata para ayudas montaje					2.120,00 €
Ejecución topes y hormigonado					1.500,00 €
					29.512,16 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Reparación de emergencia de fuga en tubería a urbanizaciones cercano a CV-50**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**15.770,82 €**

DO1_AS103

Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Reparació de fuga a tubería urbanizaciones Chiva en las inmediaciones de la carretera CV-50.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
CHIVA. TAPAR TUBERÍA QUE VA A URBANIZACIONES DE CHIVA A CALICANTO DESCUBIERTA POR LA DANA		10232262			3.025,00 €
CHIVA. MATERIAL DE REPARACIÓN PARA FUGA EN CV 50 TUBERÍA DE CHIVA A URBANIZACIONES		6000195518			1.907,78 €
MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS					6.000,00 €
BRIGADA CCSA		2024/468299-002			4.838,04 €
					15.770,82 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Renovación de la tubería de suministro a la urbanización San Álvaro y red de distribución afectada**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**15.749,16 €**

DO014	DO1_AS014

Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable

02 Actuación Singular (ejecutadas) - No Iniciado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Reparación definitiva de canalizaciones FD DN 400 de traída al sistema San Álvaro que se utilizó el material existente principalmente y reparación de la tubería FC DN 125 con tubería de polietileno del mismo diámetro que alimenta el depósito de la urbanización Carambolo.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
CHIVA. SAN ALVARO. MATERIAL PARA REPARACIONES RED		6000194773			422,84 €
CHIVA. SAN ALVARO. MATERIAL PARA REPARACIONES RED		6000194770			2.077,16 €
Reparación de tubería en impulsión Carambolo 150FC		2024/452677-1			5.702,96 €
Reparación tuberia conexión Chiva a Urbanizaciones 400 FD		2024/452678-1			4.346,20 €
FALTAN LOS TOPES DE HORMIGÓN COMO MÍNIMO					3.200,00 €
					15.749,16 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Reparación de emergencia tapado de tubería a urbanizaciones**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**47.983,78 €**

DO1_AS104

Fase 0 - AP: Ejecución de obras singulares para la reposición del suministro de agua potable (cruces de ríos, barrancos, infraestructuras viales o ferroviarias) por caída de puentes.

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Obra civil de tapado de tubería al descubierto por arrastres de material a causa de la DANA.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
CHIVA. SIERRA PERENCHIZA TAPAR TUBERÍA ARREGLO DEL CAMINO DESCUBIERTO POR LA DANA		4500429163			740,00 €
Tapado de la tuberia de fundicion desde la VRP de masia Riuet hacia Sierra Perenchiza		2024/456203-4			24.866,80 €
Tapar tubería de Chiva a El Bosque, Descubierta por las tormentas de la DANA		2024/503147-1			15.576,98 €
Maquinaria tapado Morgan					5.000,00 €
Camiones Gruval					1.800,00 €
					47.983,78 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Suministro eléctrico de emergencia mediante Grupo Electrógeno a pozos Solana**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**39.680,99 €**

DO1_AS101

Fase 0 - AP: Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de abastecimiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Suministro eléctrico mediante Grupo Electrógeno a pozos Solana. Incluido alquiler de autotrafos para ambos pozos y consumo de carburante.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
Alquiler equipos de autotrafo de 1000 y 800 KVas 400/690 para Solana 2 y Solana 3, alimentados mediante grupo electrógeno.		10230948			11.190,00 €
CHIVA. GASOIL PARA GRUPO ELECTRÓGENO DEL POZO SOLANA POR FALLO SUMINISTRO ELÉCTRICO		4500425500			1.340,81 €
CHIVA. GASOIL PARA GRUPO ELECTRÓGENO DEL POZO SOLANA POR FALLO SUMINISTRO ELÉCTRICO		4500426047			3.037,93 €
CHIVA. GASOIL PARA GRUPO ELECTRÓGENO DEL POZO SOLANA POR FALLO SUMINISTRO ELÉCTRICO		4500424698			2.767,72 €
CHIVA. GASOIL PARA GRUPO ELECTRÓGENO DEL POZO SOLANA POR FALLO SUMINISTRO ELÉCTRICO		4500424751			3.675,03 €
CHIVA. KIT DE TRASVASE DE GASOLEO ECC 12/20		4500424667			579,00 €
RESTO BOMBA PARA SAN ÁLVARO					-289,50 €
GRUPO ELECTRÓGENO EULER					17.380,00 €
					39.680,99 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Suministro eléctrico de emergencia mediante grupo electrógeno a pozo San Álvaro y bombeos a urbanizaciones**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**4.506,86 €**

DO1_AS102

Fase 0 - AP: Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de abastecimiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Suministro eléctrico mediante Grupo Electrógeno a pozo San Álvaro y bombeos a urbanizaciones Carambolo, Olimar, Altamar, Atalaya y Casa Parra.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

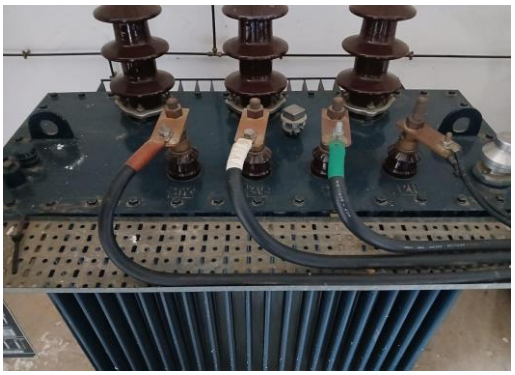

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
CHIVA. GASOIL PARA GRUPO ELECTRÓGENO DEL POZO SOLANA POR FALLO SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA SAN ALVARO		4500424750			3.087,36 €
CHIVA. KIT DE TRASVASE DE GASOLEO ECC 12/20		4500424667			579,00 €
RESTO BOMBA PARA SOLANA 3					-289,50 €
GRUPO ELECTRÓGENO Y PORTES					1.130,00 €
					4.506,86 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Renovación de instalaciones electromecánicas dañadas en pozos y bombeos del sistema de abastecimiento**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**125.721,56 €**

DO015	DO1_AS015

Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Sustitución de bombas dañadas en Solana 2, Solana 3, Olimar inferior,regantes San Álvaro, sistema San Álvaro, Carambolo inferior y Atalaya inferior.
Arrancador Solana 2 y variadores en Solana 3, Olimar inferior.
Centro de transformación dañado en Solana 2.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

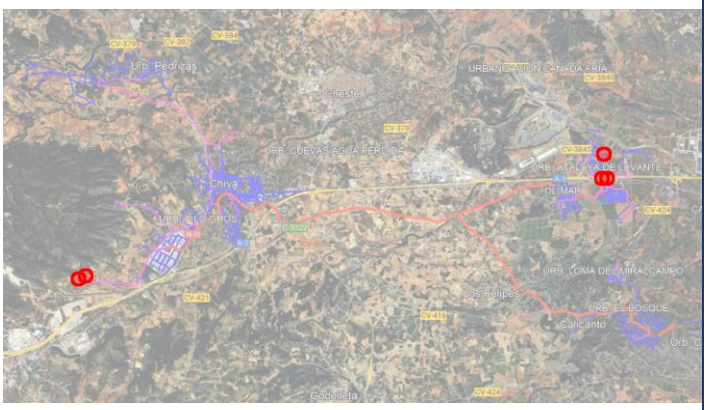

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
SOLANA 2					
Revisión equipo en instalación SOLANA 2					425,00 €
Tarjeta control SOLANA 2					1.038,50 €
CHIVA - SOLANA 2 - FILTRO SENOIDAL					4.176,00 €
Transformador IMEFY 800kVA 20K/420 Auto					19.998,00 €
Cable 150 mm² por avería actual					21.323,10 €
REPARACIÓ BOMBA OFERTA EULER					16.818,39 €
Sustitución de variador dañado por DANA en pozo Solana 3					
VARIADOR NUEVO VDF SD750 400A		20153270			14.607,84 €
Arrancador (alquiler)					514,65 €
Portes por transporte a Power Electronics					250,00 €
Portes por transporte a Solana 3 equipo sustitución					250,00 €
Asistencia técnica Power puesta en marcha arrancador					1.480,00 €
Cables para conexiones					3.766,00 €
Asistencia técnica Power revisión avería variador					1.665,00 €
Reparación bomba solana 3		x2400302			16.160,00 €
Sustitución de bombas dañadas por DANA en bomeo San Álvaro y reparación de variador					
Revisión y reparación de variador de velocidad Olimar Inferior					1.293,50 €
Bombas Olimar inferior (20% incremento importe pedido de 2020) * 2 bombas		4500258330			11.912,69 €
Bomba Carambolo Inf a Urbanizaciones					3.000,00 €
Bomba Carambolo Inf a Carambolo Sup					3.000,00 €
Bomba Atalaya		4500427660			1.249,89 €
Bomba regantes San Álvaro (+20% importe pedido 2021)		4500284916			2.793,00 €
					125.721,56 €

Anexo II - Información adicional

Oferta (AG)

Información
Código de cliente: 103145
CIF: U98682123
Válida hasta: 07.01.2025
Delegación: Levante
Delegado: VALLET RUBIO, ALBERTO
Teléfono: 607538214
Email: avallet@power-electronics.com

Nº Oferta: 20153270
Fecha oferta: 07.11.2024

Datos cliente
UTE AGUAS DE CHIVA
GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA 19
E-46005 VALENCIA

Contacto: ENRIQUE ESTEVE
Telf.:
Email: eesteve@aguasdevalencia.es

Referencia de proyecto: POZOS SOLANA 2 Y 3 (AVERIAS DANA)
Observaciones

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
10	SD75S040065SS	VDF SD750 400A 690V IP54 TT/TN Peso: 318 KG Sobrecarga a 50ºC (%): 150,00 Protección: IP54 Intensidad de salida a 50ºC: 320,00 A	1 UN	14.607,84 Dimensiones: 786 X 529 X 1712(H)MM Tensión de entrada: 690 V Potencia a 50ºC: 315,00 kw Frecuencia: 50/60HZ	[illegible]

Total bruto EUR	Base imponible EUR	IVA EUR 21,00 %	Total EUR
29.215,68	29.215,68	6.135,29	35.350,97

Presupuesto

Información
Revisión de oferta:
Código de cliente: 103145
CIF: U98682123
Válida hasta: 06.12.2024
Nº serie equipo: 4610020145
Descripcion equipo: SD7006055

Nº Oferta: 20153218
Fecha oferta: 06.11.2024

Dirección de facturación
UTE AGUAS DE CHIVA
GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA 19
E-46005 VALENCIA

Dirección de envio
Empresa
EGEVASA BASE2 ALMACEN CHESTE
PARC-12 SUB.PARC10-1
POL.IND. CASTILLA,
E-46380 CHESTE

Observaciones:
Tarjeta de potencia averiada.

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Dto %	Importe EUR
10	E148FD	TARJETA DE POT 400V TALLA3 Peso: 1 KG	1,00 UN	1.166,00	15,00- %	991,10
20	HORASTALLER (PDD)	NORMALES TALLER	1,5 HRA	85,00	0,00 %	127,50

Total bruto EUR	Base imponible EUR	IVA EUR 21,00 %	Total EUR
1.118,60	1.293,50	234,91	1.353,51

Variador pozo Solana 3 dañado por agua.

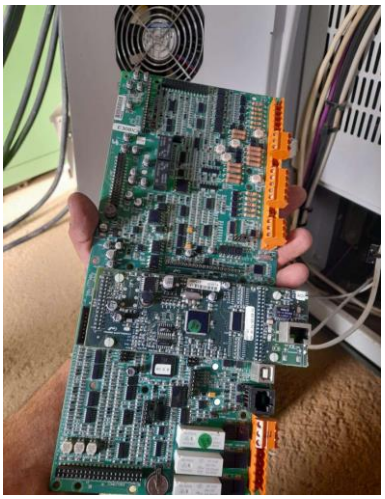

Derivación en CT Solana 2

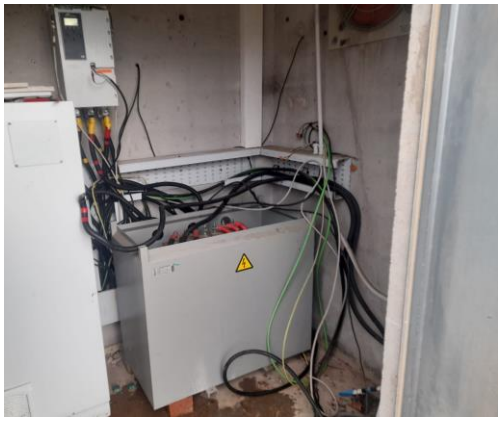

Bomba dañada en Solana 2

Bomba dañada en Solana 3

Arrancador dañado Solana 2

Sala de bombeo Carambolo inferior y sistema San Álvaro. Bombas dañadas por inundación

Sala de bombeo Olimar inferior. Bombas y variador dañados por inundación

Variador Olimar inferior dañado

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Sustitución de equipos de sensorización dañados por DANA**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**8.926,46 €**

DO1_AS106

Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Agua Potable**

Antecedentes

Sustitución de equipos de sensorización dañados por la DANA.
Incluye sondas de nivel depósitos Atalaya inferior, Pahilla y Loma de Miralcampo así como caudalímetros electromagnéticos de la canalización de traída a urbanizaciones general (DN 400), derivación San Álvaro (DN400) y derivación a Sierra Perenchiza (DN 300).

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
CHIVA. SUMINISTRO DE SONDA DEPÓSITO LA LOMA		4500425826			219,00 €
CHIVA. SAN ALVARO. SUMINISTRO DE SONDA HERMES ATALAYA INFERIOR		4500425825			357,00 €
CHIVA. SUMINISTRO DE SONDA DEPÓSITO PAHILLA		4500425837			357,00 €
CHIVA. SAN ALVARO. SUMINISTRO DE VENTILADORES PARA OLIMAR		4500425841			244,16 €
CAUDALIMETROS CONDUCCIÓN CHIVA-URBANIZACIONES					5.166,20 €
CAUDALÍMETRO GENERAL PAHILLA					2.583,10 €
					8.926,46 €

Anexo II - Información adicional

Caudalímetro general traída a urbanizaciones

Caudalímetro derivación San Álvaro de traída a urbanizaciones

Caudalímetro derivación Sierra Perenchiza y Calicanto de traída a urbanizaciones

Sonda dañada por inundación en Loma de Miralcampo

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Conexión provisional de puntos de vertido en el TM de Chiva al DPH al colector general (actuación de vertido 0)**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**271.870,34 €**

DO1_AS049

Fase 0 - ALC: Obras provisionales de contsrucción de red de sanelamiento y/o pluviales

02 Actuación Singular (ejecutadas) - En Curso Gestor (RD7/24) **Saneamiento**

Antecedentes

Instalación de bombeos de residuales provisionales en calle Buñol, calle Pilar, calle Olivera, calle Doctor Bernat y Loma del Castillo, para evitar vertidos al barranco de Chiva.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
BOMBA 1 PARA BOMBEOS DE RESIDUALES DE EMERGENCIA POR LA DANA		10232464	hasta 31/12/2024		2.185,41 €
CHIVA. MATERIAL PARA SANEAMIENTO EBAR 3		10231979			458,31 €
CHIVA. MATERIAL PARA SANEAMIENTO EBAR 2		10231941			609,19 €
CHIVA. MATERIAL PARA SANEAMIENTO C. BUÑOL		10231865			199,80 €
CHIVA. MATERIAL SANEAMIENTO C. BUÑOL		4200611418			92,59 €
Bombeo 2. Calle Pilar: BImba de lodos 15 kvgrupo 60 kvascambio de bomba de loosds por una igual pero con boyaobturador ,		2024/466382-1	31-dic.-24		70.350,00 €
Bombeo 3: Olivera			31-dic.-24		70.350,00 €
Bombeo 4: Dr Bernat			31-dic.-24		70.350,00 €
Bombeo 5. Loma Castillo					52.850,00 €
Montar bombeo de saneamiento provisional en la calle Buñol hacia la calle Enrique Ponce		2024/502907-1			2.598,58 €
sacar bomba fecales, recoger bomba nueva en quart de poblet, montar nueva y llevarse la vieja que no funciona. actuación par		2024/471812-2			1.365,85 €
Tapar con hormigón en pozo de saenamiento de la C. Buñol para que vaya a rebombeo Antonio Machado		2024/480394-1			286,46 €
MARTES 19 VACIAS DE ESCOMBROS LOS POZOS DE SANEAMIENTO DE CALLE BUÑOL DEJAR LA FURGONETA EN CALLE CAMBR/		2024/466382-9			
29.11. Viernes. Ayudar a Rafa a concetar manguera en la bomba de saneamiento de la C. Buñol. Actuación para SAMUEL		2024/471812-5			174,15 €
C. Buñol esq. con C. 9 de Octubre. Hacer excavavión para unir pozos de saneamiento		2024/466382-14			
Montar bomba de saneammiento provisional en la calle Olivera hasta el pozo de Jacianta Frances		2024/502936-1			
					271.870,34 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	**TITULO**	**Reposición de trapas de saneamiento**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**28.253,68 €**

DO1_AS105

Fase 0 - ALC: Reparación y/ o reposición de las infraestructuras de acceso y registro a la red de saneamiento

02 Actuación Singular (ejecutadas) - Ejecutado Gestor (RD7/24) **Saneamiento**

Antecedentes

Reposicíon de trapas de saneamiento dañadas o perdidas.
Ejecución de 4 pozos de saneamiento y colector dañado en cruce estación ferrocarril.

Detalle

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
Trapas sustitución DANA		6000195128			9.530,60 €
cambiar 2 trapas de saneamiento en calle Ramon y cajal		2024/461958-2			547,66 €
Cambiar trapa rota de saneamiento en muy mal estado.		2024/468931-1			417,45 €
poner trapa de 600 y sacar trozo de asfalto del interior		2024/463561-1			71,99 €
colocar trapa de 600 mirar comentarios		2024/453265-2			429,52 €
colocar 2 trapas mirar comentarios		2024/453194-2			421,70 €
adecuación a rasante, cambiamos trapa de 600 vieja y ponemos una reforzada, fotos adjuntas en documentos		2024/424536-2			315,85 €
colocar trapa 600		2024/462483-1			71,99 €
poner trapa de 600. se puede poner reciclada tiene marcó frente restaurante La Pahilla. Se adjunta foto		2024/471546-1			46,90 €
poner trapa de 600 en calle Buñol 3 debajo de las maderas de la foto.		2024/470404-1			
poner trapas de saneamiento en calle Olivera 44 y 46 hacer avalon para CCSA URGENTE		2024/504049-1			
ACTUACIÓN ESTACIÓN FERROCARRIL					16.400,02 €
					28.253,68 €

Anexo II - Información adicional

Chiva - UTE Aguas de Chiva

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1319	TITULO	Limpieza e Inspección de las Redes de Alcantarillado

VALORACIÓN	€ (PEM)	215.039,33 €

DO1_LAp032	Trabajos de limpieza especializada prevista de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva			
Fase 1 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido en fase de recosntrucción.				
01 Coste Operación	07 Limpiezas Alc	No Iniciado	Gestor (RD7/24)	**Saneamiento**
Trabajos de limpieza prevista tras la fase inicial de la red de alcantarillado por medio de equipos especializados en el ámbito de Chiva - UTE Aguas de Chiva Se prevé la dedicación de 0,5 equipo/s especializados con dedicación completa durante 12 meses, incluida inspección y revisión con cámara CCTV				

Valoración	€ (PEM)	215.039,33 €

-	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Codigo	Trabajo	Medio	Horas Jornada	Horas Fuera Jornada	Importe
DO1_LAp032	CCTV	GO (ISG)			6.508,12
	Total CCTV				**6.508,12**
	Limpieza	Externos	960,00		174.240,00
	Total Limpieza		**960,00**		**174.240,00**
	Auditoria & Coordinación	GO (ISG)			34.291,21
	Total Auditoria & Coordinación				**34.291,21**
Total DO1_LAp032			**960,00**		**215.039,33**

Chiva - Urb Calicanto

InfF:DANA_02 **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	Ayuntamiento
Servicio Agua Potable	1078	La Hoya de Buñol (Valencia)

	Agua Potable	Saneamiento	Total
01 Coste Operación	6.854,07 €		6.854,07 €
02 Actuación Singular (ejecutadas)	23.735,00 €		23.735,00 €
Total PEM	30.589,07 €		**30.589,07 €**

Resumen	Agua Potable	Saneamiento	Total
FASE 0	30.589,07 €		30.589,07 €
FASE 1			
FASE 2			
Total PEM	30.589,07 €		**30.589,07 €**
Total PEC			
Total (IVA)			

Detalle

Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
Fase 0 - AP: Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transportes, dietas y alojamientos para personal desplazado, incluida horas extras.	Agua Potable	DO1_CPer001: Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantia del servicio durante la DANA y días posteriores - Agua Potable - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	3.270,77 €
Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable	Agua Potable	DO1_CAn029: Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.654,55 €
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DO1_CElect001: Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.569,70 €
Fase 0 - AP: Gastos extraordinarios por el apoyo a voluntarios (alojamiento, manutención). Reparaciones de instalaciones interiores (grupos de presión, nuevas acometidas domiciliarias, inventario estado instalaciones)	Agua Potable	DO1_CInt001: Trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios del servicio durante los dias posteriores a la DANA - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	359,05 €
		- I	: -	
Fase 0 - AP: Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados	Agua Potable	DO1_CCubasAP003: Suministro Cubas Agua Potable al municipio - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	23.735,00 €
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	

Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	
		- I	: -	

Chiva - Urb Calicanto

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1078	**TITULO**	**Movilización de personal para hacer frente a la emergencia**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**3.270,77 €**

DO1_CPer001	Horas de Personal Fuera de Jornada (Fuerza Mayor) para restablecimiento y garantia del servicio durante la DANA y días posteriores - Agua Potable

Fase 0 - AP: Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transportes, dietas y alojamientos para personal desplazado, incluida horas extras.

01 Coste Operación | 01 Personal | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Se recogen los trabajos fuera de Jornada por Fuerza Mayor incurridas para la garantía de la continuidad del servicio de Saneamiento en el municipio

Se contempla el coste por Operario de las Horas fuera de Jornada por Fuerza Mayor en el periodo de restablemcimiento y garantia del servicio. Para evitar duplicidades de costes no se contempla las horas incurridas en jornada Laboral

Valoración	€ (PEM)	**3.270,77 €**

.

Valoración	€ (PEM)	- €

.

Valoración	€ (PEM)	- €

.

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Cod_Act	Comentario Trabajos Realizados	Cod Empleado	Hn	He	C Tot
DO1_CPer001	REVISIÓN, INSPECCIÓN O ESCUCHA	100105342		54,00	3.027,36
		131906410	9,50	2,50	69,68
		140008544	7,50		
		131905211	0,50	1,00	40,13
		131905206	9,25	4,00	133,60
Total DO1_CPer001			**26,75**	**61,50**	**3.270,77**
Total general			**26,75**	**61,50**	**3.270,77**

Chiva - Urb Calicanto

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1078	**TITULO**	**Analíticas Extraordinarias - Agua Potable**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**1.654,55 €**

DO1_CAn029	Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida

Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable

01 Coste Operación | 02 Analítica AP | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Plan analítico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración.

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Chiva 1 - 3 -5 - 6 -8 y 11

Valoración	€ (PEM)	**1.654,55 €**

-	

Valoración	€ (PEM)	**- €**

Anexos

DenCeBe: Chiva - Urb Calicanto

Cod_Act	Texto breve de material	Denominación de la ubicación técnica	Fecha de toma	Importe (PEM)
DO1_CAn029	DANA_ANALISIS_INICIAL_CONSUMO	CHIVA 3. Red Calicanto(Angel Guimera junto cont	19-dic	535,51 €
	DANA_SEMANAL_HIDRÁULICO_CLIE	CHIVA 11. Red Fuente Av. Rio Turia.	10-dic	137,38 €
			23-dic	137,38 €
			30-dic	137,38 €
		CHIVA 3. Red Calicanto(Angel Guimera junto cont	11-dic	137,38 €
			16-dic	137,38 €
			23-dic	137,38 €
			30-dic	137,38 €
	P_CTROL_15_RD3.2023	CHIVA 11. Red Fuente Av. Rio Turia.	03-nov	157,38 €
Total DO1_CAn029				**1.654,55 €**
Total general				**1.654,55 €**

Chiva - Urb Calicanto

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	TITULO	Trabajos urgentes en Instalaciones Electromecánicas
Dg Valencia Oest	1078		

VALORACIÓN	€ (PEM)	1.569,70 €

DO1_CElect001	Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas.

Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

01 Coste Operación | 03 Mnto Electromecánico | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Se recogen los trabajos realizados en las instalaciones por equipo especializado compuesto por oficial mantenimiento electromecánico coordinado por técnico especialista, en los días posteriores a la DANA

38 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de 39,5 horas de trabajo.

Valoración	€ (PEM)	1.569,70 €

-	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Cod_Act	Actividad	Ubicación técnica	Detalle del trabajo	C_Total
DO1_CElect001	Cloración	CALICANTO DEP SANTO DOMINGO ANALIZ	El valor del cloro en el depósito Santo Dc	36,09 €
			Mantenimiento analizador cloro	72,17 €
		CALICANTO DEP STO DOMINGO EQ.CLORA	Mantenimiento equipo cloración	36,09 €
		CALICANTO POZO STO DOMINGO CLORAC	Mantenimiento equipo cloración	
	Mantenimiento Electromecár	-	Fuga en la bomba de calucanto. Entra el	
		CALICANTO DEP STO DOMINGO BOYAS	Mantenimiento boyas	
		CALICANTO DEPOSITO SANTO DOMINGO	instalación toma de corriente	72,17 €
			Nivel de cloro alto (3,2 mg/l) en la salida	36,09 €
			No se reciben datos del nuevo akwamet	36,09 €
		CALICANTO POZO SANTO DOMINGO EQUI	Mantenimiento compresor (UV)	36,09 €
			Mantenimiento cuadro eléctrico (UV)	
			Mantenimiento equipo ultravioleta	27,06 €
		CALICANTO POZO SANTO DOMINGO REM	Revisar funcionamiento valvula	36,09 €
		CALICANTO POZO STO DOMINGO CT	Gestión del grupo electrógeno de Xàbia	304,15 €
		CALICANTO POZO STO DOMINGO VARIAD	Modificar a la baja la frecuencia de funci	46,40 €
		CALICANTO RBBO PICOS TEIDE ALARMA H	Mantenimiento alarma	54,13 €
		CALICANTO RBBO PICOS TEIDE BOMBA 1 (	Alternancia de bombas	36,09 €
			Megar, desmontar, secar y puesta en ma	139,19 €
		CALICANTO RBBO PICOS TEIDE BOMBA 2	Alternancia de bombas	36,09 €
			Megar, desmontar, secar y puesta en ma	139,19 €
		CALICANTO RBBO PICOS TEIDE REMOTA	Mantenimiento remota	72,17 €
		CALICANTO REBOMBEO PICOS DEL TEIDE	fallo rebombeo por corte de luz , reinicia	72,17 €
		CHIVA 11. Deposito Santo Domingo (Calica	Cambio de baterías Siemens	27,06 €
		URB. CALICANTO	fallo tensión en gp picos del teide	92,79 €
		URB. CALICANTO ERC AKWAMETRIC	Mantenimiento Akwametric	36,09 €
		URB. CALICANTO RIO JARAMA AKWAMETF	Calibrar analizador de Rio Jarama en Cali	36,09 €
			EL Analizador Akwametric de Rio Jarama	36,09 €
			Mantenimiento Akwametric	54,13 €
	Trabajos genéricos	-	MANTENIMIENTO FIJO MENSUAL	
Total DO1_CElect001				1.569,70 €
Total general				**1.569,70 €**

Chiva - Urb Calicanto

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva	CeBe	**TITULO**	**Trabajos en Instalaciones Interiores para garantizar servicio**
Dg Valencia Oest	1078		

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**359,05 €**

DO1_CInt001	Trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios del servicio durante los dias posteriores a la DANA

Fase 0 - AP: Gastos extraordinarios por el apoyo a voluntarios (alojamiento, manutención). Reparaciones de instalaciones interiores (grupos de presión, nuevas acometidas domiciliarias, inventario estado instalaciones)

01 Coste Operación | 05 Inst Interiores | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Se recogen los trabajos realizados en las instalaciones interiores de los usuarios, durante los 15 días posteriores a la DANA, para el restablecimiento de los servicios básicos y solución de probelemas generales de sus instalaciones.
Se realiza con personal propio y voluntarios

Se valora solo el coste del personal propio y los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención del personal voluntario.

Valoración	€ (PEM)	359,05 €

-	

Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Cod_Act	Tipo Aviso	Fecha Para Gráfico	Dirección	Importe (PEM)
DO1_CInt001	Fuga exterior	07/11/2024	Avenida Buenos Aires, 38 Chiva - Calic	179,53
			Calle Río Miño, Chiva - Calicanto, Chiv	179,53
Total DO1_CInt001				**359,05**
Total general				**359,05**

Chiva - Urb Calicanto

InfF:DANA_02 **Ficha Específica Afecciones DANA**

UTE Aguas de Chiva Dg Valencia Oest	CeBe 1078	**TITULO**	**Suministro Cubas Agua Potable al municipio**

VALORACIÓN	**€ (PEM)**	**23.735,00 €**

DO1_CCubasAP003

Fase 0 - AP: Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados

02 Actuación Singular (ejecutadas) | 06 Sum Cubas AP | Ejecutado | Gestor (RD7/24) | **Agua Potable**

Antecedentes

Jornadas completas camión cuba para suministro de Agua Potable al Municipio (Calicanto)

Detalle

13 jornadas (Prezero)

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
					23.735,00 €

Anexo II - Información adicional

PreZero España, S.A.U.
Avda. Alfahuir, 45
46019(Valencia)

FACTURA - PROFORMA

Número de factura: XXXXXXXXXXXX

Fecha de factura: XXXXXXXXX
N/Referencia: -
Fecha Declaración Impuesto: XXXXXXXXX
Página: 1/1

CLIENTE
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
NIF: XXXXXXXXXXXXXX
S/Referencia:
Domicilio fiscal: XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Factura por:

Servicios de cuba de agua potable realizados al municipio de Calicanto del 31 de Octubre de 2024 a 14 de Noviembre de 2024

Concepto	Cant.	Precio Un.	Importe
sábado, 2 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
domingo, 3 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
lunes, 4 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
martes, 5 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
miércoles, 6 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
jueves, 7 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
viernes, 8 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
sábado, 9 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
domingo, 10 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
lunes, 11 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00

Base Imponible	Impuesto	Importe Impuesto	Total Presupuesto

PreZero España, S.A.U.
Avda. Alfahuir, 45
46019(Valencia)

FACTURA - PROFORMA

Número de factura: XXXXXXXXXXXX

Fecha de factura: XXXXXXXXX
N/Referencia: -
Fecha Declaración Impuesto: XXXXXXXXX
Página: 1/1

CLIENTE
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
NIF: XXXXXXXXXXXXXX
S/Referencia:
Domicilio fiscal: XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Factura por:

Servicios de cuba de agua potable realizados al municipio de Calicanto del 31 de Octubre de 2024 a 14 de Noviembre de 2024

Concepto	Cant.	Precio Un.	Importe
martes, 12 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
miércoles, 13 de noviembre de 2024			
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
jueves, 14 de noviembre de 2024			
Coordinación de trabajos, logísitca, administración, Seguridad y Salud y otros conceptos incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo Gstos Generales y Beneficio Industrial	1,00	1.000,00	1.000,00
Jornada completa de camión cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	1.595,00	1.595,00
Desplazamiento, puesta en marcha o desmobilización de cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos incluyendo gastos generales y beneficio industrial	1,00	2.000,00	2.000,00

Base Imponible	Impuesto	Importe Impuesto	Total Presupuesto
23.735,00	IVA-21,00%	4.984,35	**28.719,35**

Original Cliente

Forma de pago: Transferencia
Banco: CAIXABANK
BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES3721002874870210059290
Vencimiento: XXXXXXXXX

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, TOMO 36.718, FOLIO 20, SECCIÓN 8, HOJA M-263638, INSCRIPCIÓN 42. NIF A82741067. DOMICILIO FISCAL C/ ALBARRACIN, 44, 28037 MADRID

FACTURAS HIDRAQUA

FORMATOMA CANALIZACIONES S.L.U
C/ RONDA DE LA QUIMICA, Nº 28
EDIF. ABM II, DESP. 2-2-B
POL. INDUSTRIAL L´ANDANA
PATERNA -46980
CIF: B- 98328024

HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS
DE LEVANTE, S.A
AVD. PAIA VALENCIANO Nº 84
GUADARRAMA DEL SEGURA - 03140
CIF: A/53223764.-

FACTURA: 269/2024

FECHA: 30/11/2024 **Nº DE PEDIDO: 3201800027**

EXPLOTACION: CHIVA - EL BOSQUE

SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA FACTUR

CANTIDAD	CONCEPTO	CODIGO	PRECIO	IMPORTE
1,00	TRABAJOS DANA PORTES AGUA POTABLE	NO COD.	195,00 €	195,00 €

SUMA	0,00 €
IVA 10%	0,00 €
SUMA	195,00 €
IVA 21%	40,95 €
TOTAL A COBRAR.	**235,95 €**

EXPLOTACION	URBANIZACION EL BOSQUE CHIVA

TRABAJOS LLUVIAS DANA

CHIVA - EL BOSQUE			27/11/2024	27/11/2024
Cdg.	**Uds.**	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
MAQ-18-3	3,00	Camión grua LLAVATA de el bosque a S-13 vuelta a el bosque	**65,00 €**	**195,00 €**
			TOTAL	195,00 €

TOTAL IMPUTACION **195,00 €**

TOTAL EXPLOTACION **195,00 €**

FORMATOMA CANALIZACIONES S.L.U
C/ RONDA DE LA QUIMICA, Nº 28
EDIF. ABM II, DESP. 2-2-B
POL. INDUSTRIAL L´ANDANA
PATERNA -46980
CIF: B- 98328024

HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A
AVD. PAIA VALENCIANO Nº 84
GUADARRAMA DEL SEGURA - 03140
CIF: A/53223764.-

FACTURA: 239/2024

FECHA: 12/11/2024 **Nº DE PEDIDO: 3201780987**

EXPLOTACION: EL BOSQUE CHIVA

SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA FACTUR

CANTIDAD	CONCEPTO	CODIGO	PRECIO	IMPORTE
1,00	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	23	473,52 €	473,52 €

SUMA	0,00 €
IVA 10%	0,00 €
SUMA	473,52 €
IVA 21%	99,44 €
TOTAL A COBRAR.	**572,96 €**

EXPLOTACION	LA ELIANA

23 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

CHIVA - EL BOSQUE			03/11/2024	03/11/2024	
Cdg.	**Uds.**	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**	
MO-06-3	4,00	Equipo de trabajo.	**76,48 €**	**305,92 €**	
MAQ-18-3	4,00	Camión grua	**41,90 €**	**167,60 €**	
			TOTAL	473,52 €	
		TOTAL IMPUTACION			**473,52 €**
		TOTAL EXPLOTACION			**473,52 €**

Original

FACTURA

Factura A24 / 1358
21 / Noviembre / 2024

TRANSPORTES LUIS BLANES, SL
NIF B05464342
C/ ERNESTO GALIANA, 23
03689 HONDON DE LOS FRAILES ALICANTE ESPAÑA
Tel. 619235296
transportesluisblanes@gmail.com

HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, SAU
NIF A53223764
AVDA CATEDRATICO SOLER, 50
03007 - ALICANTE
ALICANTE - ESPAÑA

Cliente: 774
Divisa: EUR

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN				
	Proforma A24/1 de 05/11/2024. - PEDIDO 3201793012				
HC	HORAS CAMION	12,5	80,00		1.000,00
	01/11				
HC	HORAS CAMION	11,5	80,00		920,00
	02/11				
HC	HORAS CAMION	10	80,00		800,00
	03/11				

Suma Importes	% Dcto. PP	Portes	Gastos	Cuota de I.V.A.	Cuota Rec. equiv.	Retención
2.720,00				**571,20**		

Forma de Pago	Base	% IVA	Cuota IVA
TRANSFERENCIA BANCSABADELL IBAN ES37 0081 1065 3000 0120 9828	2.720,00	21%	571,20
21/11/2024 3.291,20			

TOTAL
3.291,20 EUR

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: según lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos y por el Reglamento UE 2016/679 de la LSSI (34/2002), garantizamos la confidencialidad de sus datos los cuales serán incluidos en un fichero de nuestra propiedad. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, limitación del tratamiento o portabilidad de sus datos comunicándose por correo electrónico. Igualmente tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.

E.S. ALBORACHE, S.L.
CR Buñol-Cortes de Pallas Nº km 4,9
46369 ALBORACHE
VALENCIA - ESPAÑA -
CIF: B96318647

40955
HIDRAQUA G. INT.DE AGUAS LEVANTE S.A.U. (EL BOSQUE)
AV CATEDRATICO SOLER Nº 50
03007 ALICANTE
ALICANTE - ESPAÑA -

Página 1 de 1

Fecha Operación 04/11/2024

Dirección Fiscal
HIDRAQUA G. INT.DE AGUAS LEVANTE S.A.U.
AV CATEDRATICO SOLER Nº 50
03007 ALICANTE
ALICANTE - ESPAÑA -

NIF: A53223764

Fecha Factura 04/11/2024
Núm. Factura D240003888

Detallado

Ref.	Fecha / Hora	Producto	Establecimiento	Pedido	Ref. Ext.	Cantidad	P.Un.	Dto.	Importe
24482	04-11-2024 17:09	GASOLEO B	E.S. ALBORACHE, S.L.	P24/5674		760,00	0,8099€	0,00€	615,54€
		Dirección de Entrega:	UR EL BOSQUE S/N - (46370) CHIVA, Valencia						

Desglose de Impuestos

Base Imponible		IVA/IGIC	Cuota	
615,54 €		21,00 %		129,26 €
Total:	**615,54 €**		**Total:**	**129,26 €**

Total Factura: 744,80€

"setecientos cuarenta y cuatro euros con ochenta céntimos"

PEDIDO 3201783292

Resumen de Recibos

Vencimiento	Forma de Pago	Importe Recibo
03/01/2025	CONFIRMING	744,80 €
Banco:	**Cuenta:**	

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 4983 General 2291 de la Sección General del Libro de Sociedades, Folio 110, Hoja nº V-36704, Inscripción 1ª, C.I.F. B-96318647

Para G/A: Incorpora biocarburantes y/o biocombustibles < al 5% según normativa vigente.
La posesión de este documento no implica el pago del mismo. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento UE 2016/679 (en adelante, "RGPD") y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, "LOPDGDD"), ESTACIÓN DE SERVICIO ALBORACHE, S.L. informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que figuran en la presente factura. La finalidad del tratamiento consiste en el cumplimiento de una relación comercial y la base de legitimación para dicho tratamiento, de conformidad con el art. 6.1.b del RGPD, es la ejecución de un contrato. ESTACIÓN DE SERVICIO ALBORACHE, S.L. no cederá sus datos personales a terceros salvo obligación legal. El tratamiento de los datos con las finalidades descritas se mantendrá durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su recogida (mientras dure la relación comercial), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven del tratamiento de los datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas mediante comunicación a: dpo@febrerasesores.com.

E.S. ALBORACHE, S.L.
CR Buñol-Cortes de Pallas Nº km 4,9
46369 ALBORACHE
VALENCIA - ESPAÑA -
CIF: B96318647

40955
HIDRAQUA G. INT.DE AGUAS LEVANTE S.A.U. (EL BOSQUE)
AV CATEDRATICO SOLER Nº 50
03007 ALICANTE
ALICANTE - ESPAÑA -

Dirección Fiscal
HIDRAQUA G. INT.DE AGUAS LEVANTE S.A.U.
AV CATEDRATICO SOLER Nº 50
03007 ALICANTE
ALICANTE - ESPAÑA -

NIF: A53223764

Fecha Operación 06/11/2024

Fecha Factura 06/11/2024
Núm. Factura D240003943

Detallado

Ref.	*Fecha / Hora*	*Producto*	*Establecimiento*	*Pedido*	*Ref. Ext.*	*Cantidad*	*P.Un.*	*Dto.*	*Importe*
24541	06-11-2024 11:30	GASOLEO B	E.S. ALBORACHE, S.L.	P24/5720		818,00	0,8099 €	0,00 €	662,51 €
		Dirección de Entrega:	UR EL BOSQUE S/N - (46370) CHIVA, Valencia						

Desglose de Impuestos

Base Imponible	*IVA/IGIC*	*Cuota*
662,51 €	21,00 %	139,13 €
Total: 662,51 €		**Total: 139,13 €**

Total Factura: 801,64€

"ochocientos un euros con sesenta y cuatro céntimos"

PEDIDO 3201783239

Resumen de Recibos

Vencimiento	*Forma de Pago*	*Importe Recibo*
05/01/2025	CONFIRMING	801,64 €
Banco:	**Cuenta:**	

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 4983 General 2291 de la Sección General del Libro de Sociedades, Folio 110, Hoja nº V-36704, Inscripción 1ª, C.I.F. B-96318647

Para G/A: Incorpora biocarburantes y/o biocombustibles < al 5% según normativa vigente.
La posesión de este documento no implica el pago del mismo. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento UE 2016/679 (en adelante, "RGPD") y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, "LOPDGDD"), ESTACIÓN DE SERVICIO ALBORACHE, S.L. informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que figuran en la presente factura. La finalidad del tratamiento consiste en el cumplimiento de una relación comercial y la base de legitimación para dicho tratamiento, de conformidad con el art. 6.1.b del RGPD, es la ejecución de un contrato. ESTACIÓN DE SERVICIO ALBORACHE, S.L. no cederá sus datos personales a terceros salvo obligación legal. El tratamiento de los datos con las finalidades descritas se mantendrá durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su recogida (mientras dure la relación comercial), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven del tratamiento de los datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas mediante comunicación a: dpo@febrerasesores.com.

FACTURA

Nº factura: 7010077443
Fecha factura: 19.12.2024

AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES N..I.F.: ESA85788073
Paseo de la Zona Franca 48, 08038, Barcelona

ING-Sist.Contr.Sud

Nº Cliente: 2000270 HIDRAQUA S.A - L'ELIANA VALENCIA 34 46183, L'ELIANA, España	**Dirección de envío factura** COAE TORRENT Plaza Colon, 13, planta 1, Edifici 46900 TORRENT ES
Datos fiscales: 1000060 **NIF:** A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS AVDA. CATEDRÁTICO SOLER, 50, 03007, ALICANTE	

Vencimiento:	19.01.2025	**Pedido cliente:**	3201811239
Vía de pago:	Transferencia Cobro	**Incoterms:**	CIF - 1
Condición de pago:	COBRO A 30 DIAS FECHA FACTURA		

Observaciones Generales
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con atencionclientescsc@agbar.es
Observaciones: S/ REF. 3201811239

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	Dto.	
Pedido: 147956		**Pedido cliente:** 3201811239					
Análisis 0147956							
Oferta: 20132637							
10	59311	MODULO 8 EA 12 BIT BORNA /M2xx	1,00	UN	249,09€	54,41 %	113,56 €
20	S000087	Asistencia técnica pzo el bosque	5,00	H	55,00€		275,00 €
		(caudal mecánico, diagnostico analogicas)					
30	G363000	PORTES	1,00	UN	25,00€		25,00 €
		Subtotal de pedido: **413,56** €					
		Dto. % cliente					-135,53 €

Base Imponible	IVA	Cuota
413,56€	21,00 %	86,85€

Neto factura:	413,56 €
Total IVA:	86,85 €
Total factura:	500,41 €

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es: ES97 0182 3994 0002 0154 9037.
La presente factura (parcial o total) se ajusta a los términos reflejados en nuestra oferta aceptada por uds. Cualquier disconformidad con el alcance del suministro debe ser informado a AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A.U. a la mayor brevedad. En el caso de la recepción de embalajes deteriorados o equipos dañados durante el transporte, deben comunicarlo en las 24 h. inmediatas posteriores a la entrega para poder tramitar la reclamación correspondiente al responsable del envío. Para la devolución de cualquier componente de este suministro, deben hacer la correspondiente solicitud a AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A.U. que a su vez les dará un nº de referencia con el que podrán devolver la mercancía con portes a su cargo.
TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS INFORMADOS EN PIE DE PÁGINA

FARELL Instruments, S.L.
Telemática 17 - Pol. Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac Barcelona - Spain
Tel.: (+34) 935 725 250 Fax: (+34) 935 725 260
administracion@farell-i.com www.farell-i.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNE-EN ISO 9001 CERT
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

CIF - B58834797

Destinatario:

HIDRAQUA GEST. INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.U.
Av. Catedrático Soler, 50
03007 ALICANTE

FACTURA

552

CIF A-53223764

Número	Fecha	Su Referencia	S/Nº Proveedor	N/ Pedido
24/0473	17/12/2024	3201811274		24/17130-1-2-3

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DTO. COM.	TOTAL NETO
24/031907	REVIEQUIP	REVISION TAF NºS. 10B118	1	50,00	0,00%	50,00
24/031908	REPATAF	REPARACION TAF NºS. 10B218	1	110,00	0,00%	110,00
24/031909	REPATAF	UNIDAD TAF NºS. 024U3045 NO SE REPARA	1	0,00	0,00%	0,00
24/031910	REPATAF	UNIDAD TAF NºS. 024U3023 NO SE REPARA	1	0,00	0,00%	0,00
	PORT	PORTES	1	25,00	0,00%	25,00
		MATERIAL ENVIADO A L'ELIANA - VALENCIA				

TOTAL NETO	TIPO DE IVA %	I.V.A.			TOTAL FACTURA (EUR)
185,00	21%	38,85			**223,85**

Vencimiento:	25/02/2025				
Forma de pago:	CONFIRMING 60 D 25				
Entidad:					

77267880R JOSEP PICANYOL (R: B58834797)

Firmado digitalmente por 77267880R JOSEP PICANYOL (R: B58834797)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:B-77781 / Tomo:26385 /Folio:68 / Fecha:21/07/2022 /Inscripción:13, serialNumber=IDCES-77267880R, givenName=JOSEP, sn=PICANYOL VALLS, cn=77267880R JOSEP PICANYOL (R: B58834797), 2.5.4.97=VATES-B58834797, o=FARELL INSTRUMENTS SL, c=ES
Fecha: 2024.12.17 10:55:41 +01'00'

FARELL INSTRUMENTS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 26385, Folio 68, Hoja B-77781

POWER ELECTRONICS

Factura

Número de factura: **1024160770**
Fecha de factura: **13.11.2024**

Información factura
Código de cliente: 100251
*HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,
AV. CATEDRATICO SOLER, 50
03007, ALICANTE, ES
CIF cliente: A53223764
Referencia de pedido: Urbanización el bosque. Pozo el
Referencia: SD7058052
Nº serie / Nº Parte: 46074206/
VARIADOR DE VELOCIDAD SD7 725A 400V IP20

Destinatario de factura
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
AV. CATEDRATICO SOLER, 50,
03007 ALICANTE Alicante
Tfno: 966745055 - España

Observaciones
CODIGO DE PROVEEDOR: 0145

Nº de parte: 300459440 Fecha: 01.11.2024

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
1	E0465	FUSIBLE 2A 700VAC 6.3X32MM	15,00 UN	12,00	180,00
	Referencia reparada: SD7058052				
	Nº de serie: 46074206				
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440				
	Correspondiente a su pedido: 3201781160				
2	E0879	FUSIBLE 4A 500VAC FF 6.3X32MM	10,00 UN	5,60	56,00
	Referencia reparada: SD7058052				
	Nº de serie: 46074206				
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440				
	Correspondiente a su pedido: 3201781160				
3	L450A00045AA	KIT SAT FTE. SD75-SD70 (<> FTES.)	2 PC	42,00	84,00
	Referencia reparada: SD7058052				
	Nº de serie: 46074206				

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
WWW.POWER-ELECTRONICS.COM
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d´Aviació nº 4
46160 Llíria - Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57
Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.966, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17.327, Inscripción 5ª CIF B46419834 VAT ESB46419834

POWER ELECTRONICS

Número de factura: **1024160770**
Fecha de factura: **13.11.2024**

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad		Precio EUR	Importe EUR
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440					
	Correspondiente a su pedido: 3201781160					
4	L2024	KIT SUST. TARJ POT T4-T11 POR PCB C0028N	1,00	UN	130,38	130,38
	Referencia reparada: SD7058052					
	Nº de serie: 46074206					
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440					
	Correspondiente a su pedido: 3201781160					
5	L450A00044AA	KIT SAT FTE. SD75-SD70 (A FTE. 1)	1	PC	42,00	42,00
	Referencia reparada: SD7058052					
	Nº de serie: 46074206					
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440					
	Correspondiente a su pedido: 3201781160					
6	E953AC	TARJ FTE VENTILADORES 400V 24V SD750	3,00	UN	828,00	2.484,00
	Referencia reparada: SD7058052					
	Nº de serie: 46074206					
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440					
	(3909038, 4253984, 4254050)					
	Correspondiente a su pedido: 3201781160					
7	HEXTRTARDESP (PDD)	EXTRA DESPLAZAMIENTO FESTIVO/FIN SEMANA	4,0	HRA	220,00	880,00
	Referencia reparada: SD7058052					
	Nº de serie: 46074206					
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440					

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d´Aviació nº 4
46160 Llíria - Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57

WWW.POWER-ELECTRONICS.COM
Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.966, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17.327, Inscripción 5ª CIF B46419834 VAT ESB46419834

POWER ELECTRONICS

Número de factura: **1024160770**
Fecha de factura: **13.11.2024**

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
	Correspondiente a su pedido: 3201781160				
8	HEXTRATARD (PDD)	HORAS EXTRA FESTIVO/FIN DE SEMANA	1,5 HRA	220,00	330,00
	Referencia reparada: SD7058052				
	Nº de serie: 46074206				
	Nuestro pedido. 70053558 / 300459440				
	Correspondiente a su pedido: 3201781160				
				Subtotal:	4.186,38

Total bruto EUR	Base imponible	IVA EUR 21,00 %	Total EUR
4.186,38	**4.186,38**	**879,14**	**5.065,52**

Condiciones de venta

Forma de pago: Confirming
Condiciones de pago: 85 Días f.f.

Vencimientos
06.02.2025 5.065,52 EUR

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d´Aviació nº 4
46160 Llíria - Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57
WWW.POWER-ELECTRONICS.COM

Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.966, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17.327, Inscripción 5ª CIF B46419834 VAT ESB46419834

POWER ELECTRONICS

Factura

Número de factura: **1024160771**
Fecha de factura: **13.11.2024**

Información factura
Código de cliente: 100251
*HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,
AV. CATEDRATICO SOLER, 50
03007, ALICANTE, ES
CIF cliente: A53223764
Referencia de pedido: 3201783493
Referencia: E539DB
Nº serie / Nº Parte: 2970791/
TARJETA FUENTE VENTILADORES DE 400V 24V

Destinatario de factura
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
AV. CATEDRATICO SOLER, 50,
03007 ALICANTE Alicante
Tfno: 966745055 - España

Observaciones
Nº PROVEEDOR: 0145

Nº de albarán: 4926316415 Fecha: 12.11.2024

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
1	E1707	RESISTENCIA CONV 10R 7W 5% W22	3,00 UN	3,64	10,92
	Referencia reparada:				
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 585321 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201783493				
2	HORASTALLER (PDD)	NORMALES TALLER	1,0 HRA	85,00	85,00
	Referencia reparada:				
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 585321 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201783493				
				Subtotal:	95,92

Total bruto EUR	Base imponible	IVA EUR 21,00 %	Total EUR
95,92	**95,92**	**20,14**	**116,06**

Condiciones de venta

Forma de pago: Confirming
Condiciones de pago: 85 Días f.f.

Vencimientos
06.02.2025 116,06 EUR

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d´Aviació nº 4
46160 Llíria - Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57
WWW.POWER-ELECTRONICS.COM

Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.966, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17.327, Inscripción 5ª CIF B46419834 VAT ESB46419834

POWER ELECTRONICS

Factura

Número de factura: **1024160860**
Fecha de factura: **30.11.2024**

Información factura
Código de cliente: 100251
*HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,
AV. CATEDRATICO SOLER, 50
03007, ALICANTE, ES
CIF cliente: A53223764
Referencia de pedido: 3201789687
Referencia: E539DB
Nº serie / Nº Parte: 2970782/
TARJETA FUENTE VENTILADORES DE 400V 24V

Destinatario de factura
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
AV. CATEDRATICO SOLER, 50,
03007 ALICANTE Alicante
Tfno: 966745055 - España

Observaciones

Nº de albarán: 4926459649 Fecha: 18.11.2024

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
1	E1707	RESISTENCIA CONV 10R 7W 5% W22	3,00 UN	3,64	10,92
	Referencia reparada:				
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 587414 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201789687				
2	HORASTALLER (PDD)	NORMALES TALLER	1,0 HRA	85,00	85,00
	Referencia reparada:				
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 587414 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201789687				
				Subtotal:	95,92

Total bruto EUR	Base imponible	IVA EUR 21,00 %	Total EUR
95,92	**95,92**	**20,14**	**116,06**

Condiciones de venta

Forma de pago: Confirming
Condiciones de pago: 85 Días f.f.

Vencimientos
23.02.2025 116,06 EUR

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d´Aviació nº 4
46160 Llíria - Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57
WWW.POWER-ELECTRONICS.COM

Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.966, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17.327, Inscripción 5ª CIF B46419834 VAT ESB46419834

POWER ELECTRONICS

Factura

Número de factura: **1024160861**
Fecha de factura: **30.11.2024**

Información factura
Código de cliente: 100251
*HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,
AV. CATEDRATICO SOLER, 50
03007, ALICANTE, ES
CIF cliente: A53223764
Referencia de pedido: 3201789663
Referencia: E539DB
Nº serie / Nº Parte: 1117851/
TARJETA FUENTE VENTILADORES DE 400V 24V

Destinatario de factura
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
AV. CATEDRATICO SOLER, 50,
03007 ALICANTE Alicante
Tfno: 966745055 - España

Observaciones
nº proveedor: 145

Nº de albarán: 4926459537 Fecha: 18.11.2024

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
1	E1707	RESISTENCIA CONV 10R 7W 5% W22	1,00 UN	3,64	3,64
	Referencia reparada:				
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 587415 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201789663				
2	E1113	CONEC ACODADO SER 6746 DE 2 V, SIN OREJA	2,00 UN	1,26	2,52
	Referencia reparada:				
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 587415 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201789663				
3	E1259	VARISTOR CONV 385VAC 505VDC D14MM	1,00 UN	5,46	5,46
	Referencia reparada:				

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
WWW.POWER-ELECTRONICS.COM
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d´Aviació nº 4
46160 Llíria - Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57
Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.966, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17.327, Inscripción 5ª CIF B46419834 VAT ESB46419834

POWER ELECTRONICS

Número de factura: **1024160861**
Fecha de factura: **30.11.2024**

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 587415 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201789663				
4	HORASTALLER (PDD)	NORMALES TALLER	1,0 HRA	85,00	85,00
	Referencia reparada:				
	Nº de serie:				
	Nuestro pedido. 587415 /				
	Correspondiente a su pedido: 3201789663				
				Subtotal:	96,62

Total bruto EUR	Base imponible	IVA EUR 21,00 %	Total EUR
96,62	**96,62**	**20,29**	**116,91**

Condiciones de venta

Forma de pago: Confirming
Condiciones de pago: 85 Días f.f.

Vencimientos
23.02.2025 116,91 EUR

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d´Aviació nº 4
46160 Llíria - Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57

WWW.POWER-ELECTRONICS.COM

Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.966, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17.327, Inscripción 5ª CIF B46419834 VAT ESB46419834

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A5322376457501	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 50157

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	283,32
IMPORTE TOTAL A PAGAR	283,32
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	283,32

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
50157	501	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	09-01-2025	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
CONO REDUCCION S/TOPE 90/63 PN 16 PLASSON		1,00	17,500000	17,500000
DERIVACIÓN EN TE BOCAS IGUALES S/T PN 16 DN 160 INYECTADO		1,00	65,600000	65,600000
MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 160		2,00	22,320000	44,640000
MANG. ELECTROSOLD.RED. 160/90		2,00	85,750000	171,500000
MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 63		1,00	5,580000	5,580000
JUNTA PLANA CAUCHO DN 80		1,00	1,680000	1,680000
TORNILLO ZINCADO 16 X 80		8,00	1,080000	8,640000
TUERCA ZINCADA M16		8,00	0,290000	2,320000
ARANDELA DIN 125 ZN M16		16,00	0,170000	2,720000
CODO 90º ELECTROSOLD. DN 160		1,00	113,430000	113,430000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**234,15**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**234,15**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	234,15	49,17	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**49,17**
TOTAL FACTURA	**283,32**
TOTAL A PAGAR	**283,32**
TOTAL A EJECUTAR	**283,32**

CONO REDUCCION S/TOPE 90/63 PN 16 PLASSON

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63270P	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201825082	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**17,500000**
COSTE TOTAL	**17,500000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	8,050000
IMPORTE BRUTO		**9,450000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	9,45	1,98	-	-

DERIVACIÒN EN TE BOCAS IGUALES S/T PN 16 DN 160 INYECTADO

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63120	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201825082	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**65,600000**
COSTE TOTAL	**65,600000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	30,180000
IMPORTE BRUTO		**35,420000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	35,42	7,44	-	-

MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 160

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62216	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201825082	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**22,320000**
COSTE TOTAL	**44,640000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	20,530000
IMPORTE BRUTO		**24,110000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	24,11	5,06	-	-

MANG. ELECTROSOLD.RED. 160/90

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62289	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201825082		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**85,750000**
COSTE TOTAL	**171,500000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	78,890000
IMPORTE BRUTO		**92,610000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	92,61	19,45	-	-

MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 63

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62204	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201825082		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**5,580000**
COSTE TOTAL	**5,580000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,570000
IMPORTE BRUTO		**3,010000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3,01	0,63	-	-

JUNTA PLANA CAUCHO DN 80

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
6	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16604	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201825082		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,680000**
COSTE TOTAL	**1,680000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	0,770000
IMPORTE BRUTO		**0,910000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	0,91	0,19	-	-

TORNILLO ZINCADO 16 X 80

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21030T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201825082	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,080000**
COSTE TOTAL	**8,640000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,970000
IMPORTE BRUTO		**4,670000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	4,67	0,98	-	-

TUERCA ZINCADA M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
8	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21180	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201825082	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,290000**
COSTE TOTAL	**2,320000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	1,070000
IMPORTE BRUTO		**1,250000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	1,25	0,26	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
9	16,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21215	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201825082	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,170000**
COSTE TOTAL	**2,720000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	1,250000
IMPORTE BRUTO		**1,470000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	1,47	0,31	-	-

CODO 90º ELECTROSOLD. DN 160

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
10	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62414	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201825082		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/19	02-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**113,430000**
COSTE TOTAL	**113,430000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	52,180000
IMPORTE BRUTO		**61,250000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	61,25	12,86	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
50157	501	09-01-2025	234,15	283,32

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A53223764214412	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 412214

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	467,59
IMPORTE TOTAL A PAGAR	467,59
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	467,59

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
412214	412	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	20-12-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL DN 300 (348-382)		1,00	338,680000	338,680000
BRIDA ROSCADA PN 10 ACERO 300 - 2"		1,00	197,500000	197,500000
ENLACE R. M. LATON 63-2" EFFEBI "TOF"		2,00	41,500000	83,000000
VALV.ESFERA C/CUADR. DN 2" MOD TURIA ARCO		1,00	53,680000	53,680000
JUNTA PLANA CAUCHO DN 300		1,00	9,270000	9,270000
TORNILLO ZINCADO 20 X 80		12,00	1,910000	22,920000
TUERCA ZINCADA M20		12,00	0,550000	6,600000
ARANDELA DIN 125 ZN M20		12,00	0,330000	3,960000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**386,44**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**386,44**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	386,44	81,15	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**81,15**
TOTAL FACTURA	**467,59**
TOTAL A PAGAR	**467,59**
TOTAL A EJECUTAR	**467,59**

BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL DN 300 (348-382)

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
BEU348-382	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**338,680000**
COSTE TOTAL	**338,680000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	155,790000
IMPORTE BRUTO		**182,890000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	182,89	38,41	-	-

BRIDA ROSCADA PN 10 ACERO 300 - 2"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
BR300002A	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**197,500000**
COSTE TOTAL	**197,500000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	90,850000
IMPORTE BRUTO		**106,650000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	106,65	22,40	-	-

ENLACE R. M. LATON 63-2" EFFEBI "TOF"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
34015E	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**41,500000**
COSTE TOTAL	**83,000000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	38,180000
IMPORTE BRUTO		**44,820000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	44,82	9,41	-	-

VALV.ESFERA C/CUADR. DN 2" MOD TURIA ARCO

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	1,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
16645	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**53,680000**
COSTE TOTAL	**53,680000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	24,690000
IMPORTE BRUTO		**28,990000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	28,99	6,09	-	-

JUNTA PLANA CAUCHO DN 300

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16611	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**9,270000**
COSTE TOTAL	**9,270000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	4,260000
IMPORTE BRUTO		**5,010000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	5,01	1,05	-	-

TORNILLO ZINCADO 20 X 80

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
6	12,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21060T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,910000**
COSTE TOTAL	**22,920000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	10,540000
IMPORTE BRUTO		**12,380000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	12,38	2,60	-	-

TUERCA ZINCADA M20

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	12,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
21185	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,550000**
COSTE TOTAL	**6,600000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,040000
IMPORTE BRUTO		**3,560000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3,56	0,75	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M20

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
8	12,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21220	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816137	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5748	17-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,330000**
COSTE TOTAL	**3,960000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	1,820000
IMPORTE BRUTO		**2,140000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	2,14	0,45	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
412214	412	20-12-2024	386,44	467,59

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A532237647412	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 4127

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	647,56
IMPORTE TOTAL A PAGAR	647,56
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	647,56

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
4127	412	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	04-12-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
JUNTA PLANA CAUCHO DN 125		4,00	2,210000	8,840000
TORNILLO ZINCADO 16 X 90		16,00	1,140000	18,240000
TORNILLO ZINCADO 16 X 170		8,00	2,700000	21,600000
TUERCA ZINCADA M16		24,00	0,290000	6,960000
ARANDELA DIN 125 ZN M16		32,00	0,170000	5,440000
VALV. COMP. C.E. DN 125 MAFUSA		1,00	253,000000	253,000000
CUADRADILLO VALVULA MAFUSA DN 100-125-150		1,00	7,740000	7,740000
DERIVACIÓN EN TE BOCAS IGUALES S/T PN 16 DN 160 INYECTADO		1,00	65,600000	65,600000
MANG. ELECTROSOLD.RED. 160/125		1,00	105,280000	105,280000
CODO 90º ELECTROSOLD. DN 125		3,00	69,940000	209,820000
MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 125		4,00	18,100000	72,400000
PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 125		2,00	13,920000	27,840000
PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 125 REBAJADO PARA MARIPOSA		2,00	24,000000	48,000000
BRIDA LOCA ACERO DN 125 P/PORTABRIDAS PE DN 125		4,00	35,080000	140,320000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**535,17**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**535,17**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	535,17	112,39	-	-
			TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS		**112,39**

TOTAL FACTURA	647,56
TOTAL A PAGAR	647,56
TOTAL A EJECUTAR	647,56

JUNTA PLANA CAUCHO DN 125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	4,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16606	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201804612		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	2,210000
COSTE TOTAL	8,840000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	4,070000
IMPORTE BRUTO		4,770000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	4,77	1,00	-	-

TORNILLO ZINCADO 16 X 90

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	16,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21035T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201804612		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	1,140000
COSTE TOTAL	18,240000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	8,390000
IMPORTE BRUTO		9,850000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	9,85	2,07	-	-

TORNILLO ZINCADO 16 X 170

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21055T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201804612		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	2,700000
COSTE TOTAL	21,600000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	9,940000
IMPORTE BRUTO		11,660000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)		CUOTA		

		BASE IMPONIBLE		RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	11,66	2,45	-	-

TUERCA ZINCADA M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	24,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21180	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	0,290000
COSTE TOTAL	6,960000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,200000
IMPORTE BRUTO		3,760000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3,76	0,79	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	32,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21215	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	0,170000
COSTE TOTAL	5,440000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,500000
IMPORTE BRUTO		2,940000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	2,94	0,62	-	-

VALV. COMP. C.E. DN 125 MAFUSA

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
6	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
24015MF	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	253,000000
COSTE TOTAL	253,000000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	116,380000
IMPORTE BRUTO		136,620000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)		CUOTA		

		BASE IMPONIBLE		RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	136,62	28,69	-	-

CUADRADILLO VALVULA MAFUSA DN 100-125-150

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
24162MA100-15	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	7,740000
COSTE TOTAL	7,740000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,560000
IMPORTE BRUTO		4,180000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	4,18	0,88	-	-

DERIVACIÒN EN TE BOCAS IGUALES S/T PN 16 DN 160 INYECTADO

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
8	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63120	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	65,600000
COSTE TOTAL	65,600000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	30,180000
IMPORTE BRUTO		35,420000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	35,42	7,44	-	-

MANG. ELECTROSOLD.RED. 160/125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
9	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
622901	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	105,280000
COSTE TOTAL	105,280000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	48,430000
IMPORTE BRUTO		56,850000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)		CUOTA		

		BASE IMPONIBLE		RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	56,85	11,94	-	-

CODO 90º ELECTROSOLD. DN 125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
10	3,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62412	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	69,940000
COSTE TOTAL	209,820000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	96,520000
IMPORTE BRUTO		113,300000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	113,30	23,79	-	-

MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	4,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62212	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	18,100000
COSTE TOTAL	72,400000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	33,300000
IMPORTE BRUTO		39,100000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	39,10	8,21	-	-

PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
12	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63348	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201804612	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	13,920000
COSTE TOTAL	27,840000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	12,810000
IMPORTE BRUTO		15,030000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)		CUOTA		

		BASE IMPONIBLE		RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	15,03	3,16	-	-

PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 125 REBAJADO PARA MARIPOSA

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
13	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63348R	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201804612		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	24,000000
COSTE TOTAL	48,000000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	22,080000
IMPORTE BRUTO		25,920000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	25,92	5,44	-	-

BRIDA LOCA ACERO DN 125 P/PORTABRIDAS PE DN 125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
14	4,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16446	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201804612		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5526	03-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	35,080000
COSTE TOTAL	140,320000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	64,550000
IMPORTE BRUTO		75,770000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	75,77	15,91	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
4127	412	04-12-2024	535,17	647,56

IBERAGUA LEVANTE, S.A. CIF: A-96.345.798
Calle dels Seders, s/n · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Teléfono: 96 166 70 35 · Fax: 96 166 90 89
www.iberagua.com

factura

nº factura 412 . 73

fecha **10/12/2024**

nº cliente 2545

nº pedido 3201797529

HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140 GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
A53223764

código	descripción	cantidad	precio	dto	importe
	Alb. S24/5270 de 20/11/2024				
22129	*CABEZAL COLLARIN BELGICAST DN 200/600 SALIDA BRIDA 125*	*1,00*	*292,15*	*46,00*	*157,76*

forma de pago
75 DIAS F/ FRA(LEY 15/2010 BOE 06/07/10)

vencimiento importe
05/03/2025 190,89

nº cuenta

bruto	157,76
descuento gastos	
com.	
base imponible	157,76
i.v.a. 21 %	33,13
total factura	**190,89 €**

jose luis
bosque

SERVICIO 24 HORAS:
618 317 345

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A53223764259411	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 411259

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	379,69
IMPORTE TOTAL A PAGAR	379,69
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	379,69

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
411259	411	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	30-11-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRIDAS PE DN 110		3,00	21,090000	63,270000
PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 110		3,00	10,570000	31,710000
JUNTA PLANA CAUCHO DN 100		4,00	1,980000	7,920000
TORNILLO ZINCADO 16 X 70		32,00	1,020000	32,640000
TUERCA ZINCADA M16		32,00	0,290000	9,280000
ARANDELA DIN 125 ZN M16		32,00	0,170000	5,440000
VALV. COMP. C.E. DN 100 MAFUSA		2,00	185,380000	370,760000
CUADRADILLO VALVULA MAFUSA DN 100-125-150		2,00	7,740000	15,480000
CODO 90º ELECTROSOLD. DN 110		1,00	44,580000	44,580000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**313,79**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**313,79**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	313,79	65,90	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**65,90**
TOTAL FACTURA	**379,69**
TOTAL A PAGAR	**379,69**
TOTAL A EJECUTAR	**379,69**

BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRIDAS PE DN 110

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	3,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
16445	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201799681	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**21,090000**
COSTE TOTAL	**63,270000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	29,100000
IMPORTE BRUTO		**34,170000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	34,17	7,18	-	-

PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 110

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	3,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63346	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201799681	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**10,570000**
COSTE TOTAL	**31,710000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	14,590000
IMPORTE BRUTO		**17,120000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	17,12	3,60	-	-

JUNTA PLANA CAUCHO DN 100

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	4,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16605	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201799681	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,980000**
COSTE TOTAL	**7,920000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,640000
IMPORTE BRUTO		**4,280000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	4,28	0,90	-	-

TORNILLO ZINCADO 16 X 70

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	32,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
21025T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201799681		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,020000**
COSTE TOTAL	**32,640000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	15,010000
IMPORTE BRUTO		**17,630000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	17,63	3,70	-	-

TUERCA ZINCADA M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	32,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21180	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201799681		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,290000**
COSTE TOTAL	**9,280000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	4,270000
IMPORTE BRUTO		**5,010000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	5,01	1,05	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
6	32,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21215	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201799681		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,170000**
COSTE TOTAL	**5,440000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,500000
IMPORTE BRUTO		**2,940000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	2,94	0,62	-	-

VALV. COMP. C.E. DN 100 MAFUSA

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	2,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
24014MF	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201799681		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**185,380000**
COSTE TOTAL	**370,760000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	170,550000
IMPORTE BRUTO		**200,210000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	200,21	42,04	-	-

CUADRADILLO VALVULA MAFUSA DN 100-125-150

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
8	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
24162MA100-15	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201799681		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**7,740000**
COSTE TOTAL	**15,480000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	7,120000
IMPORTE BRUTO		**8,360000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	8,36	1,76	-	-

CODO 90º ELECTROSOLD. DN 110

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
9	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62410	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201799681		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5383	26-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**44,580000**
COSTE TOTAL	**44,580000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	20,510000
IMPORTE BRUTO		**24,070000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	24,07	5,05	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
411259	411	30-11-2024	313,79	379,69

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A53223764175412	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 412175

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	5,95
IMPORTE TOTAL A PAGAR	5,95
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	5,95

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
412175	412	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	17-12-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
TORNILLO ZINCADO SIN TUERCA PEQUEÑO CALIBRE 12X70		8,00	0,720000	5,760000
TUERCA ZINCADA M12		8,00	0,140000	1,120000
ARANDELA DIN 125 ZN M14		16,00	0,140000	2,240000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**4,92**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**4,92**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	4,92	1,03	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**1,03**
TOTAL FACTURA	**5,95**
TOTAL A PAGAR	**5,95**
TOTAL A EJECUTAR	**5,95**

TORNILLO ZINCADO SIN TUERCA PEQUEÑO CALIBRE 12X70

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
TOR12X070	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201813290		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5709	13-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	0,720000
COSTE TOTAL	5,760000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,650000
IMPORTE BRUTO		3,110000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3,11	0,65	-	-

TUERCA ZINCADA M12

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21170	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813290	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5709	13-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	0,140000
COSTE TOTAL	1,120000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	0,520000
IMPORTE BRUTO		0,600000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	0,60	0,13	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M14

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	16,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21210	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813290	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5709	13-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	0,140000
COSTE TOTAL	2,240000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	1,030000
IMPORTE BRUTO		1,210000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	1,21	0,25	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
412175	412	17-12-2024	4,92	5,95

Datos cliente

HIDRAQUA

Att. Miguel Angel Navarro Garcia

miguel-angel.navarro@aigueshorta.es

629 31 89 44

Audiotec
INGENIERÍA ACÚSTICA

Fecha	17-feb.-2025
Código presupuesto	IND23040080
Presupuesto válido hasta	19-mar.-2025

Descripción	Precio	Unidades	Importe
Puerta acústica serie DOORTEC METAL 40 de 2 hojas	3.464,00	1,00	3.464,00
Índice de aislamiento acústico 40 dBA			
Herrajes: 4 pernios helicoidales D18			
Hoja de 63 mm de espesor			
Dimensiones interiores Ancho: 2.000 mm. Alto: 2.500 mm.			
Acabado lacado en color RAL puerta metal			
Pletina inferior. Resalte 5 mm			
Incluye manilla estándar			
No incluye cierre antipánico			
No incluye visor			
			-
Instalación	420,00	1,00	420,00
			-
			-

Conforme el cliente

Nombre:	Firma:
CIF/NIF:	
Fecha:	

TOTAL	**€**	**3.884,00**
IVA	%	21,00
Total IVA	€	815,64
Total IVA inc.	€	4.699,64

La aceptación del presente presupuesto implica la conformidad con el mismo.
No se aceptan reclamaciones una vez firmado el albarán de entrega del material.

PLAZO DE ENTREGA: 5 Semanas. (Desde la recepción del pago)

Forma de pago

Transferencia bancaria 100% a la firma del presupuesto
Nº CUENTA: 0182 6550 41 0201682430

Av. de las Cortes Valencianas 39 - Edificio Geminis Center - Valencia
Tel: 902 37 37 99
levante@audiotec.es www.audiotec.es

efr pyme certificado en conciliación e igualdad 000/02-2008/CERTIF
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO14001
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001

LABAQUA

FACTURA
CONTABILIZADA AFAC

FACTURA

Nº factura: 1177261841
Fecha factura: 13.11.2024

Nº Cliente: 2000274 HIDRAQUA S.A - Bosque de Chiva Parcela 182. Urb El bosque 46370, Chiva, España	**Dirección de envío factura** HIDRAQUA S.A - Bosque de Chiva Parcela 182. Urb El bosque 46370 Chiva ES España
Datos fiscales: 1000060 **NIF:** A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS AVDA. CATEDRÁTICO SOLER, 50, 03007, ALICANTE	
Vencimiento: 10.02.2025 **Vía de pago:** Cobro por confirming **Condición de pago:** COBRO A 60 DIAS EL DIA 10	**Pedido cliente:** 2200213982 **Incoterms:** UN - Sin franquear

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
Pedido: L008376662 **Pedido cliente:** 2200213982						
Análisis 8376662						
		Fecha fin análisis: 13.11.2024				
20	950867	LyD Dpto. Bosque Chiva - 350 m3	1,00	UN	1.377,00€	1.377,00 €
		Subtotal de pedido: **1.377,00** €				

Base Imponible	IVA	Cuota
1.377,00€	21,00 %	289,17€

Neto factura:	1.377,00 €
Total IVA:	289,17 €
Total factura:	1.666,17 €

Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327
Para cualquier aclaración sobre esta factura Tlf. 96 510 60 70 (Dpto. Administración) o en administracion@labaqua.com
TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS

LABAQUA

FACTURA
CONTABILIZADA AFAC

FACTURA

Nº factura: 1177268671
Fecha factura: 03.01.2025

Nº Cliente: 2000274 HIDRAQUA S.A - Bosque de Chiva Parcela 182. Urb El bosque 46370, Chiva, España	**Dirección de envío factura** HIDRAQUA S.A - Bosque de Chiva Parcela 182. Urb El bosque 46370 Chiva ES España
Datos fiscales: 1000060 **NIF:** A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS AVDA. CATEDRÁTICO SOLER, 50, 03007, ALICANTE	

Vencimiento:	10.03.2025	**Pedido cliente:**	2200217936
Vía de pago:	Cobro por confirming	**Incoterms:**	UN - Sin franquear
Condición de pago:	COBRO A 60 DIAS EL DIA 10		

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
Pedido: L008510472		**Pedido cliente:** 2200217936				
Análisis 8510472						
		Fecha fin análisis: 03.01.2025				
30	950867	Limpieza escombros Dpto. Bosque chiva	1,00	UN	900,00€	900,00 €

Subtotal de pedido: **900,00** €

Base Imponible	IVA	Cuota
900,00€	21,00 %	189,00€

Neto factura:	900,00 €
Total IVA:	189,00 €
Total factura:	1.089,00 €

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS
Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327

Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, diríjase a customer.service@labaqua.com

REVESFERRANDO C.B.

N.I.F.: E-97.804.181

ESPECIALISTA EN REPARACIONES DE DEPÓSITOS DE CEMENTO CON EPOXI PARA MANTENER AGUAS POTABLES – LIMPIEZA DE DEPÓSITOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS – PERFORACIONES CON BROCA DE DIAMANTE – SUELOS AUTONIVELANTES

C/ Capella, nº32
Telf. móvil: 696 87 04 56 Paco
606 03 98 28 Luis
Email: info@revesferrando.com
Algemesí (Valencia)

DIRECCIÓN:
HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
Avda. Catedratico Soler, 50
Alicante
C.I.F.: A-53.223.764

FECHA	N.º FACTURA
16-01-25	01-25

Cantidad	Concepto	Precio	Euros
	Por los trabajos realizados en la reparación del deposito pequeño situado en la Urbanización El Bosque, según presupuesto		6.125’00
	NÚMERO DE PEDIDO: 3201791778		
	CÓDIGO PROVEEDOR: 44194		
	C.C: ES87 3117 0001 9220 2366 7328		

SUBTOTAL	6.125’00
IVA 21%	1.286’25
TOTAL	7.411’25

AQUATEC

VALORACIÓN APROXIMADA

Ref.: Bomba monobloc depósito El Bosque

Fecha 12-nov.-24

Destinatario				Remitente			
HIDRAQUA EL BOSQUE				AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.			
A/At.:	JESÚS RODRIGO			De:	Pedro Aparicio		
Tlf:		Fax:		Tlf:	609514528	EXT.	

Muy señores nuestros:

En atención a su amable petición, nos es grato remitirle el presupuesto correspondiente al trabajo:

VALORACIÓN APROXIMADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOC EN EL DEPOSITO EL BOSQUE

CONCEPTOS	UD	PRECIO/ud.	TOTAL (€)
Suministro de electrobomba centrífuga monobloc con motor IE3 de 45 KW a 400 V	**1,0**	**5.600,00**	**5.600,00**
Bancada para electrobomba en acero al carbono	**1,0**	**357,00**	**357,00**
PA a justificar de tubería de aspiración hasta el foso con 3,5 m extra de tubería hasta fondo, incluso conexión con tubería existente en PE200 mm electrosoldado, 6 m de tubería para aspiración y otros 6 m extra para impulsión, accesorios necesarios (codos, portabridas, manguitos, bridas, juntas de goma/malla, tornillería en inoxidable, etc) y soportaje en acero al carbono	**1,0**	**5.355,00**	**5.355,00**
Partida de mano de obra y desplazamiento, transporte de electrobomba y materiales, así como instalación de bomba y materiales	**1,0**	**3.272,50**	**3.272,50**
		TOTAL OFERTA:	**14.584,50 €**

(I.V.A. No incluido)

OBSERVACIONES

Quedaría pendiente la valoración del conexionado eléctrico (manguera eléctrica y materiales), entre el variador existente y la nueva electrobomba. Se recomienda visita previa presencial para verificar distancia y condiciones de trabajo

Ejecución del trabajo:	
Forma de pago:	Habitual
Validez de la oferta:	1 mes

Responsable de la oferta

AQUATEC

Fdo.

En caso de conformidad, le rogamos REMITAN SU PEDIDO, o cumplimenten y nos envíe el presente documento adjuntando los datos de su empresa

Aceptación oferta
HIDRAQUA EL BOSQUE

Empresa:	
Dirección:	
Código Postal:	
Municipio	
Provincia	
C.I.F.:	

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
ESB461867632024403	3.2.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 2024403

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	21.169,45
IMPORTE TOTAL A PAGAR	21.169,45
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	21.169,45

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: AGUAS DE MONSERRAT, S.L.
NIF/CIF: ESB46186763
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: CALLE VIRGEN DE LA SALUD, 53-1
46950XIRIVELLA
VALENCIA
ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:1403 **Registro mercantil:**VALENCIA **Hoja:**V 18961 **Folio:**101
Sección:8 **Tomo:**4091 **Otros:**

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono:963831899 **Fax:** **Web:**www.aguasdemonserrat.com **Email:**info@aguasdemonserrat.com
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.U
NIF/CIF: ESA53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: Avda. Catedrático Soler 50
03007Alicante
Alicante
ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
2024403	-	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	23-12-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
RIBA-ROJA Y URB EL BOSQUE. FACTURACION DESDE 23-11-24 HASTA 10-12-24		1,00	17.495,410000	17.495,410000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**17.495,41**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**17.495,41**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	17.495,41	3.674,04	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**3.674,04**
TOTAL FACTURA	**21.169,45**
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**21.169,45**
TOTAL A EJECUTAR	**21.169,45**

DATOS DE PAGO

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO	OBSERVACIONES
21-02-2025	21.169,45	Especiales					Confirming

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:RIBA-ROJA Y URB EL BOSQUE. FACTURACION DESDE 23-11-24 HASTA 10-12-24; Order date: 2024-12-23

EXTENSIONS

RIBA-ROJA Y URB EL BOSQUE. FACTURACION DESDE 23-11-24 HASTA 10-12-24

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201816421	-	

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**17.495,410000**
COSTE TOTAL	**17.495,410000**
IMPORTE BRUTO	**17.495,410000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	17.495,41	3.674,04	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
2024403		23-12-2024	17.495,41	21.169,45

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
ESB461867632024361	3.2.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 2024361

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	4.144,32
IMPORTE TOTAL A PAGAR	4.144,32
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	4.144,32

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: AGUAS DE MONSERRAT, S.L.
NIF/CIF: ESB46186763
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: CALLE VIRGEN DE LA SALUD, 53-1
46950XIRIVELLA
VALENCIA
ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:1403 **Registro mercantil:**VALENCIA **Hoja:**V 18961 **Folio:**101
Sección:8 **Tomo:**4091 **Otros:**

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono:963831899 **Fax:** **Web:**www.aguasdemonserrat.com **Email:**info@aguasdemonserrat.com
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.U
NIF/CIF: ESA53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: Avda. Catedrático Soler 50
03007Alicante
Alicante
ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
2024361	-	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	15-11-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
Orden 9085545. Fecha 7-11-24. Camino los Felipes 30. Reparación de acometida agua pues la arrancó el temporal.		1,00	347,570000	347,570000
Orden 9053989. Fecha 5-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Rotura en tuberia FBC DN100. Abrir cata en hormigon a mano H>= 1.2 m S= 1.8 M2. Se trabaja con agua y con mucha dificultad por las raíces. Reparación hidraulica mediante abrazadera hermética suministrada por HIDRAQUA .		1,00	678,340000	678,340000
Orden 9053989. Fecha 6-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Se monta un provisional para dar agua a la gente. Provisional DN32 L=80 m. Se realiza una zanja en tierra y se tapa de S=0.5 M2. Material hidráulico lo proporciona HIDRAQUA.		1,00	284,130000	284,130000
Orden 9067769. Fecha 7-11-24. Urb El Bosque Calle Barranco 21. Se monta un provisional de 2" para dar agua a la gente. Obra civil para cata auxiliares en baldosa hidraulica en los puntos de entronque a tuberia fibrocemento DN150, con S=0,5 M2 y menor de 1.5 M2. Entronque realizado mediante toma en carga, collarín de fundición para DN150 con salida 2", valvula de corte 2", enlace R-H 2", machon 2" latón y L=35 m y 2 manguitos latón 2". Se extiende tuberia PE-100 DN63 PN16 en rollo a mano y se monta. Material hidráulico por parte de HIDRAQUA.		1,00	884,510000	884,510000
Orden 9183347. Fecha 6-11-24. Deposito 300 Urb El Bosque. Cortar tubo con la radial para poder acceder. Fecha 7-11-24 , entrada a espacio confinado con el equipo y protocolo correspondiente. Se accede con 2 operarios y recurso preventivo, más 2 operarios fuera. Se extrae el carbon activo del deposito y rellenan 9 sacas de 1 m3.		1,00	1.230,510000	1.230,510000

Fecha 11-11-24 realizar tabique al deposito 150 cm x 50 cm. El material de obra se lleva a mano.				

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	3.425,06
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	3.425,06

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3.425,06	719,26	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	719,26
TOTAL FACTURA	4.144,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL A PAGAR	4.144,32
TOTAL A EJECUTAR	4.144,32

DATOS DE PAGO

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO	OBSERVACIONES
14-01-2025	4.144,32	Especiales					Confirming

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:URB EL BOSQUE. TRABAJOS REPARACION DANA.; Order date: 2024-11-14

EXTENSIONS

Orden 9085545. Fecha 7-11-24. Camino los Felipes 30. Reparación de acometida agua pues la arrancó el temporal.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	347,570000
COSTE TOTAL	347,570000
IMPORTE BRUTO	347,570000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	347,57	72,99	-	-

Orden 9053989. Fecha 5-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Rotura en tuberia FBC DN100. Abrir cata en hormigon a mano H>= 1.2 m S= 1.8 M2. Se trabaja con agua y con mucha dificultad por las raíces. Reparación hidraulica mediante abrazadera hermética suministrada por HIDRAQUA .

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	678,340000
COSTE TOTAL	678,340000
IMPORTE BRUTO	678,340000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	678,34	142,45	-	-

Orden 9053989. Fecha 6-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Se monta un provisional para dar agua a la gente. Provisional DN32 L=80 m. Se

realiza una zanja en tierra y se tapa de S=0.5 M2. Material hidráulico lo proporciona HIDRAQUA.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	284,130000
COSTE TOTAL	284,130000
IMPORTE BRUTO	284,130000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	284,13	59,67	-	-

Orden 9067769. Fecha 7-11-24. Urb El Bosque Calle Barranco 21. Se monta un provisional de 2" para dar agua a la gente. Obra civil para cata auxiliares en baldosa hidraulica en los puntos de entronque a tuberia fibrocemento DN150, con S=0,5 M2 y menor de 1.5 M2. Entronque realizado mediante toma en carga, collarín de fundición para DN150 con salida 2", valvula de corte 2", enlace R-H 2", machon 2" latón y L=35 m y 2 manguitos latón 2". Se extiende tuberia PE-100 DN63 PN16 en rollo a mano y se monta. Material hidráulico por parte de HIDRAQUA.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	884,510000
COSTE TOTAL	884,510000
IMPORTE BRUTO	884,510000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	884,51	185,75	-	-

Orden 9183347. Fecha 6-11-24. Deposito 300 Urb El Bosque. Cortar tubo con la radial para poder acceder. Fecha 7-11-24 , entrada a espacio confinado con el equipo y protocolo correspondiente. Se accede con 2 operarios y recurso preventivo, más 2 operarios fuera. Se extrae el carbon activo del deposito y rellenan 9 sacas de 1 m3. Fecha 11-11-24 realizar tabique al deposito 150 cm x 50 cm. El material de obra se lleva a mano.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	1.230,510000
COSTE TOTAL	1.230,510000
IMPORTE BRUTO	1.230,510000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.

IVA	21,00	1.230,51	258,41	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
2024361		15-11-2024	3.425,06	4.144,32

ENRIQUE DESCO, S.L.
NIF B96020763
AVDA LA POBLA DE VALLBONA, 58
46183 LA ELIANA VALENCIA ESPAÑA
Tel. 677123123
oficina@enriquedesco.com

Original

FACTURA

Factura E / 70172
20 / Noviembre / 2024

Cliente: 2.851

HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.U.
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.
NIF A53223764
AV.CATEDRATICO SOLER, 50
03007 - ALICANTE
ALICANTE - ES

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376016 de 12/11/2024. (ID=9656) - Fecha: 01/11/2024 - Imbornales - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (SECTOR 13) (Ribarroja del Turia)				
AIG004	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO EXTRA	9,5	76,00		722,00
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376017 de 12/11/2024. (ID=9652) - Fecha: 01/11/2024 - Baldear - URB. EL BOSQUE (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	7	109,25		764,75
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376018 de 12/11/2024. (ID=9651) - Fecha: 01/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	3,5	109,25		382,38
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376019 de 12/11/2024. (ID=9658) - Fecha: 02/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - POLIGONO OLIVERAL SECTOR 13 (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	11,5	109,25		1.256,38
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376020 de 12/11/2024. (ID=9657) - Fecha: 02/11/2024 - Imbornales - POLIGONO LA REVA (SECTOR 12) (Ribarroja del Turia)				
AIG004	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO EXTRA	9,5	76,00		722,00
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN				

Suma Importes	% Dcto.	Portes	Gastos	Cuota de I.V.A.	Cuota R.E.	Retención	TOTAL

Desglose del I.V.A.			Recargo de Equivalencia		Retención		Fechas de Pago		Forma de Pago
Base	% IVA	Cuota IVA	% R.E.	Cuota R.E.	Base	% Ret.	Fecha	Importe	

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ENRIQUE DESCO SL con CIF B96020763 y domicilio social sito en CARRETERA LA POBLA, S/N 46183, ELIANA, L' (VALENCIA), con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, ENRIQUE DESCO SL informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

ENRIQUE DESCO, S.L.
NIF B96020763
AVDA LA POBLA DE VALLBONA, 58
46183 LA ELIANA VALENCIA ESPAÑA
Tel. 677123123
oficina@enriquedesco.com

Original

FACTURA

Factura E / 70172
20 / Noviembre / 2024

Cliente: 2.851

HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.U.
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.
NIF A53223764
AV.CATEDRATICO SOLER, 50
03007 - ALICANTE
ALICANTE - ES

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
	Albarán E/376021 de 12/11/2024. (ID=9659) - Fecha: 03/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - POLIGONO S13, S12 (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	6	109,25		655,50
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376029 de 12/11/2024. (ID=9661) - Fecha: 04/11/2024 - Otros - PARKING POLIGONO DE LA REVA (Ribarroja del Turia)				
AIG001	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL	10	85,50		855,00
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376030 de 12/11/2024. (ID=9684) - Fecha: 05/11/2024 - Baldear - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (ROTONDA DE PATATAS AGUILAR) (Ribarroja del Turia)				
AIG001	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL	8,5	85,50		726,75
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376037 de 12/11/2024. (ID=9670) - Fecha: 05/11/2024 - Imbornales - POLIGONO RIBARROJA SECTOR 14 (Ribarroja del Turia)				
AIG002	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO NORMAL	2	61,75		123,50
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376039 de 12/11/2024. (ID=9685) - Fecha: 06/11/2024 - Baldear - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (Ribarroja del Turia)				
AIG001	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL	9	85,50		769,50
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376043 de 12/11/2024.				

Suma Importes	% Dcto.	Portes	Gastos	Cuota de I.V.A.	Cuota R.E.	Retención	TOTAL

Desglose del I.V.A.			Recargo de Equivalencia		Retención		Fechas de Pago		Forma de Pago
Base	% IVA	Cuota IVA	% R.E.	Cuota R.E.	Base	% Ret.	Fecha	Importe	

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ENRIQUE DESCO SL con CIF B96020763 y domicilio social sito en CARRETERA LA POBLA, S/N 46183, ELIANA, L' (VALENCIA), con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, ENRIQUE DESCO SL informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

ENRIQUE DESCO, S.L.
NIF B96020763
AVDA LA POBLA DE VALLBONA, 58
46183 LA ELIANA VALENCIA ESPAÑA
Tel. 677123123
oficina@enriquedesco.com

Original

FACTURA

Factura E / 70172
20 / Noviembre / 2024

Cliente: 2.851

HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.U.
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.
NIF A53223764
AV.CATEDRATICO SOLER, 50
03007 - ALICANTE
ALICANTE - ES

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
	(ID=9686) - Fecha: 07/11/2024 - Otros - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (Ribarroja del Turia)				
AIG001	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL	7,5	85,50		641,25
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376049 de 12/11/2024.				
	(ID=9690) - Fecha: 08/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL . C/ K (Ribarroja del Turia)				
AIG001	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL	7,5	85,50		641,25
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376051 de 12/11/2024.				
	(ID=9688) - Fecha: 08/11/2024 - Acometida - C/ VIRGEN DEL OLIVAR (Ribarroja del Turia)				
AIG002	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO NORMAL	4	61,75		247,00
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376053 de 12/11/2024.				
	(ID=9695) - Fecha: 09/11/2024 - Baldear - LA REVA -SECTOR 13 (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	10	109,25		1.092,50
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376054 de 12/11/2024.				
	(ID=9694) - Fecha: 09/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ FORMENTERA Y C/ MENORCA, C/ DALSA, C/ PTE (POLIGONO EL OLIVERAL) (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	9	109,25		983,25
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376055 de 12/11/2024.				

Suma Importes	% Dcto.	Portes	Gastos	Cuota de I.V.A.	Cuota R.E.	Retención	TOTAL

Desglose del I.V.A.			Recargo de Equivalencia		Retención		Fechas de Pago		Forma de Pago
Base	% IVA	Cuota IVA	% R.E.	Cuota R.E.	Base	% Ret.	Fecha	Importe	

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ENRIQUE DESCO SL con CIF B96020763 y domicilio social sito en CARRETERA LA POBLA, S/N 46183, ELIANA, L' (VALENCIA), con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, ENRIQUE DESCO SL informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

ENRIQUE DESCO, S.L.
NIF B96020763
AVDA LA POBLA DE VALLBONA, 58
46183 LA ELIANA VALENCIA ESPAÑA
Tel. 677123123
oficina@enriquedesco.com

Original

FACTURA

Factura E / 70172
20 / Noviembre / 2024

Cliente: 2.851

HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.U.
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A.
NIF A53223764
AV.CATEDRATICO SOLER, 50
03007 - ALICANTE
ALICANTE - ES

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
	(ID=9696) - Fecha: 10/11/2024 - Imbornales - POLIGONO EL OLIVERAL SECTOR 14 (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	8	109,25		874,00
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376057 de 12/11/2024. (ID=9699) - Fecha: 11/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ VIRGEN DEL OLIVAR (PEDANIA DEL OLIVERAL) (Ribarroja del Turia)				
AIG001	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL	3,5	85,50		299,25
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376058 de 12/11/2024. (ID=9698) - Fecha: 11/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL C/ IBIZA, C/ GALICIA, C/ MENORCA (Ribarroja del Turia)				
AIG003	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA	1	109,25		109,25
DOC ORIGEN	DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376059 de 12/11/2024. (ID=9697) - Fecha: 11/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL C/ IBIZA, C/ GALICIA, C/ MENORCA (Ribarroja del Turia)				
AIG001	LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL	5,5	85,50		470,25
	NUMERO DE PEDIDO : 3201791419.				

Suma Importes	% Dcto.	Portes	Gastos	Cuota de I.V.A.	Cuota R.E.	Retención	TOTAL
12.335,76				**1.233,58**			**13.569,34**

Desglose del I.V.A.

Base	% IVA	Cuota IVA
12.335,76	10%	1.233,58

Recargo de Equivalencia

% R.E.	Cuota R.E.

Retención

Base	% Ret.

Fechas de Pago

Fecha	Importe
20/11/2024	13.569,34

Forma de Pago

CONFIRMING

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ENRIQUE DESCO SL con CIF B96020763 y domicilio social sito en CARRETERA LA POBLA, S/N 46183, ELIANA, L' (VALENCIA), con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, ENRIQUE DESCO SL informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

IBERAGUA LEVANTE, S.A. CIF: A-96.345.798
Calle dels Seders, s/n · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Teléfono: 96 166 70 35 · Fax: 96 166 90 89
www.iberagua.com

factura

nº factura 412 . 8

fecha **04/12/2024**

nº cliente 2545

nº pedido 3201804673

HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A

AVDA PAIS VALENCIA, 84

03140 GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE

A53223764

código	descripción	cantidad	precio	dto	importe
	Alb. S24/5427 de 28/11/2024				
63026A	*CODO 90º SOLDADURA A TOPE DN 110 PN 10 INYECTADO*	*1,00*	*20,06*	*46,00*	*10,83*
62210	*MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 110*	*2,00*	*12,31*	*46,00*	*13,29*

forma de pago
75 DIAS F/ FRA(LEY 15/2010 BOE 06/07/10)

vencimiento importe
27/02/2025 29,19

nº cuenta

bruto	24,12
descuento	
gastos	
com.	
base imponible	24,12
i.v.a. 21 %	5,07
total factura	**29,19 €**

deposito 300 dana
onofre

SERVICIO 24 HORAS:
618 317 345

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A53223764174412	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 412174

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	66,62
IMPORTE TOTAL A PAGAR	66,62
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	66,62

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
412174	412	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	17-12-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
LIMPIADOR ESPECIFICO PARA PE ISOPROPANOL 1 LITRO		3,00	33,990000	101,970000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**55,06**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**55,06**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	55,06	11,56	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**11,56**
TOTAL FACTURA	**66,62**
TOTAL A PAGAR	**66,62**
TOTAL A EJECUTAR	**66,62**

LIMPIADOR ESPECIFICO PARA PE ISOPROPANOL 1 LITRO

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	3,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
8715598200061	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201813214		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5699	13-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	33,990000
COSTE TOTAL	101,970000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	46,910000
IMPORTE BRUTO		55,060000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	55,06	11,56	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
412174	412	17-12-2024	55,06	66,62

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A5322376464501	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 50164

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	67,70
IMPORTE TOTAL A PAGAR	67,70
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	67,70

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
50164	501	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	09-01-2025	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
VENTOSA PLASTICO PN 10 2" TRIFUNCIONAL ROJA GRIS AZUD BSP RM		1,00	103,620000	103,620000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**55,95**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**55,95**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	55,95	11,75	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**11,75**
TOTAL FACTURA	**67,70**
TOTAL A PAGAR	**67,70**
TOTAL A EJECUTAR	**67,70**

VENTOSA PLASTICO PN 10 2" TRIFUNCIONAL ROJA GRIS AZUD BSP RM

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
02120AZ	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201825590		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/90	08-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**103,620000**
COSTE TOTAL	**103,620000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	47,670000
IMPORTE BRUTO		**55,950000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	55,95	11,75	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
50164	501	09-01-2025	55,95	67,70

IBERAGUA LEVANTE, S.A. CIF: A-96.345.798
Calle dels Seders, s/n · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Teléfono: 96 166 70 35 · Fax: 96 166 90 89
www.iberagua.com

factura

nº factura 412 . 177

fecha **17/12/2024**

nº cliente 2545

nº pedido 3201813227

HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A

AVDA PAIS VALENCIA, 84

03140 GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE

A53223764

código	descripción	cantidad	precio	dto	importe
	Alb. S24/5703 de 13/12/2024				
BR12502	*BRIDA ROSCADA PN 10 ACERO 125-2"*	*1,00*	*104,20*	*46,00*	*56,27*

forma de pago

75 DIAS F/ FRA(LEY 15/2010 BOE 06/07/10)

vencimiento importe

12/03/2025 68,09

nº cuenta

bruto	56,27
descuento	
gastos	
com.	
base imponible	56,27
i.v.a. 21 %	11,82
total factura	**68,09 €**

RETIRA JESUS RODRIGO
OBRA DEPOSITO 300

SERVICIO 24 HORAS:
618 317 345

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A5322376433501	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 50133

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	102,43
IMPORTE TOTAL A PAGAR	102,43
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	102,43

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
50133	501	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	08-01-2025	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
CODO 90º SOLDADURA A TOPE DN 110 PN 16 INYECTADO		1,00	20,930000	20,930000
MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 110		6,00	12,310000	73,860000
TE ELECTROSOLDABLE DN 110		1,00	56,540000	56,540000
ALCOHOL DE LIMPIEZA 1 LITRO		1,00	5,450000	5,450000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**84,65**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**84,65**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	84,65	17,78	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**17,78**
TOTAL FACTURA	**102,43**
TOTAL A PAGAR	**102,43**
TOTAL A EJECUTAR	**102,43**

CODO 90º SOLDADURA A TOPE DN 110 PN 16 INYECTADO

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63026	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201820889		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5452	29-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	20,930000
COSTE TOTAL	20,930000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	9,630000
IMPORTE BRUTO		11,300000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	11,30	2,37	-	-

MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 110

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	6,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62210	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201820889	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5452	29-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	12,310000
COSTE TOTAL	73,860000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	33,980000
IMPORTE BRUTO		39,880000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	39,88	8,37	-	-

TE ELECTROSOLDABLE DN 110

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62350	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201820889	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5452	29-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	56,540000
COSTE TOTAL	56,540000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	26,010000
IMPORTE BRUTO		30,530000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	30,53	6,41	-	-

ALCOHOL DE LIMPIEZA 1 LITRO

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
60014	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201820889	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5452	29-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**5,450000**
COSTE TOTAL	**5,450000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,510000
IMPORTE BRUTO		**2,940000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	2,94	0,62	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
50133	501	08-01-2025	84,65	102,43

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A53223764179412	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 412179

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	178,12
IMPORTE TOTAL A PAGAR	178,12
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	178,12

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
412179	412	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	17-12-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
BRIDA CIEGA ST-37.2 DIN 2527 DN 200 PN 10		1,00	88,810000	88,810000
BRIDA CIEGA ST-37.2 DIN 2527 DN 100		3,00	35,360000	106,080000
JUNTA PLANA CAUCHO DN 100		4,00	1,980000	7,920000
JUNTA PLANA CAUCHO DN 200		1,00	5,210000	5,210000
TORNILLO ZINCADO 16 X 70		32,00	1,020000	32,640000
TUERCA ZINCADA M16		32,00	0,290000	9,280000
ARANDELA DIN 125 ZN M16		32,00	0,170000	5,440000
TORNILLO ZINCADO 20 X 70		8,00	1,270000	10,160000
TUERCA ZINCADA M20		8,00	0,550000	4,400000
ARANDELA DIN 125 ZN M20		8,00	0,330000	2,640000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**147,21**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**147,21**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	147,21	30,91	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**30,91**
TOTAL FACTURA	**178,12**
TOTAL A PAGAR	**178,12**
TOTAL A EJECUTAR	**178,12**

BRIDA CIEGA ST-37.2 DIN 2527 DN 200 PN 10

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
20278A	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**88,810000**
COSTE TOTAL	**88,810000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	40,850000
IMPORTE BRUTO		**47,960000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	47,96	10,07	-	-

BRIDA CIEGA ST-37.2 DIN 2527 DN 100

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	3,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
20276	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**35,360000**
COSTE TOTAL	**106,080000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	48,800000
IMPORTE BRUTO		**57,280000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	57,28	12,03	-	-

JUNTA PLANA CAUCHO DN 100

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	4,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16605	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,980000**
COSTE TOTAL	**7,920000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,640000
IMPORTE BRUTO		**4,280000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	4,28	0,90	-	-

JUNTA PLANA CAUCHO DN 200

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16609	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**5,210000**
COSTE TOTAL	**5,210000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,400000
IMPORTE BRUTO		**2,810000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	2,81	0,59	-	-

TORNILLO ZINCADO 16 X 70

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	32,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21025T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,020000**
COSTE TOTAL	**32,640000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	15,010000
IMPORTE BRUTO		**17,630000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	17,63	3,70	-	-

TUERCA ZINCADA M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
6	32,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21180	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,290000**
COSTE TOTAL	**9,280000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	4,270000
IMPORTE BRUTO		**5,010000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	5,01	1,05	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	32,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21215	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,170000**
COSTE TOTAL	**5,440000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,500000
IMPORTE BRUTO		**2,940000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	2,94	0,62	-	-

TORNILLO ZINCADO 20 X 70

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
8	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21061T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,270000**
COSTE TOTAL	**10,160000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	4,670000
IMPORTE BRUTO		**5,490000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	5,49	1,15	-	-

TUERCA ZINCADA M20

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
9	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21185	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201813964	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,550000**
COSTE TOTAL	**4,400000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,020000
IMPORTE BRUTO		**2,380000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	2,38	0,50	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M20

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
10	8,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21220	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201813964		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5677	12-12-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,330000**
COSTE TOTAL	**2,640000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	1,210000
IMPORTE BRUTO		**1,430000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	1,43	0,30	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
412179	412	17-12-2024	147,21	178,12

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A53223764210501	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 501210

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	215,69
IMPORTE TOTAL A PAGAR	215,69
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	215,69

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
501210	501	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	17-01-2025	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 75		1,00	9,360000	9,360000
PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 125		3,00	13,920000	41,760000
JUNTA PLANA CAUCHO DN 100		3,00	1,980000	5,940000
TORNILLO ZINCADO 16 X 80		24,00	1,080000	25,920000
TUERCA ZINCADA M16		24,00	0,290000	6,960000
ARANDELA DIN 125 ZN M16		48,00	0,170000	8,160000
MANGUITO UNION LATON 75 EFFEBI "TOF"		1,00	213,900000	213,900000
MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 125		1,00	18,100000	18,100000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**178,26**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**178,26**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	178,26	37,43	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**37,43**
TOTAL FACTURA	**215,69**
TOTAL A PAGAR	**215,69**
TOTAL A EJECUTAR	**215,69**

MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 75

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
62206	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**9,360000**
COSTE TOTAL	**9,360000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	4,310000
IMPORTE BRUTO		**5,050000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	5,05	1,06	-	-

PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	3,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
63348	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**13,920000**
COSTE TOTAL	**41,760000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	19,210000
IMPORTE BRUTO		**22,550000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	22,55	4,74	-	-

JUNTA PLANA CAUCHO DN 100

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	3,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16605	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,980000**
COSTE TOTAL	**5,940000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,730000
IMPORTE BRUTO		**3,210000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3,21	0,67	-	-

TORNILLO ZINCADO 16 X 80

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	24,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
21030T	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**1,080000**
COSTE TOTAL	**25,920000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	11,920000
IMPORTE BRUTO		**14,000000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	14,00	2,94	-	-

TUERCA ZINCADA M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	24,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21180	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,290000**
COSTE TOTAL	**6,960000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,200000
IMPORTE BRUTO		**3,760000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3,76	0,79	-	-

ARANDELA DIN 125 ZN M16

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
6	48,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
21215	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**0,170000**
COSTE TOTAL	**8,160000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	3,750000
IMPORTE BRUTO		**4,410000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	4,41	0,93	-	-

MANGUITO UNION LATON 75 EFFEBI "TOF"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	1,00	Unidades

CÓDIGO ARTÍCULO	PERÍODO DETALLE	FECHA OPERACIÓN
34036E	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**213,900000**
COSTE TOTAL	**213,900000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	98,390000
IMPORTE BRUTO		**115,510000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	115,51	24,26	-	-

MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 125

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
8	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
62212	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201833208	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/263	16-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**18,100000**
COSTE TOTAL	**18,100000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	8,330000
IMPORTE BRUTO		**9,770000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	9,77	2,05	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
501210	501	17-01-2025	178,26	215,69

IBERAGUA LEVANTE, S.A. CIF: A-96.345.798
Calle dels Seders, s/n · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Teléfono: 96 166 70 35 · Fax: 96 166 90 89
www.iberagua.com

factura

nº factura 412 . 178

fecha **17/12/2024**

nº cliente 2545

nº pedido 3201813982

HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140 GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
A53223764

código	descripción	cantidad	precio	dto	importe
	Alb. S24/5691 de 12/12/2024				
24015MF	*VALV. COMP. C.E. DN 125 MAFUSA*	*1,00*	*253,00*	*46,00*	*136,62*
24162MA100-15	*CUADRADILLO VALVULA MAFUSA DN 100-125-150*	*1,00*	*7,74*	*46,00*	*4,18*
16606	*JUNTA PLANA CAUCHO DN 125*	*2,00*	*2,21*	*46,00*	*2,39*
63348	*PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 16 DN 125*	*1,00*	*13,92*	*46,00*	*7,52*
16446	*BRIDA LOCA ACERO DN 125 P/PORTABRIDAS PE DN 125*	*1,00*	*35,08*	*46,00*	*18,94*
63298	*CONO REDUCCION S/TOPE 160/125 PN 16*	*1,00*	*15,35*	*46,00*	*8,29*
62212	*MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 125*	*1,00*	*18,10*	*46,00*	*9,77*
21035T	*TORNILLO ZINCADO 16 X 90*	*16,00*	*1,14*	*46,00*	*9,85*
21180	*TUERCA ZINCADA M16*	*16,00*	*0,29*	*46,00*	*2,51*
21215	*ARANDELA DIN 125 ZN M16*	*16,00*	*0,17*	*46,00*	*1,47*

forma de pago
75 DIAS F/ FRA(LEY 15/2010 BOE 06/07/10)

vencimiento importe
12/03/2025 243,86

nº cuenta

bruto	201,54
descuento gastos	
com.	
base imponible	201,54
i.v.a. 21 %	42,32
total factura	**243,86 €**

RETIRA LA MERCANCIA SR.ONOFRE
OBRA:DEPOSITO 300 DANA

SERVICIO 24 HORAS:
618 317 345

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
ESB461867632024361	3.2.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 2024361

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	4.144,32
IMPORTE TOTAL A PAGAR	4.144,32
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	4.144,32

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: AGUAS DE MONSERRAT, S.L.
NIF/CIF: ESB46186763
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: CALLE VIRGEN DE LA SALUD, 53-1
46950XIRIVELLA
VALENCIA
ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:1403 **Registro mercantil:**VALENCIA **Hoja:**V 18961 **Folio:**101
Sección:8 **Tomo:**4091 **Otros:**

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono:963831899 **Fax:** **Web:**www.aguasdemonserrat.com **Email:**info@aguasdemonserrat.com
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.U
NIF/CIF: ESA53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: Avda. Catedrático Soler 50
03007Alicante
Alicante
ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
2024361	-	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	15-11-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
Orden 9085545. Fecha 7-11-24. Camino los Felipes 30. Reparación de acometida agua pues la arrancó el temporal.		1,00	347,570000	347,570000
Orden 9053989. Fecha 5-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Rotura en tuberia FBC DN100. Abrir cata en hormigon a mano H>= 1.2 m S= 1.8 M2. Se trabaja con agua y con mucha dificultad por las raíces. Reparación hidraulica mediante abrazadera hermética suministrada por HIDRAQUA .		1,00	678,340000	678,340000
Orden 9053989. Fecha 6-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Se monta un provisional para dar agua a la gente. Provisional DN32 L=80 m. Se realiza una zanja en tierra y se tapa de S=0.5 M2. Material hidráulico lo proporciona HIDRAQUA.		1,00	284,130000	284,130000
Orden 9067769. Fecha 7-11-24. Urb El Bosque Calle Barranco 21. Se monta un provisional de 2" para dar agua a la gente. Obra civil para cata auxiliares en baldosa hidraulica en los puntos de entronque a tuberia fibrocemento DN150, con S=0,5 M2 y menor de 1.5 M2. Entronque realizado mediante toma en carga, collarín de fundición para DN150 con salida 2", valvula de corte 2", enlace R-H 2", machon 2" latón y L=35 m y 2 manguitos latón 2". Se extiende tuberia PE-100 DN63 PN16 en rollo a mano y se monta. Material hidráulico por parte de HIDRAQUA.		1,00	884,510000	884,510000
Orden 9183347. Fecha 6-11-24. Deposito 300 Urb El Bosque. Cortar tubo con la radial para poder acceder. Fecha 7-11-24 , entrada a espacio confinado con el equipo y protocolo correspondiente. Se accede con 2 operarios y recurso preventivo, más 2 operarios fuera. Se extrae el carbon activo del deposito y rellenan 9 sacas de 1 m3.		1,00	1.230,510000	1.230,510000

Fecha 11-11-24 realizar tabique al deposito 150 cm x 50 cm. El material de obra se lleva a mano.				

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	3.425,06
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	3.425,06

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3.425,06	719,26	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	719,26
TOTAL FACTURA	4.144,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL A PAGAR	4.144,32
TOTAL A EJECUTAR	4.144,32

DATOS DE PAGO

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO	OBSERVACIONES
14-01-2025	4.144,32	Especiales					Confirming

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:URB EL BOSQUE. TRABAJOS REPARACION DANA.; Order date: 2024-11-14

EXTENSIONS

Orden 9085545. Fecha 7-11-24. Camino los Felipes 30. Reparación de acometida agua pues la arrancó el temporal.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	347,570000
COSTE TOTAL	347,570000
IMPORTE BRUTO	347,570000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	347,57	72,99	-	-

Orden 9053989. Fecha 5-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Rotura en tuberia FBC DN100. Abrir cata en hormigon a mano H>= 1.2 m S= 1.8 M2. Se trabaja con agua y con mucha dificultad por las raíces. Reparación hidraulica mediante abrazadera hermética suministrada por HIDRAQUA .

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	678,340000
COSTE TOTAL	678,340000
IMPORTE BRUTO	678,340000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	678,34	142,45	-	-

Orden 9053989. Fecha 6-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Se monta un provisional para dar agua a la gente. Provisional DN32 L=80 m. Se

realiza una zanja en tierra y se tapa de S=0.5 M2. Material hidráulico lo proporciona HIDRAQUA.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	284,130000
COSTE TOTAL	284,130000
IMPORTE BRUTO	284,130000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	284,13	59,67	-	-

Orden 9067769. Fecha 7-11-24. Urb El Bosque Calle Barranco 21. Se monta un provisional de 2" para dar agua a la gente. Obra civil para cata auxiliares en baldosa hidraulica en los puntos de entronque a tuberia fibrocemento DN150, con S=0,5 M2 y menor de 1.5 M2. Entronque realizado mediante toma en carga, collarín de fundición para DN150 con salida 2", valvula de corte 2", enlace R-H 2", machon 2" latón y L=35 m y 2 manguitos latón 2". Se extiende tuberia PE-100 DN63 PN16 en rollo a mano y se monta. Material hidráulico por parte de HIDRAQUA.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	884,510000
COSTE TOTAL	884,510000
IMPORTE BRUTO	884,510000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	884,51	185,75	-	-

Orden 9183347. Fecha 6-11-24. Deposito 300 Urb El Bosque. Cortar tubo con la radial para poder acceder. Fecha 7-11-24 , entrada a espacio confinado con el equipo y protocolo correspondiente. Se accede con 2 operarios y recurso preventivo, más 2 operarios fuera. Se extrae el carbon activo del deposito y rellenan 9 sacas de 1 m3. Fecha 11-11-24 realizar tabique al deposito 150 cm x 50 cm. El material de obra se lleva a mano.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	1.230,510000
COSTE TOTAL	1.230,510000
IMPORTE BRUTO	1.230,510000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.

IVA	21,00	1.230,51	258,41	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
2024361		15-11-2024	3.425,06	4.144,32

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
ESB461867632024361	3.2.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 2024361

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	4.144,32
IMPORTE TOTAL A PAGAR	4.144,32
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	4.144,32

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: AGUAS DE MONSERRAT, S.L.
NIF/CIF: ESB46186763
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: CALLE VIRGEN DE LA SALUD, 53-1
46950XIRIVELLA
VALENCIA
ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:1403 **Registro mercantil:**VALENCIA **Hoja:**V 18961 **Folio:**101
Sección:8 **Tomo:**4091 **Otros:**

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono:963831899 **Fax:** **Web:**www.aguasdemonserrat.com **Email:**info@aguasdemonserrat.com
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.U
NIF/CIF: ESA53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: Avda. Catedrático Soler 50
03007Alicante
Alicante
ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto: **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
2024361	-	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	15-11-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
Orden 9085545. Fecha 7-11-24. Camino los Felipes 30. Reparación de acometida agua pues la arrancó el temporal.		1,00	347,570000	347,570000
Orden 9053989. Fecha 5-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Rotura en tuberia FBC DN100. Abrir cata en hormigon a mano H>= 1.2 m S= 1.8 M2. Se trabaja con agua y con mucha dificultad por las raíces. Reparación hidraulica mediante abrazadera hermética suministrada por HIDRAQUA .		1,00	678,340000	678,340000
Orden 9053989. Fecha 6-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Se monta un provisional para dar agua a la gente. Provisional DN32 L=80 m. Se realiza una zanja en tierra y se tapa de S=0.5 M2. Material hidráulico lo proporciona HIDRAQUA.		1,00	284,130000	284,130000
Orden 9067769. Fecha 7-11-24. Urb El Bosque Calle Barranco 21. Se monta un provisional de 2" para dar agua a la gente. Obra civil para cata auxiliares en baldosa hidraulica en los puntos de entronque a tuberia fibrocemento DN150, con S=0,5 M2 y menor de 1.5 M2. Entronque realizado mediante toma en carga, collarín de fundición para DN150 con salida 2", valvula de corte 2", enlace R-H 2", machon 2" latón y L=35 m y 2 manguitos latón 2". Se extiende tuberia PE-100 DN63 PN16 en rollo a mano y se monta. Material hidráulico por parte de HIDRAQUA.		1,00	884,510000	884,510000
Orden 9183347. Fecha 6-11-24. Deposito 300 Urb El Bosque. Cortar tubo con la radial para poder acceder. Fecha 7-11-24 , entrada a espacio confinado con el equipo y protocolo correspondiente. Se accede con 2 operarios y recurso preventivo, más 2 operarios fuera. Se extrae el carbon activo del deposito y rellenan 9 sacas de 1 m3.		1,00	1.230,510000	1.230,510000

Fecha 11-11-24 realizar tabique al deposito 150 cm x 50 cm. El material de obra se lleva a mano.				

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	3.425,06
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	3.425,06

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3.425,06	719,26	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	719,26
TOTAL FACTURA	4.144,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL A PAGAR	4.144,32
TOTAL A EJECUTAR	4.144,32

DATOS DE PAGO

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO	OBSERVACIONES
14-01-2025	4.144,32	Especiales					Confirming

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:URB EL BOSQUE. TRABAJOS REPARACION DANA.; Order date: 2024-11-14

EXTENSIONS

Orden 9085545. Fecha 7-11-24. Camino los Felipes 30. Reparación de acometida agua pues la arrancó el temporal.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	347,570000
COSTE TOTAL	347,570000
IMPORTE BRUTO	347,570000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	347,57	72,99	-	-

Orden 9053989. Fecha 5-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Rotura en tuberia FBC DN100. Abrir cata en hormigon a mano H>= 1.2 m S= 1.8 M2. Se trabaja con agua y con mucha dificultad por las raíces. Reparación hidraulica mediante abrazadera hermética suministrada por HIDRAQUA .

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	678,340000
COSTE TOTAL	678,340000
IMPORTE BRUTO	678,340000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	678,34	142,45	-	-

Orden 9053989. Fecha 6-11-24. Urb Sierra Perenxiza. Red de distribución . Se monta un provisional para dar agua a la gente. Provisional DN32 L=80 m. Se

realiza una zanja en tierra y se tapa de S=0.5 M2. Material hidráulico lo proporciona HIDRAQUA.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	284,130000
COSTE TOTAL	284,130000
IMPORTE BRUTO	284,130000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	284,13	59,67	-	-

Orden 9067769. Fecha 7-11-24. Urb El Bosque Calle Barranco 21. Se monta un provisional de 2" para dar agua a la gente. Obra civil para cata auxiliares en baldosa hidraulica en los puntos de entronque a tuberia fibrocemento DN150, con S=0,5 M2 y menor de 1.5 M2. Entronque realizado mediante toma en carga, collarín de fundición para DN150 con salida 2", valvula de corte 2", enlace R-H 2", machon 2" latón y L=35 m y 2 manguitos latón 2". Se extiende tuberia PE-100 DN63 PN16 en rollo a mano y se monta. Material hidráulico por parte de HIDRAQUA.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	884,510000
COSTE TOTAL	884,510000
IMPORTE BRUTO	884,510000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	884,51	185,75	-	-

Orden 9183347. Fecha 6-11-24. Deposito 300 Urb El Bosque. Cortar tubo con la radial para poder acceder. Fecha 7-11-24 , entrada a espacio confinado con el equipo y protocolo correspondiente. Se accede con 2 operarios y recurso preventivo, más 2 operarios fuera. Se extrae el carbon activo del deposito y rellenan 9 sacas de 1 m3. Fecha 11-11-24 realizar tabique al deposito 150 cm x 50 cm. El material de obra se lleva a mano.

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-	1,00	Unidades
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201788333	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
A0303	14-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	1.230,510000
COSTE TOTAL	1.230,510000
IMPORTE BRUTO	1.230,510000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.

IVA	21,00	1.230,51	258,41	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
2024361		15-11-2024	3.425,06	4.144,32

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A53223764365501	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 501365

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	377,58
IMPORTE TOTAL A PAGAR	377,58
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	377,58

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:**
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:**

NIF/CIF: A96345798
TIPO RESIDENCIA: Residente
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
Web:www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Código INE: **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:**
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:**

NIF/CIF: A53223764
TIPO RESIDENCIA: Residente
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
Web: **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Código INE: **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
501365	501	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	30-01-2025	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
UNION ARPOL 166-178 A2E PN 23 L 200 EPDM		1,00	495,310000	495,310000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**312,05**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**312,05**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	312,05	65,53	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**65,53**
TOTAL FACTURA	**377,58**
TOTAL A PAGAR	**377,58**
TOTAL A EJECUTAR	**377,58**

UNION ARPOL 166-178 A2E PN 23 L 200 EPDM

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERIODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
IBZR166-178A2	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201842682	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S25/455	27-01-2025

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	**495,310000**
COSTE TOTAL	**495,310000**

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	37,0000	183,260000
IMPORTE BRUTO		**312,050000**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	312,05	65,53	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
501365	501	30-01-2025	312,05	377,58

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A5322376431411	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 41131

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	273,42
IMPORTE TOTAL A PAGAR	273,42
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	273,42

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A. **NIF/CIF:** A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A 46394RIBARROJA DEL TURIA VALENCIA ESP **NOMBRE COMERCIAL:** IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A **NIF/CIF:** A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84 03140GUARDAMAR DE SEGURA ALICANTE ESP **NOMBRE COMERCIAL:** HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
41131	411	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	08-11-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
MADEJA CAÑAMO		1,00	6,470000	6,470000
VÁLVULA DE ESFERA ASTER ACS H-H C/PALANCA ALUMINIO 2"		2,00	76,510000	153,020000
MACHON LATON 2"		2,00	18,430000	36,860000
ENLACE R. M. LATON 63-2" EFFEBI "TOF"		2,00	41,500000	83,000000
BANDA DE ACERO INOX. TOLERANCIA 170/195 mm		2,00	37,200000	74,400000
COLLARIN DE BANDAS DN 80/300 SALIDA ROSCA 2"		2,00	32,360000	64,720000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**225,97**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**225,97**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	225,97	47,45	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**47,45**
TOTAL FACTURA	**273,42**
TOTAL A PAGAR	**273,42**
TOTAL A EJECUTAR	**273,42**

MADEJA CAÑAMO

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
60032	-	-

REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR
3201783481	-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5068	06-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	6,470000
COSTE TOTAL	6,470000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	2,980000
IMPORTE BRUTO		3,490000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	3,49	0,73	-	-

VÁLVULA DE ESFERA ASTER ACS H-H C/PALANCA ALUMINIO 2"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
16655E	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201783481		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5068	06-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	76,510000
COSTE TOTAL	153,020000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	70,390000
IMPORTE BRUTO		82,630000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	82,63	17,35	-	-

MACHON LATON 2"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
34075	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201783481		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5068	06-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	18,430000
COSTE TOTAL	36,860000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	16,960000
IMPORTE BRUTO		19,900000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	19,90	4,18	-	-

ENLACE R. M. LATON 63-2" EFFEBI "TOF"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
34015E	-	-

REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR
3201783481	-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5068	06-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	41,500000
COSTE TOTAL	83,000000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	38,180000
IMPORTE BRUTO		44,820000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	44,82	9,41	-	-

BANDA DE ACERO INOX. TOLERANCIA 170/195 mm

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
22153	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201783481	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5068	06-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	37,200000
COSTE TOTAL	74,400000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	34,220000
IMPORTE BRUTO		40,180000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	40,18	8,44	-	-

COLLARIN DE BANDAS DN 80/300 SALIDA ROSCA 2"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
6	2,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
22115	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR	**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**	
3201783481	-	

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5068	06-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	32,360000
COSTE TOTAL	64,720000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	29,770000
IMPORTE BRUTO		34,950000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	34,95	7,34	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
41131	411	08-11-2024	225,97	273,42

IBERAGUA LEVANTE, S.A. CIF: A-96.345.798
Calle dels Seders, s/n · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Teléfono: 96 166 70 35 · Fax: 96 166 90 89
www.iberagua.com

factura

nº factura 411 . 29

fecha **08/11/2024**

nº cliente 2545

nº pedido 3201781653

HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A

AVDA PAIS VALENCIA, 84

03140 GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE

A53223764

código	descripción	cantidad	precio	dto	importe
	Alb. S24/5056 de 01/11/2024				
SEV24HORAS	*SERVICIO 24 HORAS TARIFA 120€*	*1,00*	*120,00*	*0,00*	*120,00*
28125	*ML TUBO PE 100 DN 63-10 ATM. ROLLOS DE 100 METROS.*	*200,00*	*6,56*	*46,00*	*708,48*
BEU132-153	*BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL DN 125 (132-153)*	*2,00*	*77,39*	*46,00*	*83,58*
BR12502	*BRIDA ROSCADA PN 10 ACERO 125-2"*	*2,00*	*104,20*	*46,00*	*112,54*
17510E	*VALVULA DE ESFERA TOTAL H-H CON CUADRADILLO 2" 0151N209*	*1,00*	*195,87*	*46,00*	*105,77*
34015E	*ENLACE R. M. LATON 63-2" EFFEBI "TOF"*	*3,00*	*41,50*	*46,00*	*67,23*
34075	*MACHON LATON 2"*	*1,00*	*18,43*	*46,00*	*9,95*
34035E	*MANGUITO UNION LATON 63 EFFEBI "TOF"*	*1,00*	*72,32*	*46,00*	*39,05*
22109	*CABEZAL COLLARIN DN 80/300 SALIDA ROSCA 1"*	*4,00*	*30,97*	*46,00*	*66,90*
22146	*BANDA DE ACERO INOX. TOLERANCIA 130/155 mm BELGICAST*	*4,00*	*45,64*	*46,00*	*98,58*
21025T	*TORNILLO ZINCADO 16 X 70*	*16,00*	*1,02*	*46,00*	*8,81*
21180	*TUERCA ZINCADA M16*	*16,00*	*0,29*	*46,00*	*2,51*
21215	*ARANDELA DIN 125 ZN M16*	*16,00*	*0,17*	*46,00*	*1,47*
16606	*JUNTA PLANA CAUCHO DN 125*	*2,00*	*2,21*	*46,00*	*2,39*

Continúa en la siguiente página

IBERAGUA LEVANTE, S.A. CIF: A-96.345.798
Calle dels Seders, s/n · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Teléfono: 96 166 70 35 · Fax: 96 166 90 89
www.iberagua.com

factura

nº factura 411 . 29

fecha **08/11/2024**

nº cliente 2545

nº pedido 3201781653

HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A

AVDA PAIS VALENCIA, 84

03140 GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE

A53223764

código	descripción	cantidad	precio	dto	importe
8206	LUBRITUB TUBO LUBRICANTE 150 ml.	1,00	2,84	46,00	1,53
34065E	CODO 90º LATON 63 EFFEBI "TOF"	2,00	115,28	46,00	124,50
34120	TUERCA RED. LATON 4" - 3"	1,00	107,66	46,00	58,14
34117	TUERCA RED. LATON 3" - 2"	1,00	63,07	46,00	34,06
34113	TUERCA RED. LATON 2 1/2" - 2"	1,00	29,40	46,00	15,88
RI70EA	RACOR ALUMINIO BARCELONA ROSCA HEMBRA 70 - 2 1/2" MM	1,00	62,10	46,00	33,53
RI100EA	RACOR ALUMINIO BARCELONA ROSCA HEMBRA 100" MM	1,00	118,57	46,00	64,03

forma de pago

75 DIAS F/ FRA(LEY 15/2010 BOE 06/07/10)

vencimiento	importe
01/02/2025	2.128,31

nº cuenta

bruto	1.758,93
descuento	
gastos	
com.	
base imponible	1.758,93
i.v.a. 21 %	369,38
total factura	**2.128,31 €**

retira la mercancia sr:daniel montesinos
el bosque ped. onofre

SERVICIO 24 HORAS:
618 317 345

NÚMERO	VERSIÓN	MODALIDAD
A5322376424411	3.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA		**MONEDA DE FACTURACIÓN**
EMISOR		EUR

FACTURA NÚMERO 41124

IMPORTES

IMPORTE TOTAL FACTURAS	96,44
IMPORTE TOTAL A PAGAR	96,44
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	96,44

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: IBERAGUA LEVANTE, S.A.
NIF/CIF: A96345798
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: C/ SEDERS, SECTOR 13 PARCELA 45A
46394RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
ESP
NOMBRE COMERCIAL: IBERAGUA LEVANTE S.A.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:961667035 **Fax:** **Web:**www.iberagua.com **Email:**administracion@iberagua.com
Personas contacto:PEDRO PABLO GEA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
NIF/CIF: A53223764
TIPO PERSONA: Jurídica
TIPO RESIDENCIA: Residente
DIRECCIÓN: AVDA PAIS VALENCIA, 84
03140GUARDAMAR DE SEGURA
ALICANTE
ESP
NOMBRE COMERCIAL: HIDRAQUA GEST INT AGUAS LEVANTE S A
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: **Fax:** **Web:** **Email:**coae.digital@hidraqua.es
Personas contacto:FACTURA ELECTRÓNICA **CnoCnae:** **Código INE:** **Otros:**

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
41124	411	Factura Completa	Original	Español
FECHA OPER.	**FECHA EXPED.**	**LUGAR EXPED.**		**PERIODO FACT.**
-	06-11-2024	-		-
MONEDA OPERACIÓN		**MONEDA IMPUESTO**		
EUR		EUR		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
ENLACE R. H. LATON 75-2 ½" EFFEBI "TOF"		1,00	115,860000	115,860000
TAPÓN ROSCADO MACHO LATÓN 2 1/2"		1,00	31,750000	31,750000

IMPORTES

IMPORTE BRUTO	**79,70**
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	**79,70**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	79,70	16,74	-	-

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	**16,74**
TOTAL FACTURA	**96,44**
TOTAL A PAGAR	**96,44**
TOTAL A EJECUTAR	**96,44**

ENLACE R. H. LATON 75-2 ½" EFFEBI "TOF"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERIODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
34024E	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201781671		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN

S24/5041	04-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	115,860000
COSTE TOTAL	115,860000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	53,300000
IMPORTE BRUTO		62,560000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	62,56	13,14	-	-

TAPÒN ROSCADO MACHO LATÒN 2 1/2"

NÚMERO DE SECUENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	1,00	Unidades
CÓDIGO ARTÍCULO	**PERÍODO DETALLE**	**FECHA OPERACIÓN**
34260	-	-
REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR		**FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR**
3201781671		-

ALBARANES

Nº ALBARÁN	FECHA ALBARÁN
S24/5041	04-11-2024

IMPORTES

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	31,750000
COSTE TOTAL	31,750000

DESCUENTOS

CONCEPTO	TIPO (%)	IMPORTE
Dto en línea	46,0000	14,610000
IMPORTE BRUTO		17,140000

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.
IVA	21,00	17,14	3,60	-	-

LISTADO DE FACTURAS

NÚMERO	SERIE	FECHA EXPED.	IMPORTE BRUTO	TOTAL EUROS
41124	411	06-11-2024	79,70	96,44

FACTURA

FACTURA
CONTABILIZADA AFAC

Nº factura: 1177266171
Fecha factura: 12.12.2024

Nº Cliente: 2004378 HIDRAQUA, S.A. (URBANIZACION C/ Major, 20 BJ. 46190, RIBARROJA DEL TURIA, España	**Dirección de envío factura** COAE TORRENT Plaza Colon, 13, planta 1, Edifici 46900 TORRENT ES
Datos fiscales: 1000060 **NIF:** A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS AVDA. CATEDRÁTICO SOLER, 50, 03007, ALICANTE	
Vencimiento: 10.03.2025 **Vía de pago:** Cobro por confirming **Condición de pago:** COBRO A 60 DIAS EL DIA 10	**Pedido cliente:** 2200214803 **Incoterms:** Ningún Incoterm asignado

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
Pedido: L008400685		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8400685		TORRENT 7-URBANIZACION EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 25.11.2024				
124	954297	VIRUS DE LA HEPATITIS E	1,00	UN	1.249,00€	1.249,00 €
125	954298	VIRUS DE LA HEPATITIS A	1,00	UN	0,00€	0,00 €
126	954167	CRYPTOSPORIDIUM	1,00	UN	0,00€	0,00 €
127	954106	NOROVIRUS (Genotipo I)	1,00	UN	0,00€	0,00 €
128	954107	NOROVIRUS (Genotipo II)	1,00	UN	0,00€	0,00 €
129	954174	ROTAVIRUS	1,00	UN	0,00€	0,00 €
130	950146	ENTEROVIRUS PCR	1,00	UN	0,00€	0,00 €
131	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
132	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 1.344,86 €				
Pedido: L008400684		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8400684		GODELLETA 6. URBANIZACION EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 25.11.2024				
103	954297	VIRUS DE LA HEPATITIS E	1,00	UN	1.249,00€	1.249,00 €
104	954298	VIRUS DE LA HEPATITIS A	1,00	UN	0,00€	0,00 €
105	954167	CRYPTOSPORIDIUM	1,00	UN	0,00€	0,00 €
106	954106	NOROVIRUS (Genotipo I)	1,00	UN	0,00€	0,00 €
107	954107	NOROVIRUS (Genotipo II)	1,00	UN	0,00€	0,00 €
108	954174	ROTAVIRUS	1,00	UN	0,00€	0,00 €
109	950146	ENTEROVIRUS PCR	1,00	UN	0,00€	0,00 €
110	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
111	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 1.344,86 €				
Pedido: L008400682		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8400682		CHIVA 2-URBANIZACION EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 21.11.2024				
10	954297	VIRUS DE LA HEPATITIS E	1,00	UN	1.249,00€	1.249,00 €
20	954298	VIRUS DE LA HEPATITIS A	1,00	UN	0,00€	0,00 €
30	954167	CRYPTOSPORIDIUM	1,00	UN	0,00€	0,00 €
40	954106	NOROVIRUS (Genotipo I)	1,00	UN	0,00€	0,00 €

Ver siguiente página

FACTURA

Nº factura: 1177266171
Fecha factura: 12.12.2024

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
50	954107	NOROVIRUS (Genotipo II)	1,00	UN	0,00€	0,00 €
60	954174	ROTAVIRUS	1,00	UN	0,00€	0,00 €
70	950146	ENTEROVIRUS PCR	1,00	UN	0,00€	0,00 €
80	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
90	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: **1.344,86** €

Base Imponible	IVA	Cuota
4.034,58€	21,00 %	847,26€

Neto factura:	4.034,58 €
Total IVA:	847,26 €
Total factura:	4.881,84 €

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS
Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327

Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, diríjase a customer.service@labaqua.com

FACTURA

FACTURA
CONTABILIZADA AFAC

Nº factura: 1177268280
Fecha factura: 27.12.2024

Nº Cliente: 2004378 HIDRAQUA, S.A. (URBANIZACION C/ Major, 20 BJ. 46190, RIBARROJA DEL TURIA, España	**Dirección de envío factura** COAE TORRENT Plaza Colon, 13, planta 1, Edifici 46900 TORRENT ES
Datos fiscales: 1000060 **NIF:** A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS AVDA. CATEDRÁTICO SOLER, 50, 03007, ALICANTE	

Vencimiento:	10.03.2025	**Pedido cliente:**	2200214803
Vía de pago:	Cobro por confirming	**Incoterms:**	Ningún Incoterm asignado
Condición de pago:	COBRO A 60 DIAS EL DIA 10		

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
Pedido: L008423576		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8423576		RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 23.12.2024				
173	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
174	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008423575		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8423575		RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 16.12.2024				
131	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
132	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008423573		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8423573		RED GODELLETA 6 - URB. EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 23.12.2024				
159	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
160	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008423572		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8423572		RED GODELLETA 6 - URB. EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 16.12.2024				
117	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
118	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008423570		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8423570		CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE-OFICINA				
		Fecha fin análisis: 23.12.2024				

Ver siguiente página

FACTURA

Nº factura: 1177268280
Fecha factura: 27.12.2024

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
145	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
146	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: 95,86 €

Pedido: L008423569 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8423569 CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE
Fecha fin análisis: 16.12.2024

103	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
104	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: 95,86 €

Pedido: L008418622 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8418622 RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE
Fecha fin análisis: 13.12.2024

89	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
90	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: 95,86 €

Pedido: L008418621 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8418621 RED GODELLETA 6 - URB. EL BOSQUE
Fecha fin análisis: 13.12.2024

75	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
76	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: 95,86 €

Pedido: L008418620 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8418620 CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE
Fecha fin análisis: 13.12.2024

61	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
62	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: 95,86 €

Pedido: L008415046 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8415046 POZO BOSQUE: CHIVA (GODELLETA 6-URBANIZACION DEL BOSQUE)
Fecha fin análisis: 02.12.2024

47	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
48	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: 95,86 €

Ver siguiente página

FACTURA

Nº factura: 1177268280
Fecha factura: 27.12.2024

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
Pedido: L008415045 **Pedido cliente:** 2200214803						
Análisis 8415045		RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 02.12.2024				
33	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
34	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: **95,86** €				
Pedido: L008415044 **Pedido cliente:** 2200214803						
Análisis 8415044		CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 02.12.2024				
10	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
20	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: **95,86** €				

Base Imponible	IVA	Cuota
1.150,32€	21,00 %	241,57€

Neto factura:	1.150,32 €
Total IVA:	241,57 €
Total factura:	1.391,89 €

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS
Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327

Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, diríjase a customer.service@labaqua.com

FACTURA

FACTURA
CONTABILIZADA AFAC

Nº factura: 1177273238
Fecha factura: 18.02.2025

Nº Cliente: 2004378 HIDRAQUA, S.A. (URBANIZACION C/ Major, 20 BJ. 46190, RIBARROJA DEL TURIA, España	**Dirección de envío factura** COAE TORRENT Plaza Colon, 13, planta 1, Edifici 46900 TORRENT ES
Datos fiscales: 1000060 **NIF:** A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS AVDA. CATEDRÁTICO SOLER, 50, 03007, ALICANTE	

Vencimiento:	18.02.2025	**Pedido cliente:**	2200214803
Vía de pago:	Transferencia Cobro	**Incoterms:**	Ningún Incoterm asignado
Condición de pago:	COBRO INMEDIATO		

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
Pedido: L008611156		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8611156		RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 27.01.2025				
173	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
174	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008611155		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8611155		RED GODELLETA 6 - URB. EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 27.01.2025				
159	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
160	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008611146		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8611146		CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE-OFICINA				
		Fecha fin análisis: 27.01.2025				
145	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
146	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008506841		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8506841		RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 13.01.2025				
89	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
90	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: 95,86 €				
Pedido: L008506840		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8506840		RED GODELLETA 6 - URB. EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 13.01.2025				

Ver siguiente página

FACTURA

Nº factura: 1177273238
Fecha factura: 18.02.2025

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
75	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
76	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: **95,86** €

Pedido: L008506839 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8506839 CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE-OFICINA
Fecha fin análisis: 13.01.2025

61	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
62	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: **95,86** €

Pedido: L008506204 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8506204 RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE
Fecha fin análisis: 07.01.2025

47	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
48	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: **95,86** €

Pedido: L008506203 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8506203 RED GODELLETA 6 - URB. EL BOSQUE
Fecha fin análisis: 07.01.2025

33	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
34	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: **95,86** €

Pedido: L008506202 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8506202 CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE-OFICINA
Fecha fin análisis: 07.01.2025

10	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
20	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: **95,86** €

Pedido: L008423577 **Pedido cliente:** 2200214803
Análisis 8423577 RED DE TORRENT 7- URBANIZACIÓN EL BOSQUE
Fecha fin análisis: 20.01.2025

131	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
132	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €

Subtotal de pedido: **95,86** €

Ver siguiente página

FACTURA

Nº factura: 1177273238
Fecha factura: 18.02.2025

	Código	Descripción	Ctd.	UD	Precio	
Pedido: L008423574		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8423574		RED GODELLETA 6 - URB. EL BOSQUE				
		Fecha fin análisis: 20.01.2025				
117	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
118	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: **95,86** €				
Pedido: L008423571		**Pedido cliente:** 2200214803				
Análisis 8423571		CHIVA 2 RED URBANIZACIÓN EL BOSQUE-OFICINA				
		Fecha fin análisis: 20.01.2025				
103	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	1,00	UN	17,50€	17,50 €
104	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC	1,00	UN	78,36€	78,36 €
		Subtotal de pedido: **95,86** €				

Base Imponible	IVA	Cuota
1.150,32€	21,00 %	241,57€

Neto factura:	1.150,32 €
Total IVA:	241,57 €
Total factura:	1.391,89 €

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS
Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327

Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, diríjase a customer.service@labaqua.com

FACTURAS EGEVASA

SISTEMAS ECOLOGICOS RAFAEL ORTIZ, S.L.
CIF. B96255377
C/ ROZALEME, Nº 4-B
46340 REQUENA (VALENCIA)
Telf. / Fax. 96 2305010

Fecha de Factura	Número de Factura
07/02/2025	A-2025/ 000050

EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.
NIF. A46615159
C/ GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA, Nº 17-1º PTA 4
46005 VALENCIA
VALENCIA

ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
Albarán: 1-000048 06/02/2025			
PEDIDO NÚMERO: 4500436032			
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA DEPURADORA DEL EDAR DE CHIVA			
AVISO REALIZADO EN FECHA 03-01-2025			
5.00 h. TRABAJO REALIZADO CON CAMIÓN CUBA	1,00	570,00	570,00

Base Imponible	I.V.A.	CUOTA I.V.A	TOTAL FACTURA
570,00	**21 %**	119,70	**689,70**
	10 %	0,00	

Factura Nº 404104601

FECHA FACTURA	COD. CLIENTE	PÁG.
15/11/2024	00652	1 de 1

TECNOLOGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.L.

Av MAESTRO SERRANO, 18
46690 L´ALCUDIA DE CRESPINS
Telf.: 960918171 Fax:
ventas@tsisoluciones.es
Cif: B98212079

Empresa General Valenciana del Agua SA

CA Gran Via Marques de Turia 19
46005 VALENCIA
A46615159
Telf.: 963860600 - Fax.:
E-mail: eromero@aguasdevalencia.es

Ref. Factura: Ref. Proveedor:

Código	Descripción	T. RAEE(*)	Cantidad	UE	Precio	Dto1	Importe
	ALBARAN R-402102026 FECHA 12/11/2024 REF: 4500424958 REF. AUX:						
374727	E5ACCX4A5M000 Ent Univ 4 Alarmas Sal Corriente 100-240Vca 96x96		1,00	PZ	550,500	35,00	357,83
TRANSPORTE	PORTES URGENTES 24/48H		1,00		60,000		60,00
	ALBARAN R-402102027 FECHA 12/11/2024 REF: 4500424957 REF. AUX:						
374727	E5ACCX4A5M000 Ent Univ 4 Alarmas Sal Corriente 100-240Vca 96x96		1,00	PZ	550,500	35,00	357,83
TRANSPORTE	PORTES URGENTES 24/48H		1,00		60,000		60,00

86898

Portes: **Importe RAEE:**
Embalajes:

Base Imponible	I.V.A.	Importe IVA	Rec.	Imp.Rec.
835,66	21,00	175,49		

F. Pago: CONFIRMING 60 DIAS
Banco: **Cuenta:**
Vtos: 1.011,15
15/01/2025

Total Factura 1.011,15€

OBSERVACIONES:

Sus datos personales serán incluidos en el fichero de esta empresa, con la finalidad de mantener la relación con Ud. Asimismo podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición solicitándolo por escrito, señalando claramente su Nombre, Apellidos y Dirección (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre).
Ambas partes de someten expresamente al derecho y a la jurisdicción de los juzgados y Tribunales de Xàtiva (Valencia) con renuncia expresa a los de su propio fuero domicilio.

RESUMEN DE FACTURA

MEDICIÓN AVANZADA DE CONTADORES, S.A.
N.I.F.: ESA96674460
Gran Vía Marques del Turia 19
46005 _ _ Valencia

NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA EXPED.
	O2024GCL000018	18-12-2024
N.I.F. EMISOR	**CONTRATO**	**FORMA DE PAGO**
ESA96674460	0010231660	Compensación
TIPO DOCUMENTO	**NUMERO FACTURA RECTIF.**	
ORIGINAL		
PERIODO DE FACTURACION	**FECHA DE OPERACIÓN**	
-- --	--	

DESTINATARIO

EMP.GENERAL VALENC. DEL AGUA, S.A.
N.I.F.: ESA46615159
GRAN VIA MARQUÉS DEL TURIA 17-1º-4ª
46005 _ _ VALENCIA

ANEXOS:

factura-o2024gcl000018.pdf.zip

DETALLE FACTURA

PEDIDO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMP.UNITARIO	Coste Total	Suma Dtos./cargos	Importe Bruto	%IVA
	EDAR Pedralba_Vuelo dron DANA_(04/11/24 Y 13/04/11) Vuelo con dron para la revisión estructural de infraestructuras afectadas por la DANA_Noviembre 20245588276 . **REFCONT:** 0010231660	2	400,00	800,00	0,00	800,00	21,00
	EDAR Bugarra_Vuelo dron DANA_(04/11/24 Y 14/04/11)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	2	400,00	800,00	0,00	800,00	21,00
	EDAR Chiva_Vuelo dron DANA_(05/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Gestalgar_Vuelo dron DANA_(04/11/24 y 14/11/2024)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	2	400,00	800,00	0,00	800,00	21,00
	EDAR Godelleta_Vuelo dron DANA_(05/11/24, 07/11/24, 13/11/24 y 21/11/2024)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	4	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	21,00
	EDAR Tous_Vuelo dron DANA_(08/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Senyera_Vuelo dron DANA_(08/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Camporrobles_Vuelo dron DANA_(12/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Fuenterrobles_Vuelo dron DANA_(12/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Turís_Vuelo dron DANA_(07/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Vall Alcalans_Vuelo dron DANA_(05/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Guadassuar_Vuelo dron DANA_(08/11/24)5588276 . **REFCONT:** 0010231660	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00

IMPORTES

IMPORTE BRUTO **7.200,00**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA
IVA: Impuesto sobre el valor añadido	21,00	7.200,00	1.512,00

TOTAL EUROS **8.712,00**

DATOS PAGO

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	OBSERVACIONES

18-12-2024	8.712,00	Compensación	Núm. cuenta: ES4600491827862810127943		

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: 5210057220 AVINT00000007

RESUMEN DE FACTURA

MEDICIÓN AVANZADA DE CONTADORES, S.A.
N.I.F.: ESA96674460
Gran Vía Marques del Turia 19
46005 _ _ Valencia

NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA EXPED.
	O2024GCL000968	31-12-2024
N.I.F. EMISOR	**CONTRATO**	**FORMA DE PAGO**
ESA96674460	0010233876	Compensación
TIPO DOCUMENTO	**NUMERO FACTURA RECTIF.**	
ORIGINAL		
PERIODO DE FACTURACION	**FECHA DE OPERACIÓN**	
-- --	--	

DESTINATARIO

EMP.GENERAL VALENC. DEL AGUA, S.A.
N.I.F.: ESA46615159
GRAN VIA MARQUÉS DEL TURIA 17-1º-4ª
46005 _ _ VALENCIA

ANEXOS:

factura-o2024gcl000968.pdf.zip

DETALLE FACTURA

PEDIDO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMP.UNITARIO	Coste Total	Suma Dtos./cargos	Importe Bruto	%IVA
	EDAR Chiva_Vuelo con dron DANA_(29/11/24) Vuelo con dron para la revisión estructural de infraestructuras afectadas por la DANA_Diciembre 2024.5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Gestalgar_Vuelo con dron DANA_(11/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Tous_Vuelo con dron DANA_(04/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Camporrobles_Vuelo con dron DANA_(11/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Fuenterrobles_Vuelo con dron DANA_(11/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Calles_Vuelo con dron DANA_(02/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Venta Gaeta_Vuelo con dron DANA_(05/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Requena_Vuelo con dron DANA_(05/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00
	EDAR Siete Aguas_Vuelo con dron DANA_(05/12/24)5588419 . **REFCONT:** 0010233876	1	400,00	400,00	0,00	400,00	21,00

IMPORTES

IMPORTE BRUTO **3.600,00**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA
IVA: Impuesto sobre el valor añadido	21,00	3.600,00	756,00

TOTAL EUROS **4.356,00**

DATOS PAGO

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	OBSERVACIONES
31-12-2024	4.356,00	Compensación	Núm. cuenta: ES4600491827862810127943		

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: __ 5210058171 AVINT00000007

FACTURA

DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L.
c/ Blasco Ibañez, ed Apolo IV, local 20
03710, Calpe (Alicante)
C.I.F. Nº B03865227

Numero 24/1129 **Fecha 25/11/2024**

EGEVASA
C/GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 17 1º 4
46005 VALENCIA
C.I.F. A46615159

Código	Descripción	Cant.	Precio/u	Dto.	%	Importe
C4	Vehiculo 8897KWL Iveco Eurocargo, equipado con sistema de					
6.1	bombeo de alta presión y depresor. Vaciado y limpieza					
	alcantarillados y traslado de aguas residuales a planta depuradora.	16	350,00	0	21	5.600,00
	Horas extras	4	380,00	0	21	1.520,00
	trabajo realizado el día 18,19 y 20 de Noviembre en la depuradora de Chiva					
	NUMERO DE PEDIDO 4500428131					

nº cta la CAIXA: ES64 2100 4484 41 0200091311

Descuento	Base Imponible	%	IVA	%	RE	TOTAL
%	7.120,00	21	1.495,20	0	0,00	**8.615,20 Euros**

FACTURA

DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L.
c/ Blasco Ibañez, ed Apolo IV, local 20
03710, Calpe (Alicante)
C.I.F. Nº B03865227

Numero 24/1150 **Fecha 02/12/2024**

EGEVASA
C/GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 17 1º 4
46005 VALENCIA
C.I.F. A46615159

Código	Descripción	Cant.	Precio/u	Dto.	%	Importe
C4 6.1	Vehiculo 8897KWL Iveco Eurocargo, equipado con sistema de bombeo de alta presión y depresor. Vaciado y limpieza de arquetas y tuberias y traslado de aguas residuales	4	350,00	0	21	1.400,00
	Horas extras ,en el coste de las horas se incluye desplazamiento,alojamiento y dietas de los operarios desplazados..	12	380,00	0	21	4.560,00
	trabajo realizado el día 25/11/2024 depuradora Chiva					

nº cta la CAIXA: ES64 2100 4484 41 0200091311

Descuento	Base Imponible	%	IVA	%	RE	TOTAL
%	5.960,00	21	1.251,60	0	0,00	**7.211,60 Euros**

RESUMEN DE FACTURA

AQUACENIC IBERICA, S. L.
N.I.F.: B95308706
C/ Serrano, 45 - 2ª Planta
28001 _ _ MADRID

NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA EXPED.
FV	AQ_FV24-04851	31-12-2024
N.I.F. EMISOR	**CONTRATO**	**FORMA DE PAGO**
B95308706		Cheque
TIPO DOCUMENTO	**NUMERO FACTURA RECTIF.**	
ORIGINAL		
PERIODO DE FACTURACION	**FECHA DE OPERACIÓN**	
-- --	31-12-2024	

DESTINATARIO

EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, SA
N.I.F.: A46615159
G.V. MARQUES DEL TURIA, 17-1º PTA 4
46005 _ _ VALENCIA

DETALLE FACTURA

PEDIDO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMP.UNITARIO	Coste Total	Suma Dtos./cargos	Importe Bruto	%IVA
4300048172	HIPOCLORITO SODICO POTABLES JER R32404916 **. ALB:** 32404916	800	0,35	280,00	0,00	280,00	21,00
4300048172	ENTREGADO JERRICAN 20L AZUL **. ALB:**	32	6,80	217,60	0,00	217,60	21,00

IMPORTES

IMPORTE BRUTO ___ **497,60**

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA
IVA: Impuesto sobre el valor añadido	21,00	497,60	104,50

TOTAL EUROS ___ **602,10**

DATOS PAGO

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	OBSERVACIONES
10-05-2025	602,10	Cheque	Núm. cuenta: ES0501821299480208514607 Entidad:0182 Oficina: 1299		

Excavaciones Morgan s.l.

EGEVASA
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 17-1º
46005 - VALENCIA

Obra	EDAR CHIVA - DANA 2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	CLIENTE	C.I.F./D.N.I	Nº PEDIDO	HOJA
V1/240397	30/11/2024	0126	A46615159	**4500427043**	1

FECHA	ALBARAN	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
06/11/2024	053936	8,5	H. GIRATORIA TAKEUCHI TB250 CON CAZO	45,00 €	382,50 €
		6	H. CAMIÓN VOLQUETE 3 EJES	50,00 €	300,00 €
		2	PORTES TAKEUCHI TB250 (IDA Y VUELTA)	50,00 €	100,00 €

"REGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA"

BASE IMPONIBLE	IVA		TOTAL
782,50 €	21%	164,33 €	946,83 €

FORMA DE PAGO	BANCO	VENCIMIENTOS	
TRANSFERENCIA	ES29 3121 2364 0127 2000 0174	31/12/2024	946,83 €

En cumplimiento de lo establecido en a LOPD, le informamos que sus datos están incorporados en nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente, prestación de servicios derivada de la misma. Así mismo, le informamos de la posiblidad de ejercer sus derechos ARCO ante EXCAVACIONES MORGAN, S.L. con dirección en C/CUEVA SANTA, 7 -C.P. 46380, CHESTE (Valencia), adjuntando fotocopia de su DNI.

EXCAVACIONES MORGAN, S.L. - Reg. Merc. Valencia, T. 5267, L.2575, Secc. Gral., Folio 89, H. Nº V-42998, Inscripción 1ª . **C.I.F. B96420484**

Alternativas de Bombeo, S.A.
Travesía del Lazo, nº 8 - Pol. Ind. Los Frailes Nave 3R
Daganzo 28814 - (Madrid)
CIF: ESA80917032
info@albosa.com
Telf.: 91 884 57 34 Fax: 91 884 52 63

FACTURA

Documento Nº: 243.951 **Cód. Cliente:** C02827 **N.I.F/C.I.F:** ESA46615159
Fecha Doc.: 28/11/2024 **Ref.Cliente:** 4500427284

Dirección fiscal:

Empresa General Valenciana del Agua, S.A./EDAR CHESTE
Marques del Turia, 17 1º pta. 4
VALENCIA
46005 VALENCIA
SPAIN

Dirección factura:

Empresa General Valenciana del Agua, S.A./EDAR CHE
Marques del Turia, 17 1º pta. 4
VALENCIA
46005 VALENCIA
SPAIN

Cód. Artículo	Descripción	Cant.	Precio	Importe
Albarán Nro.: 244037				
RR E062 2207	Stator CE062/CB062/CW062/C16B NBR TSE	1,00	502,66	502,66
BD C062 2521	Rotor MK0	1,00	922,10	922,10
TRANSPORTE	Portes de entrega cargados en factura. Material situado sobre camión a pie de obra, dentro de territorio nacional peninsular. Medios de descarga por cuenta del cliente.	1,00	40,00	40,00

Observaciones: DEPURADORA DE CHESTE-VALENCIA

TOTALES

SubTotal		**1.464,76**
Desglose IVA	**Base Imponible**	**Importe IVA**
21%	1.464,76	307,60
Total cuota		**307,60**

FORMA DE PAGO
85 Días - Confirming

VENCIMIENTO
21/02/2025

Total Doc. EUR 1.772,36

OBSERVACIONES:

NOMBRE LOCALIZACIÓN	CHIVA - URB. LA LOMA
AÑO	2024
MES	NOVIEMBRE

HORAS EXTRAORDINARIAS DANA

EMPLEADO / DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	%	COSTE EMPRESA
TRABAJADOR 1																										4,0	4,0	4,0				12,0	100,0	605,2 €
HORAS TOTALES																										4,0	4,0	4,0				**12,0**		**605,2 €**

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE: Gloria Fayos Miñana 3-dic-2024
Jefe de Aguas Residuales



Explicación del retraso en la validación:

NOMBRE LOCALIZACIÓN	CHIVA - URB. LA LOMA
AÑO	2025
MES	ENERO

HORAS EXTRAORDINARIAS DANA

EMPLEADO / DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	%	COSTE EMPRESA
TRABAJADOR 1													1,0	1,0																		2,0	100,0	100,9 €
HORAS TOTALES													1,0	1,0																		2,0		100,9 €

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE: Gloria Fayos Miñana 4-feb-2025
Jefe de Aguas Residuales

Explicación del retraso en la validación:
